

表 2.3.1-1 110 年度上半年各施工廠商放流水水質監測結果

測站	項目	水溫	pH	導電度	大腸桿菌 群	懸浮固體	生化需氧 量	正磷酸鹽	化學需氧 量	油脂
	單位 日期	℃	--	μs/cm	CFU/100 ml	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
加工區污水處理廠納 管水質標準		35	5~9	5000	—	300	300	—	500	25
鼎基 (2 期)	110.01.20	18.3	8.1	572	<10	266	ND	0.160	19.8	2.3
	110.02.23	23.1	8.3	614	<10	70.2	3.1	0.184	13.2	2.3
	110.03.10	24.7	7.8	538	<10	6.6	ND	0.074	ND	ND
	110.04.07	25.1	8.1	1140	5.2×10 ⁶	69.0	ND	0.384	ND	ND
	110.05.06	31.2	7.9	584	<10	74.4	ND	0.289	ND	ND
	110.06.16	28.3	8.4	514	4.7×10 ²	412	ND	0.126	ND	ND
金利食安 (二期)	110.05.06	30.1	8.0	669	1.0×10 ³	34.6	3.9	0.120	16.3	ND
	110.06.16	28.3	7.8	570	3.1×10 ²	13.0	ND	ND	ND	ND

註：1.排放納管水質標準係依據「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告」。

2.以 ND 表示者，表示該項測值小於方法偵測極限(MDL)；以 < 數字表示者，表示該項測值大於方法偵測極限但小於定量極限(QDL)。

3.灰色網底表示該項測值超過加工區污水處理廠之納管水質標準。

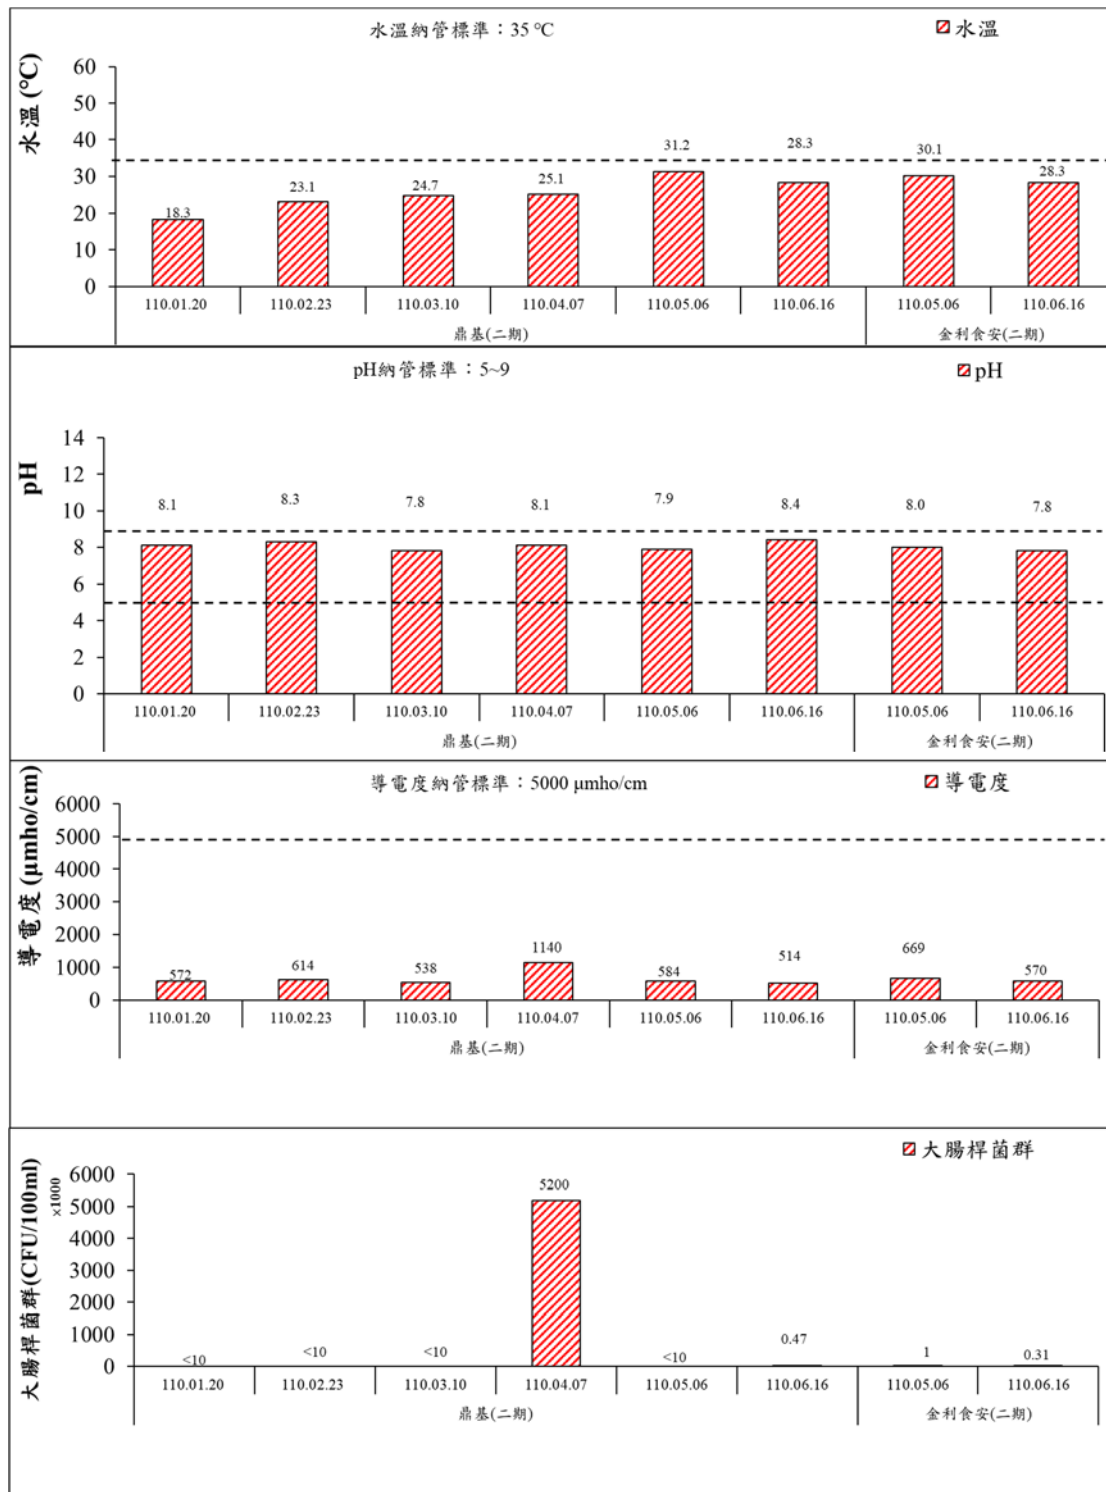


圖 2.3.1-1 110 年度各上半年施工廠商放流水水質變化圖(1/2)

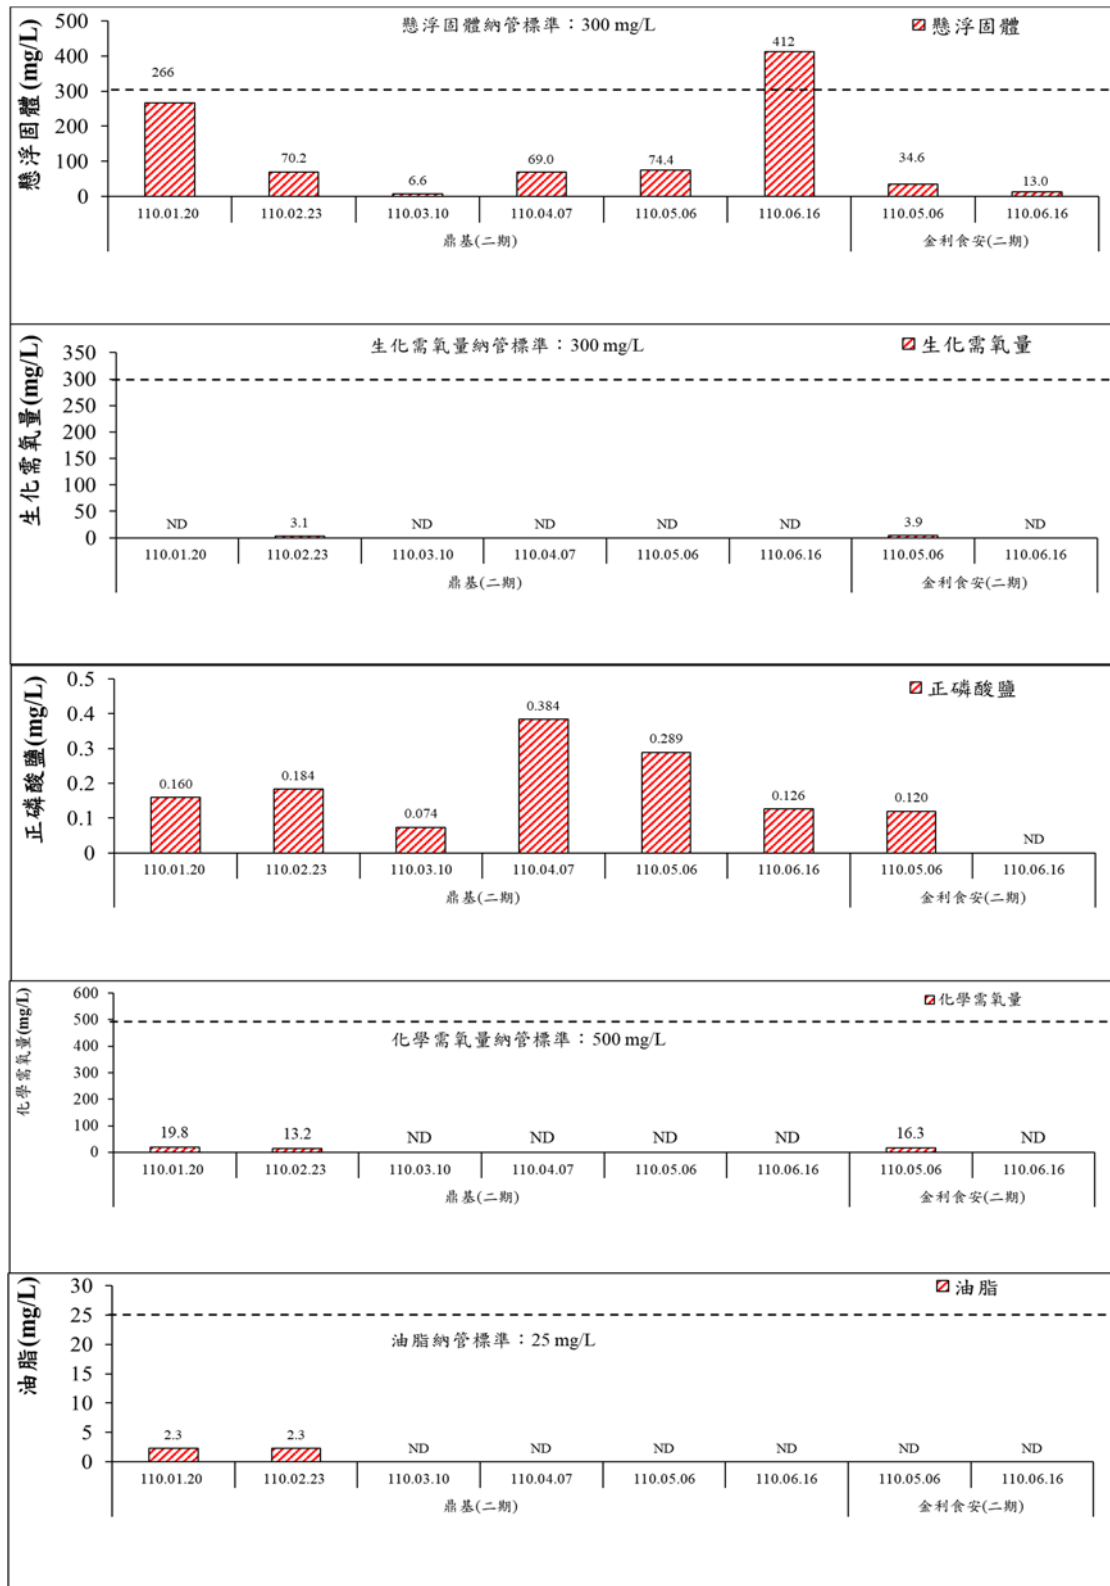


圖 2.3.1-1 110 年度各上半年施工廠商放流水水質變化圖(2/2)
