瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

（土方開挖中）

量測日期：114.04.12~114.04.18

承盟工程顧問有限公司
CHENG MENG CO.,LTD.

安全監測系統資料摘要說明

量測期間： 114.04.12~114.04.18 (土方開挖中)

監測項目及儀器	最大觀測值 (編號，位置)	注意值	警戒值	行動值	備註
基地環境監測管理值					
水位觀測井	-3.28m(OW-2) 水位變化量：-1.18m	初始值±1m	初始值±2m	初始值±3m	OW-2 初始值 -2.10m
沉陷觀測點	-0.93cm(SM-5)	1.2cm	1.4cm	1.7cm	
壁體內傾斜管	22.47mm(SID-1，-1.5m)	18mm	22mm	25mm	
擋土壁鋼筋計	-	2100kgf/cm^2	2520kgf/cm^2	3360kgf/cm^2	

根據量測資料結果顯示:

1. 水位觀測井最大觀測量為-3.28m(OW-2)，水位變化量為-1.18m，本階段量測已達注意值範圍(初始值±1m)。
2. 本次沉陷觀測點最大觀測值為-0.93cm(SM-5)，本階段量測未達注意值範圍(1.2cm)。
3. 本次壁體內傾斜管最大觀測值為 22.47mm(SID-1，-1.5m)，本階段量測已達警戒值範圍(22mm)。
4. 本次擋土壁鋼筋計皆遭現場施工作業影響而無測量值。

結論：

本階段(土方開挖中)量測結果顯示水位觀測井 OW-2 觀測值-3.28m，水位變化量-1.18m，已達注意值範圍(初始值±1m)；壁體內傾斜管 SID-1 最大觀測值為 22.47mm，已達警戒值範圍(22mm)，除持續監測相關資料變化，同時加強控管工區作業流程及品質，以確保基地之安全。

瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

目錄

		頁次
圖 1	基地安全監測系統配置圖 ----------	1
表 1	水位觀測井量測記錄 ----------	2
表 2	沉陷觀測點之高程與累積沉陷量 ----------	3
圖 2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係 ----------	4
表 3	SID-1壁體內傾斜管量測記錄 ----------	5
圖 3	SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	6
表 4	SID-2壁體內傾斜管量測記錄 ----------	7
圖 4	SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	8
表 5	擋土壁鋼筋計監測報表 ----------	9
表 5-1	擋土壁鋼筋計監測報表 ----------	10
圖 5	擋土壁鋼筋計歷時曲線圖 ----------	11
圖 6	監測記錄照片 ----------	12

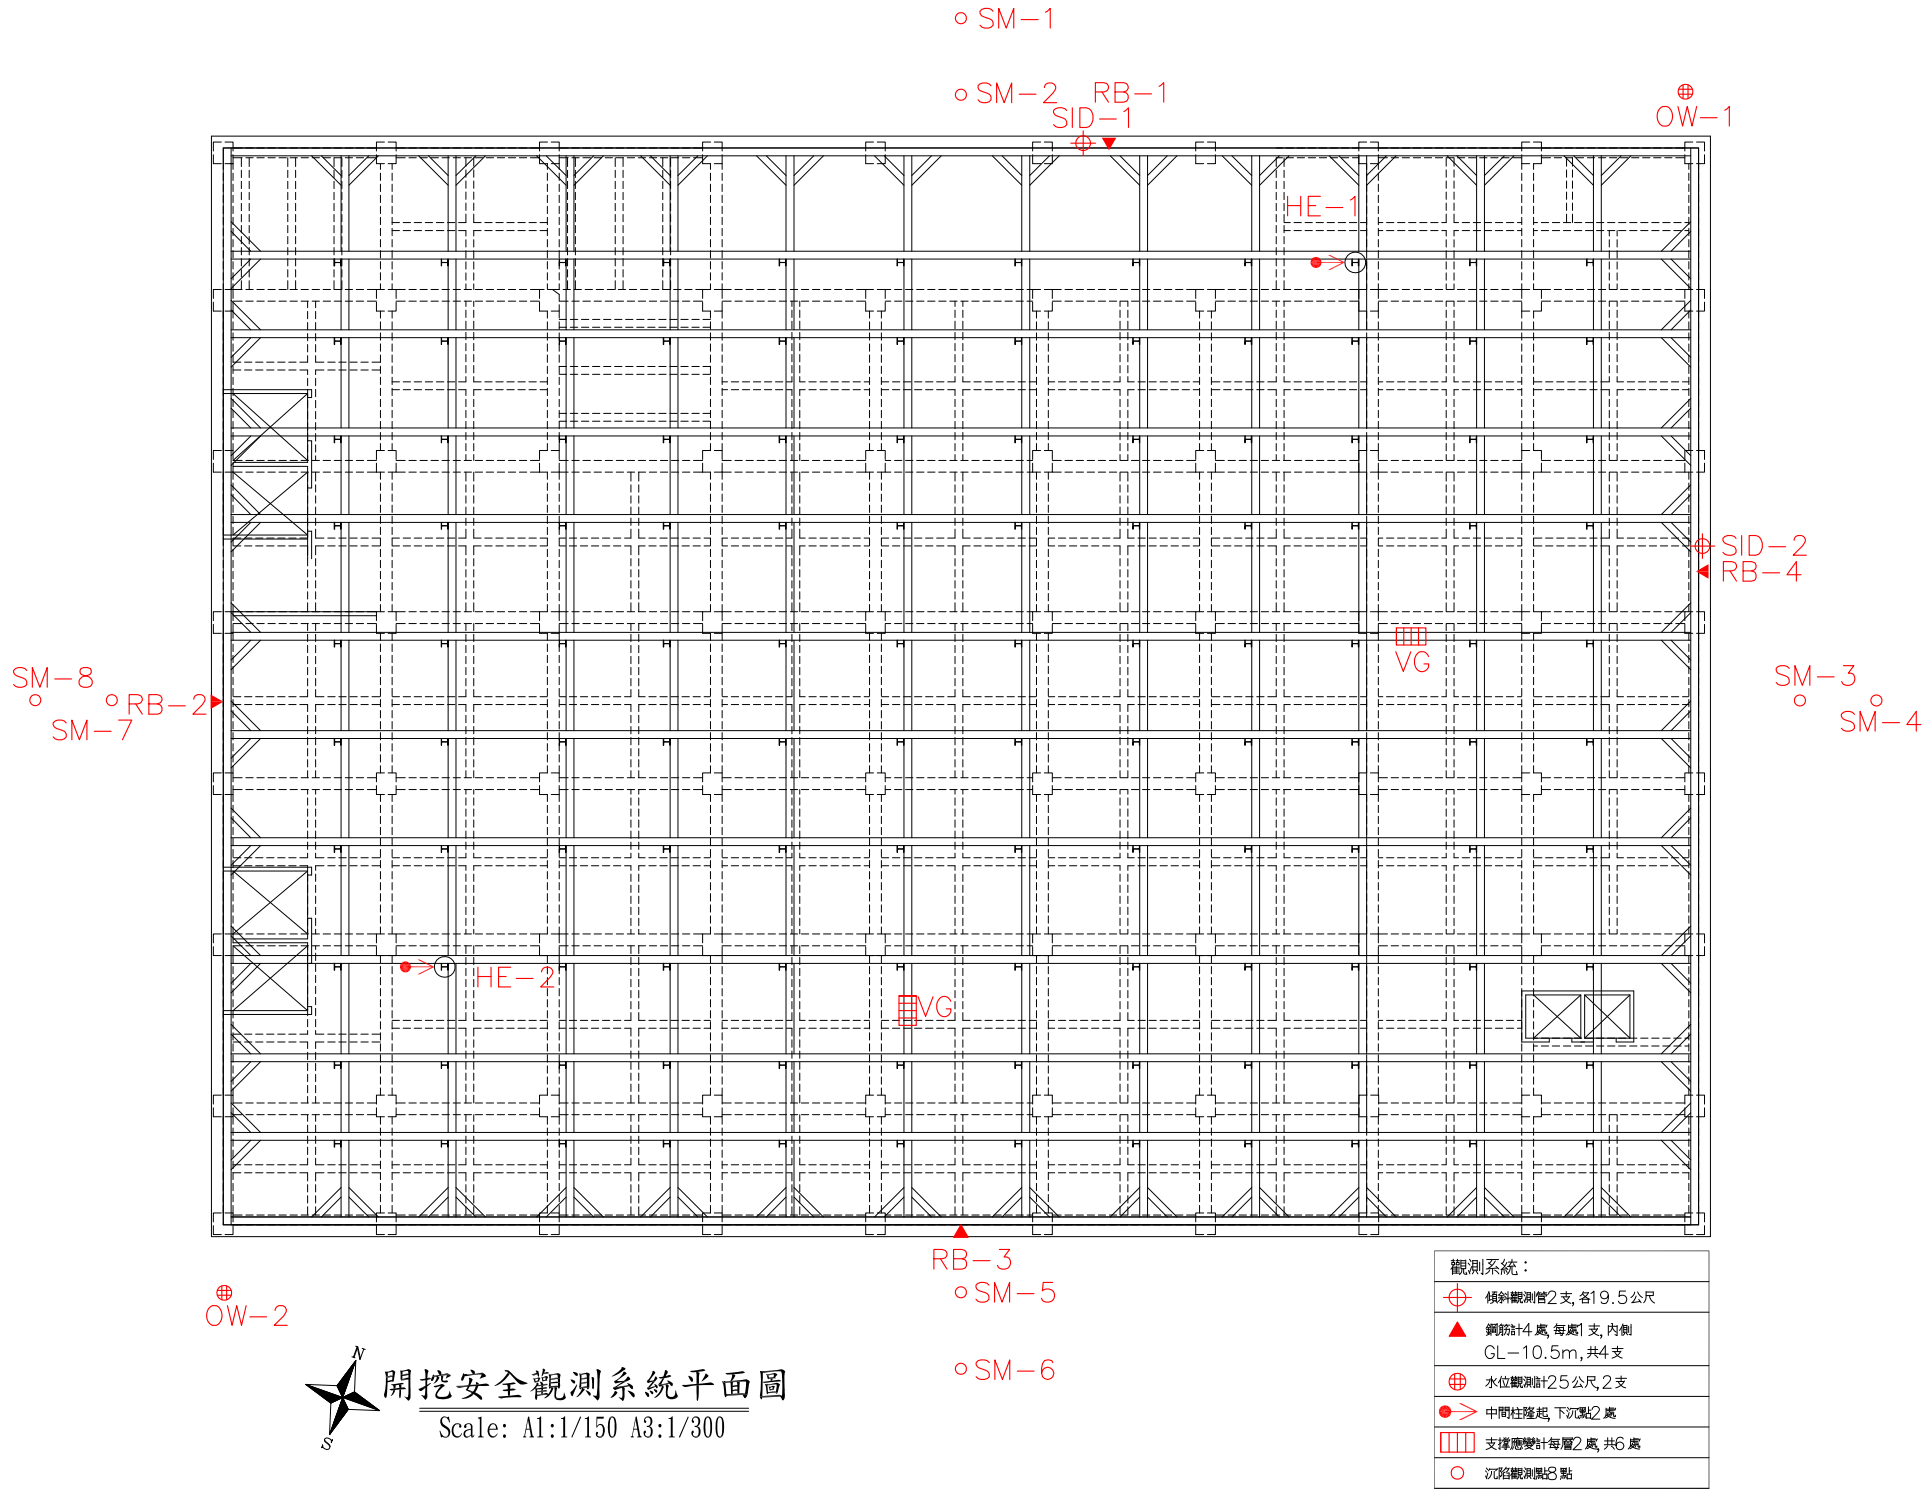


圖 1 基地安全監測系統配置圖

表 1

水位觀測井量測記錄

編號	OW-1 （初始值-2.98m）	OW-2 （初始值-2.10m）	備註
日期	測量值深度(_m)		
114/2/20	-3.10	-2.58	連續壁施作完成
114/2/24	-3.11	-2.56	連續壁施作完成
114/2/27	-3.23	-2.59	連續壁施作完成
114/3/3	-3.21	-2.69	連續壁施作完成
114/3/6	-3.22	-2.73	連續壁施作完成
114/3/10	-3.18	-2.61	連續壁施作完成
114/3/13	-3.19	-2.66	連續壁施作完成
114/3/17	-3.16	-2.65	連續壁施作完成
114/3/20	-3.11	-2.63	連續壁施作完成
114/3/24	-3.23	-2.75	連續壁施作完成
114/3/28	-4.29	-3.09	連續壁施作完成
114/3/31	-3.40	-2.96	連續壁施作完成
114/4/4	-3.35	-2.91	連續壁施作完成
114/4/7	-3.44	-3.19	土方開挖中
114/4/10	-3.40	-3.03	土方開挖中
114/4/14	-4.39	-3.69	土方開挖中
114/4/16	-3.40	-3.28	土方開挖中

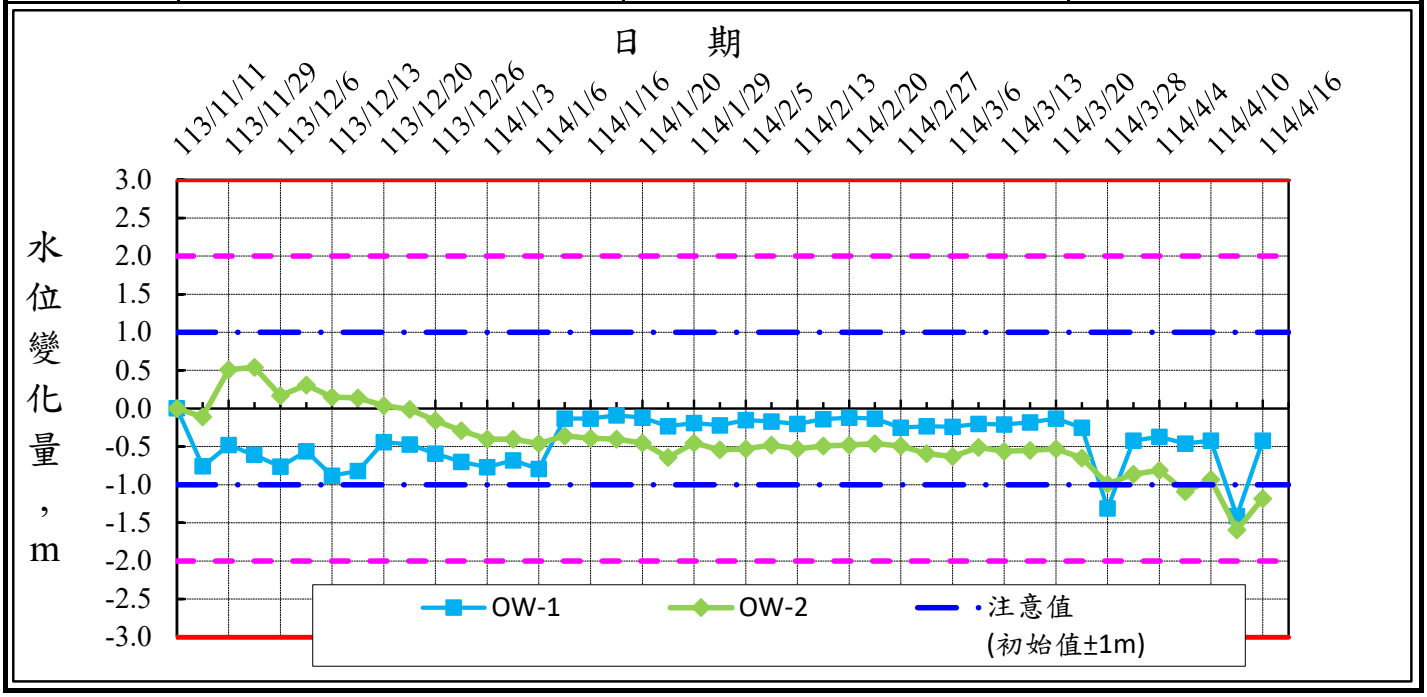


表 2

沉陷觀測點之高程與累積沉陷量

高程	初始高程(cm)	前次高程(cm)							本次高程(cm)	累積沉陷量(cm)
日期 / 測點	113/11/22	114/2/27	114/3/6	114/3/13	114/3/20	114/3/28	114/3/31	114/4/10	114/4/16	114/4/16
SM-1	26.12	26.01	25.81	25.68	25.69	25.32	25.74	25.71	25.42	-0.69
SM-2	38.29	38.64	38.35	38.20	38.17	37.81	38.07	○	37.77	-0.52
SM-3	41.06	40.98	40.99	40.82	40.72	40.72	40.82	40.86	40.82	-0.23
SM-4	44.23	44.32	44.43	44.09	44.32	44.05	44.15	44.24	44.18	-0.05
SM-5	24.46	23.83	○	○	○	23.98	23.58	23.74	23.53	-0.93
SM-6	25.49	24.98	25.29	25.27	25.21	24.58	○	24.83	24.67	-0.81
SM-7	5.12	4.91	5.31	5.18	5.16	5.04	5.04	4.79	4.71	-0.41
SM-8	-8.17	-8.78	-8.48	-8.61	-8.60	-8.78	-8.69	-8.74	-8.86	-0.69

說明：
1.量測單位：公分
2.累積沉陷量的符號說明：+ 代表上浮 ，-代表沉陷
3.計算公式：累積沉陷量=本次量測高程-初始高程
4.○ 遭施工或車輛阻礙 X 遭破壞
5.基準點位置分別為BM-1 ，假設高程:GL=+1.00m
6.紅色數據表示該點位因遭破壞而新補點的高程初始值
7.SM-7、SM-8於113年12月16日因破壞而新補沉陷觀測點。
8.SM-2於114年2月13日因破壞而新補沉陷觀測點。

地表
注意值 :1.2cm
警戒值 :1.4cm
行動值 :1.7cm

圖 2

各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係

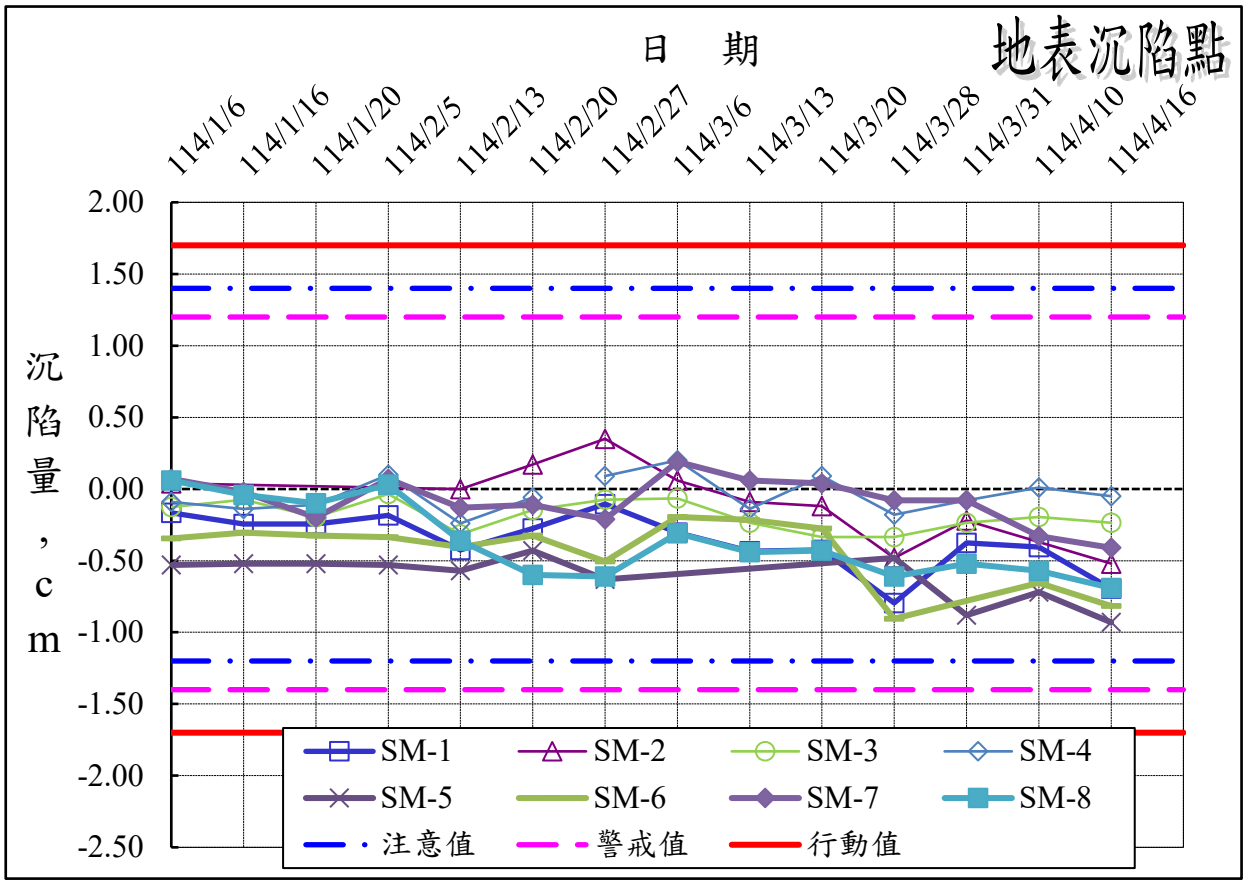


表 3

SID-1 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/2/20	114/2/27	114/3/6	114/3/13	114/3/20	114/3/28	114/3/31	114/4/10	114/4/16	114/4/18
	累積變位量，mm									
-0.5	7.33	7.96	9.62	8.16	14.96	16.65	19.14	22.19	35.35	43.74
-1.0	4.11	4.71	8.02	7.61	11.63	13.20	15.41	18.00	27.33	32.46
-1.5	3.85	4.41	7.55	7.16	11.07	12.62	14.75	17.16	20.80	22.47
-2.0	3.77	4.33	7.25	6.89	10.69	12.19	14.25	16.62	18.70	19.43
-2.5	3.73	4.29	7.03	6.69	10.35	11.85	13.84	16.18	18.09	18.76
-3.0	3.74	4.27	6.91	6.58	10.05	11.53	13.48	15.71	17.45	18.08
-3.5	3.72	4.25	6.78	6.46	9.69	11.22	13.09	15.24	16.79	17.41
-4.0	3.61	4.17	6.53	6.24	9.30	10.84	12.63	14.70	16.09	16.67
-4.5	3.49	4.07	6.36	6.07	8.90	10.42	12.18	14.14	15.35	15.88
-5.0	3.36	3.94	6.04	5.78	8.49	9.97	11.67	13.56	14.65	15.14
-5.5	3.24	3.83	5.77	5.52	8.06	9.53	11.18	12.93	13.90	14.37
-6.0	3.11	3.65	5.42	5.20	7.63	9.00	10.61	12.32	13.20	13.63
-6.5	2.95	3.44	4.93	4.74	7.23	8.42	9.98	11.76	12.63	12.98
-7.0	2.77	3.25	4.56	4.40	6.81	7.89	9.39	11.12	11.91	12.21
-7.5	2.58	3.06	4.21	4.06	6.35	7.38	8.80	10.44	11.16	11.44
-8.0	2.45	2.88	3.83	3.72	5.93	6.89	8.21	9.80	10.45	10.69
-8.5	2.33	2.78	3.65	3.54	5.54	6.48	7.75	9.26	9.76	9.99
-9.0	2.24	2.66	3.45	3.35	5.17	6.08	7.30	8.72	9.11	9.34
-9.5	2.13	2.57	3.40	3.30	4.78	5.77	6.88	8.22	8.42	8.68
-10.0	1.95	2.37	3.07	2.99	4.34	5.30	6.34	7.61	7.76	7.98
-10.5	1.71	2.06	2.59	2.52	3.88	4.73	5.69	6.96	7.12	7.29
-11.0	1.57	1.88	2.20	2.16	3.52	4.29	5.19	6.44	6.59	6.71
-11.5	1.44	1.73	2.08	2.04	3.16	3.96	4.76	5.97	5.99	6.12
-12.0	1.20	1.46	1.56	1.55	2.72	3.44	4.20	5.41	5.49	5.56
-12.5	1.04	1.25	1.27	1.27	2.37	3.01	3.73	4.94	5.04	5.06
-13.0	0.95	1.16	1.24	1.23	2.11	2.75	3.41	4.53	4.52	4.54
-13.5	0.82	1.05	1.27	1.24	1.82	2.49	3.07	4.11	3.95	4.00
-14.0	0.66	0.85	1.01	0.99	1.50	2.12	2.65	3.64	3.47	3.50
-14.5	0.46	0.57	0.51	0.52	1.18	1.64	2.14	3.21	3.10	3.10
-15.0	0.34	0.40	0.20	0.23	0.90	1.32	1.77	2.85	2.76	2.71
-15.5	0.27	0.36	0.19	0.21	0.72	1.13	1.55	2.55	2.36	2.31
-16.0	0.31	0.46	0.59	0.57	0.63	1.11	1.49	2.28	1.91	1.92
-16.5	0.17	0.31	0.35	0.34	0.43	0.87	1.20	2.00	1.62	1.59
-17.0	0.12	0.24	0.26	0.25	0.28	0.69	0.95	1.75	1.33	1.28
-17.5	0.08	0.16	0.10	0.11	0.16	0.49	0.72	1.57	1.15	1.07
-18.0	0.08	0.14	0.08	0.09	0.10	0.39	0.58	1.43	0.97	0.87
-18.5	0.07	0.13	0.06	0.07	0.04	0.30	0.47	1.05	1.17	0.87
-19.0	0.03	0.08	-0.02	-0.01	-0.04	0.15	0.28	0.62	0.41	0.39
-19.5	0.05	0.11	-0.01	0.01	-0.08	0.09	0.15	0.04	0.02	0.09
-20.0	-0.11	-0.04	-0.22	-0.19	-0.19	-0.13	-0.14	-0.25	-0.65	-0.34
備註:0~-1M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 3

各階段施工的 SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係

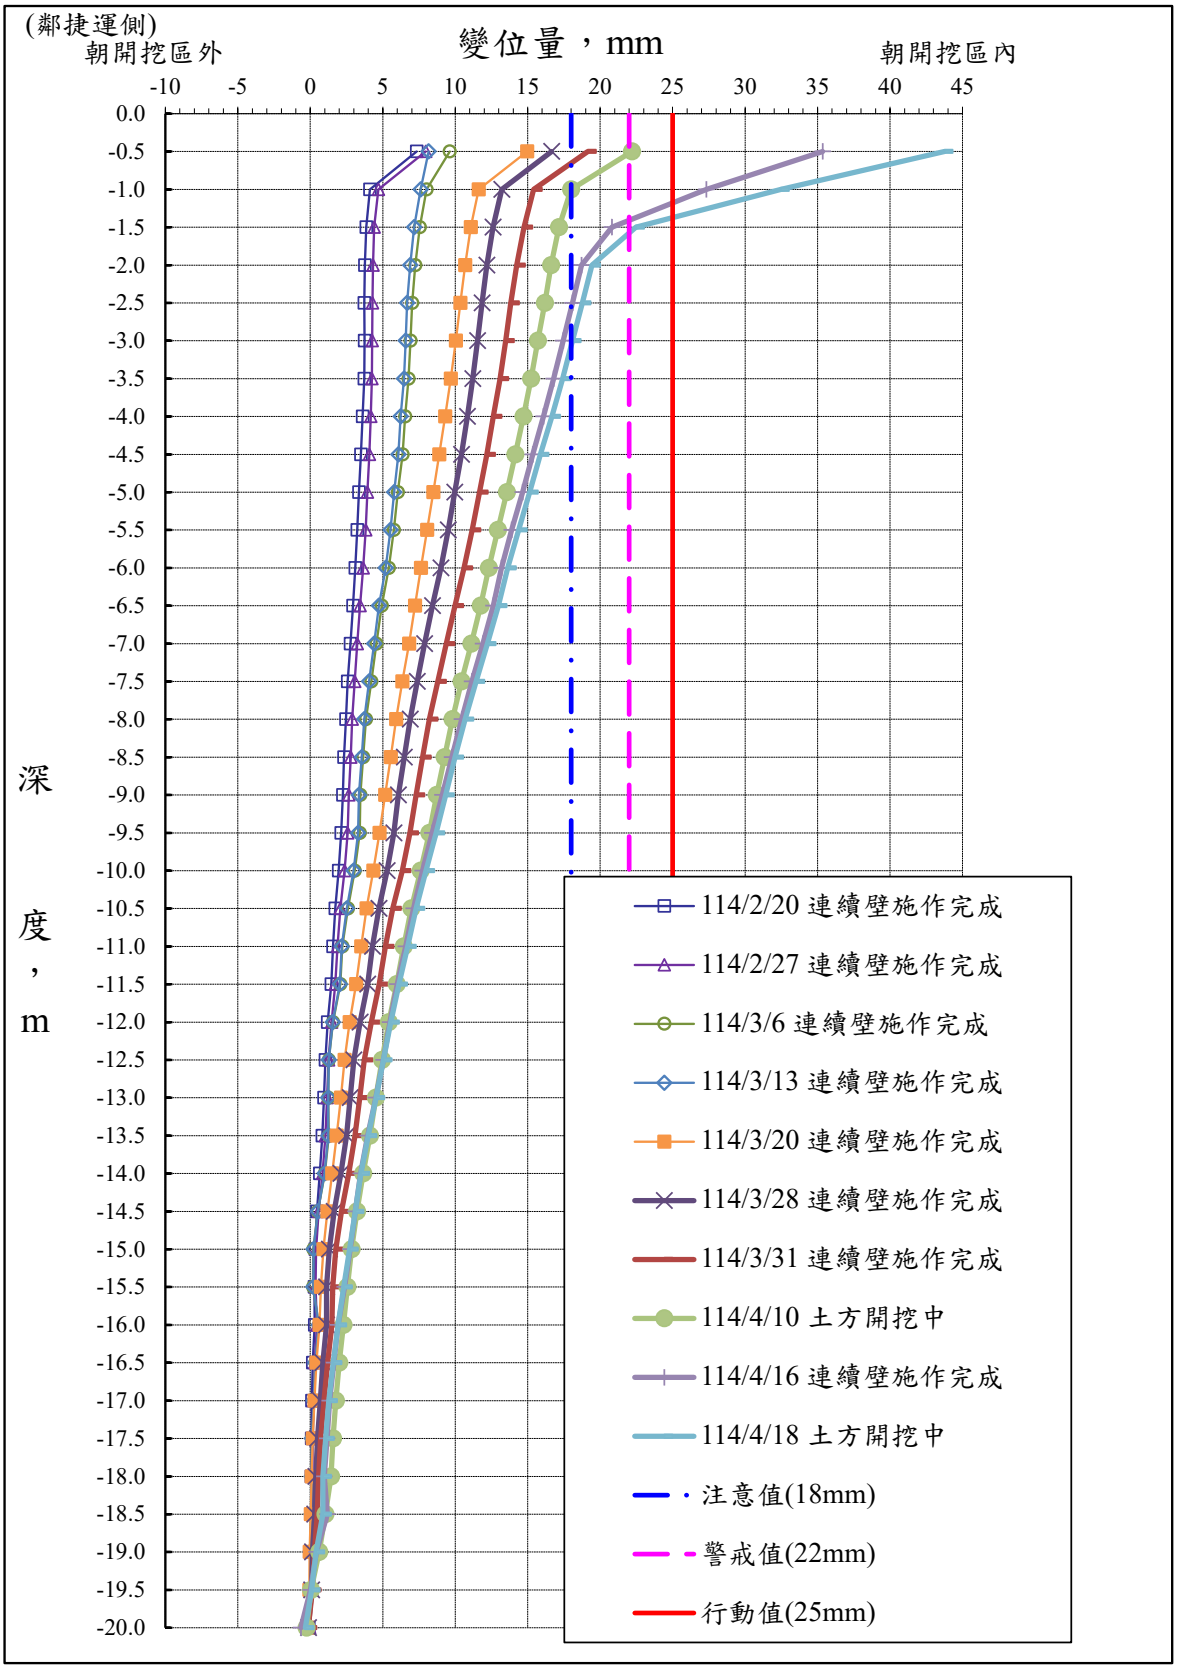


表 4

SID-2 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/2/13	114/2/20	114/2/27	114/3/6	114/3/13	114/3/20	114/3/28	114/3/31	114/4/10	114/4/18
	累積變位量，mm									
-0.5	2.79	2.90	4.11	6.30	6.53	9.10	7.65	12.90	17.20	遭現場施工破壞而無法測量
-1.0	1.27	1.17	2.30	4.35	4.60	7.25	6.10	11.20	15.37	
-1.5	1.16	1.09	2.16	4.16	4.40	6.99	6.06	11.04	15.12	
-2.0	1.12	1.01	2.08	3.99	4.25	6.80	5.98	10.87	14.89	
-2.5	1.11	0.95	2.01	3.84	4.15	6.77	7.46	12.37	16.38	
-3.0	1.15	0.93	1.96	3.58	3.98	6.75	8.12	12.98	16.94	
-3.5	1.18	0.96	1.94	3.44	3.90	6.75	9.23	14.01	17.95	
-4.0	1.20	0.93	1.94	3.22	3.78	6.77	10.51	15.26	19.27	
-4.5	1.22	0.93	1.97	3.07	3.69	6.74	10.77	15.49	19.44	
-5.0	1.27	0.96	1.96	2.98	3.66	6.78	11.95	16.59	20.52	
-5.5	1.30	1.00	1.96	2.90	3.56	6.49	10.65	15.20	19.00	
-6.0	1.30	0.97	1.92	2.89	3.49	6.25	9.74	14.21	17.86	
-6.5	1.28	0.94	1.91	2.86	3.44	6.12	9.39	13.78	17.35	
-7.0	1.25	0.93	1.85	2.82	3.36	5.77	9.12	13.41	16.89	
-7.5	1.24	0.95	1.81	2.77	3.31	5.47	8.86	13.05	16.42	
-8.0	1.21	0.94	1.78	2.76	3.30	6.19	8.38	12.49	15.82	
-8.5	1.24	0.91	1.72	2.52	3.12	5.97	8.32	12.45	15.68	
-9.0	1.20	0.87	1.67	2.53	3.06	5.77	7.43	11.47	14.58	
-9.5	1.13	0.80	1.57	2.48	2.94	5.43	6.17	10.06	13.05	
-10.0	1.00	0.65	1.38	2.33	2.77	5.31	5.23	9.04	11.89	
-10.5	0.90	0.53	1.28	2.17	2.63	5.03	6.87	10.67	13.65	
-11.0	0.96	0.51	1.23	1.83	2.48	5.50	9.59	13.38	16.40	
-11.5	1.00	0.51	1.17	1.59	2.32	5.33	9.55	13.29	16.21	
-12.0	1.05	0.57	1.24	1.72	2.38	5.16	8.30	11.98	14.84	
-12.5	1.07	0.70	1.35	1.99	2.51	5.01	6.20	9.78	12.53	
-13.0	1.14	0.85	1.42	2.25	2.67	5.10	5.84	9.38	12.09	
-13.5	1.20	0.90	1.49	2.30	2.74	5.24	6.46	9.98	12.76	
-14.0	1.26	0.93	1.58	2.27	2.79	5.46	7.48	10.98	13.72	
-14.5	1.30	0.96	1.60	2.38	2.77	5.01	4.25	7.72	10.21	
-15.0	1.25	0.98	1.53	2.58	2.80	4.75	2.07	5.40	7.81	
-15.5	1.18	0.93	1.36	2.63	2.81	4.80	2.98	6.30	8.78	
-16.0	1.20	0.90	1.38	2.40	2.70	4.89	3.90	7.23	9.76	
-16.5	1.25	0.97	1.37	2.39	2.71	4.84	3.49	6.78	9.31	
-17.0	1.26	1.00	1.36	2.44	2.73	4.89	4.25	7.53	10.15	
-17.5	1.36	1.01	1.38	2.15	2.70	5.21	6.88	10.19	12.91	
-18.0	1.38	1.05	1.39	2.35	2.80	4.08	1.19	2.65	5.19	
-18.5	1.45	1.26	1.24	2.04	2.05	2.43	-5.06	-3.19	-1.10	
-19.0	1.22	1.32	1.17	2.07	1.99	2.32	-5.63	-3.69	-1.72	
-19.5	0.73	0.55	0.44	1.26	1.30	2.00	-1.79	-0.83	1.33	
-20.0	0.30	0.17	0.17	0.32	0.67	1.33	-0.58	-0.09	0.99	
備註:0~-1M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 4

各階段施工的 SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係

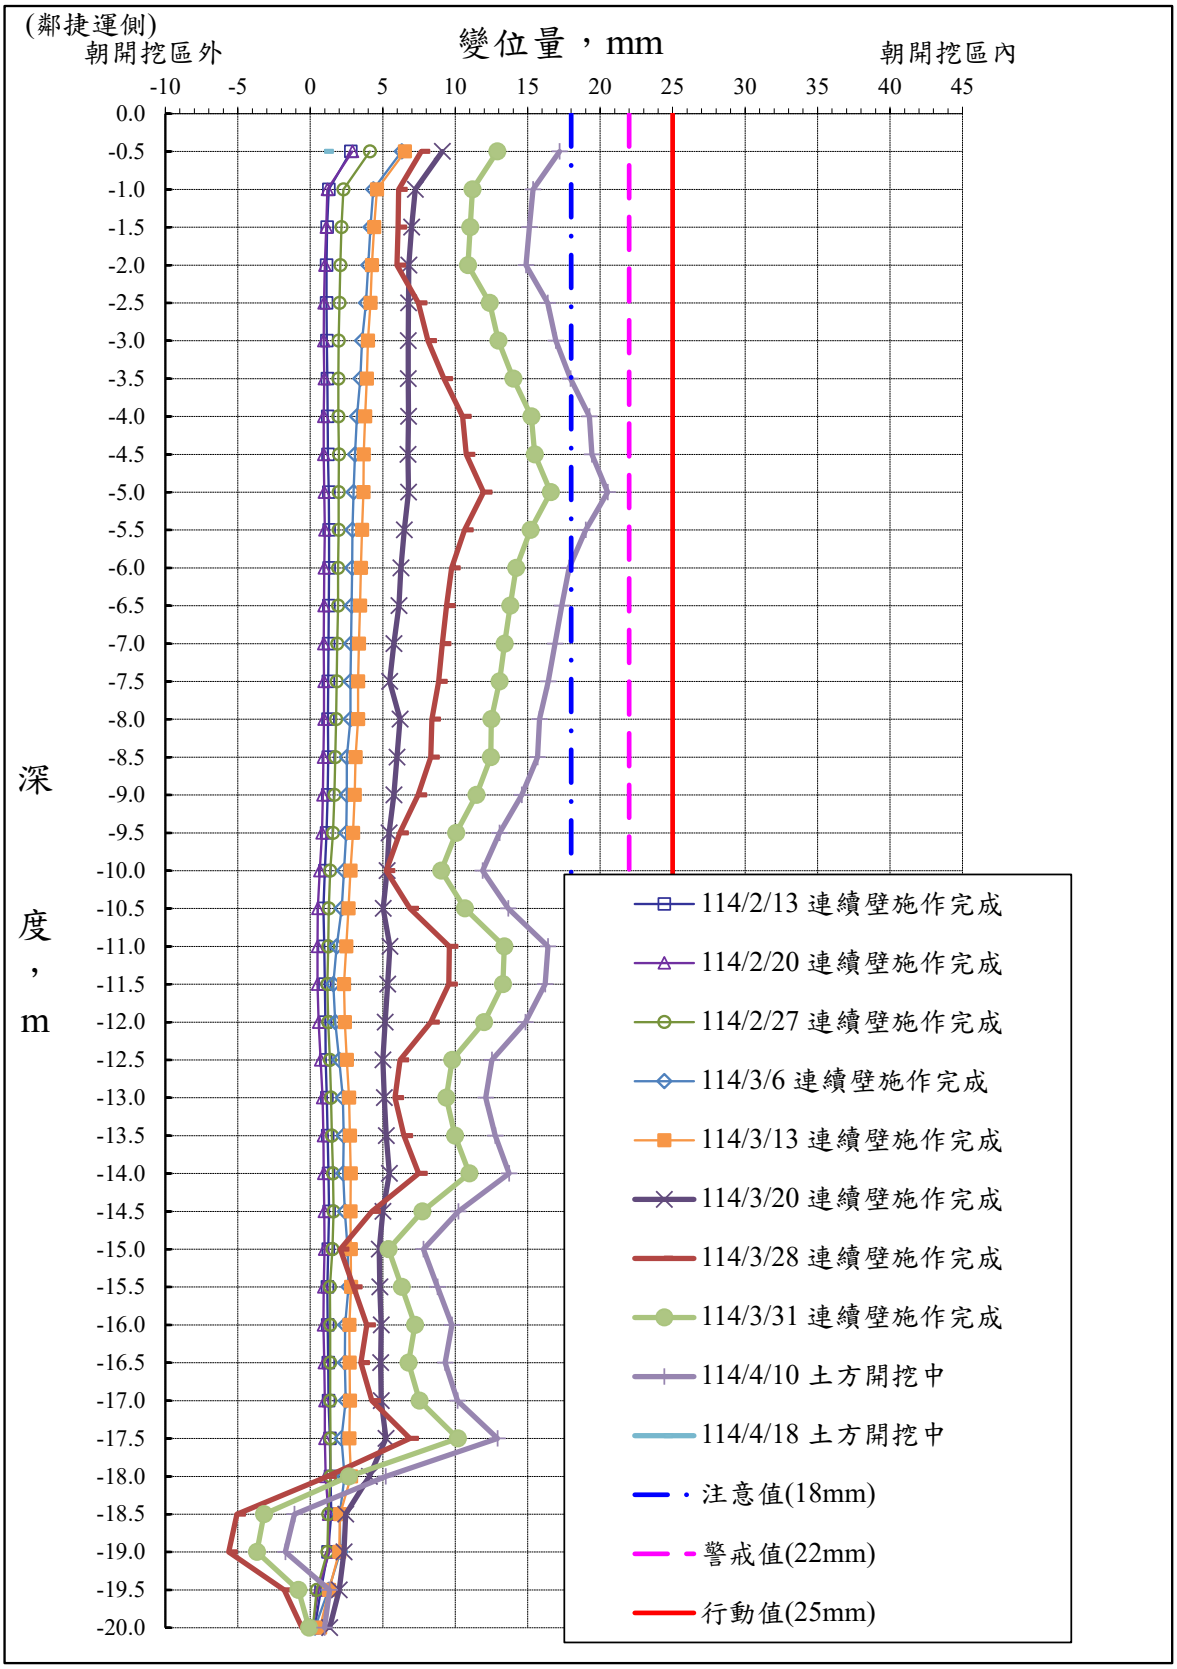


表 5

大地監測報表--擋土壁鋼筋計監測報表

觀測儀器： 擋土壁鋼筋計(RB)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 鋼筋應力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*鋼筋彈性模數*(10^-6)

觀測日期： 114年 4月 12日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 4月 13日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 4月 14日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 4月 15日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

表 5-1

大地監測報表--擋土壁鋼筋計監測報表

觀測儀器： 擋土壁鋼筋計(RB)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 鋼筋應力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*鋼筋彈性模數*(10^-6)

觀測日期： 114年 4月 16日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 4月 17日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 4月 18日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	-	-	2100/2520	3360

圖 5　瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

擋土壁鋼筋計歷時曲線圖

日期	114/3/31	114/4/4	114/4/5	114/4/6	114/4/7	114/4/8	114/4/9	114/4/10	114/4/11	114/4/12	114/4/13	114/4/14	114/4/15	114/4/16	114/4/17	114/4/18
儀器編號	連續壁施作完	連續壁施作完	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中	土方開挖中
RB-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

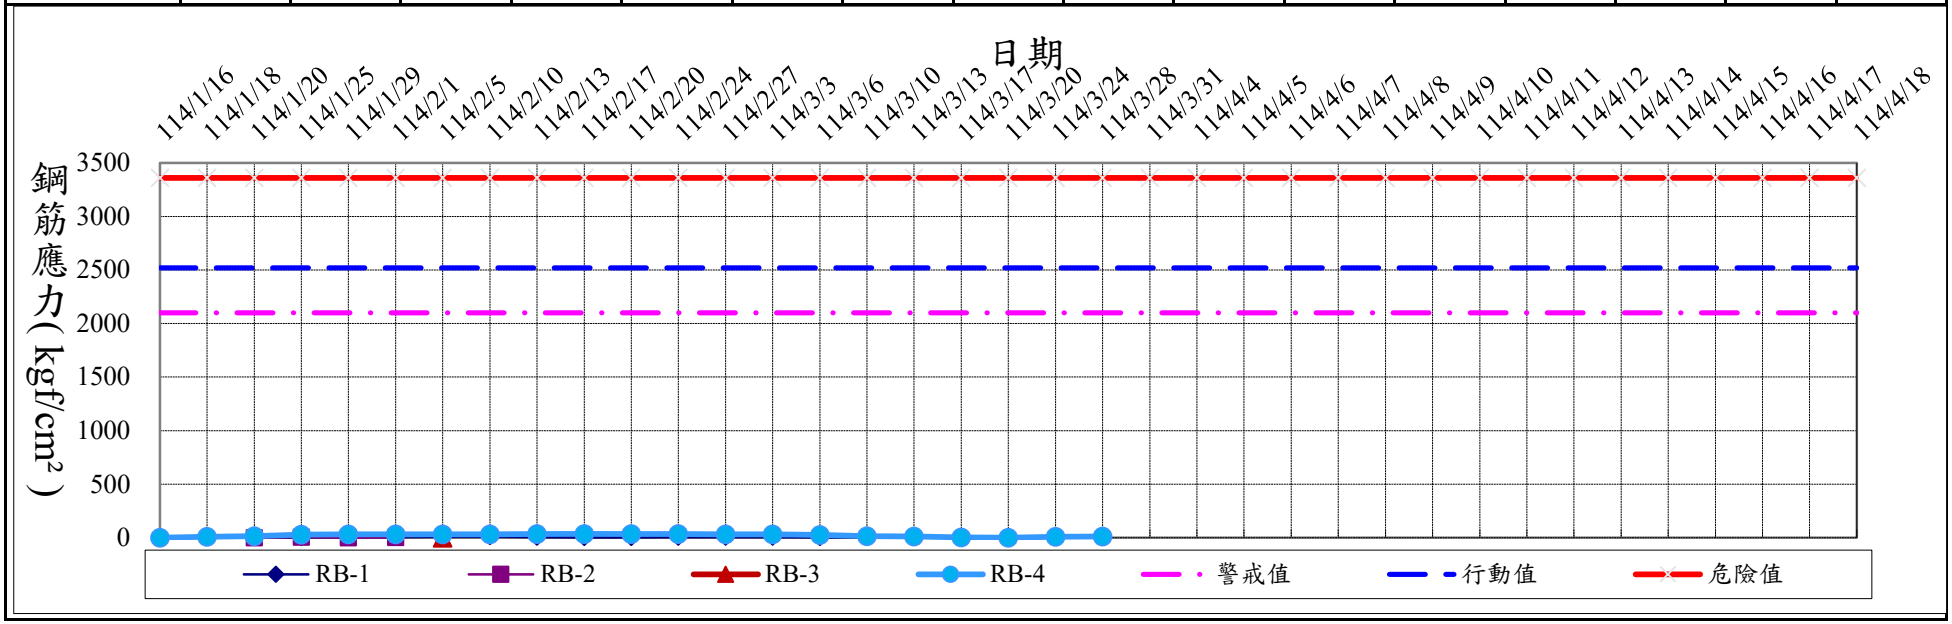


圖 6 監測記錄照片

