台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測系統工作
(114/09/17)

法定監造單位：大矩聯合建築師事務所

結構技師：中立工程顧問社　黃文鈺技師

監造單位：中鹿營造股份有限公司　設計室

承攬廠商：中鹿營造股份有限公司

專任工程人員：張程凱技師

工地主任：梁祖淀

協力廠商：加基工程有限公司

中華民國 114 年 09 月 19 日

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

			頁次
		安全監測結果說明	I
圖	1	安全監測系統配置圖	1
表	1	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	2
表	2	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	3
表	3	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	4
圖	2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	5
圖	3	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	6
圖	4	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	7
圖	5	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	8
圖	6	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	9
圖	7	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	10
圖	8	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	11
表	4	TI-1 建物傾斜計量測記錄	12
表	5	TI-2 建物傾斜計量測記錄	13
表	6	TI-3 建物傾斜計量測記錄	14
表	7	TI-4 建物傾斜計量測記錄	15
表	8	TI-5 建物傾斜計量測記錄	16
表	9	水位觀測井量測紀錄	17
表	10	SIS-1 土中傾度管量測紀錄	18
圖	9	各施工階段的SIS-1土中傾度管變位與深度之關係	19
表	11	SIS-2 土中傾度管量測紀錄	20
圖	10	各施工階段的SIS-2土中傾度管變位與深度之關係	21
表	12	SIS-3 土中傾度管量測紀錄	22
圖	11	各施工階段的SIS-3土中傾度管變位與深度之關係	23
表	13	SIS-4 土中傾度管量測紀錄	24
圖	12	各施工階段的SIS-4土中傾度管變位與深度之關係	25
表	14	SIS-5 土中傾度管量測紀錄	26
圖	13	各施工階段的SIS-5土中傾度管變位與深度之關係	27

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

表 15 SIS-6 土中傾度管量測紀錄 ---------- 28
圖 14 各施工階段的SIS-6土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 29
表 16 SIS-7 土中傾度管量測紀錄 ---------- 30
圖 15 各施工階段的SIS-7土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 31
表 17 SIS-8 土中傾度管量測紀錄 ---------- 32
圖 16 各施工階段的SIS-8土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 33
表 18 SIS-9 土中傾度管量測紀錄 ---------- 34
圖 17 各施工階段的SIS-9土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 35
表 19 SIS-10 土中傾度管量測紀錄 ---------- 36
圖 18 各施工階段的SIS-10土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 37
表 20 SIS-11 土中傾度管量測紀錄 ---------- 38
圖 19 各施工階段的SIS-11土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 39
表 21 SIS-12 土中傾度管量測紀錄 ---------- 40
圖 20 各施工階段的SIS-12土中傾度管變位與深度之關係 ---------- 41

安全監測工作說明-114 年 09 月 17 日報告


一、綜合分析說明：

1. 沉陷觀測點在 114/09/17 量測時有明顯變化增加，測值已超過「行動值」，因沉陷觀測點(S14~S26)有重車行駛、鄰近其他工地抽水、工地抽水及現階段斜撐和圍令拆除導致測值明顯變化，沉陷觀測點(S61~S70)有明顯增加，可能是工地抽水、重車行駛及現階段斜撐和圍令拆除導致測值有明顯增加。建物傾斜計在 114/09/17 量測時微量變化，測值未超過「警戒值」。
2. 水位觀測井在觀測期間 114/09/17 量測時無明顯增加，OW3 測值未超過「警戒值」，研判因鄰近工地控制抽水所導致地下水位上升。
3. 土中傾度管在 114//09/17 量測時有微量增加，土中傾度管(SIS-1、SIS-2、SIS-4)測值有微量變化已超過「行動值」及土中傾度管(SIS-12)測值有微量增加已超過「警戒值」，現階段部份傾斜管測值持續微量增加變化約 1mm~4mm 間變化，研判因現階段大底構築完成及斜撐和圍令拆除導致鋼鈑樁微量變形，需多注意四周環境。

AFM-A007

1

觀測儀器配置表:				
觀測儀器	儀器編號	數量	裝設深度(m)	備　註
土中傾度管	SIS-1~12	12支	約GL-15m	埋置於開挖面外土壤內
水位觀測井	OW-1~5	5支	約GL-20m	
沈陷觀測點	S1~70 D1~4	74處		沿開挖周圍所設置位置由現場監造人員指定
建物傾斜計	TI-1~5	5處		裝設於鄰房最高層建物牆面上

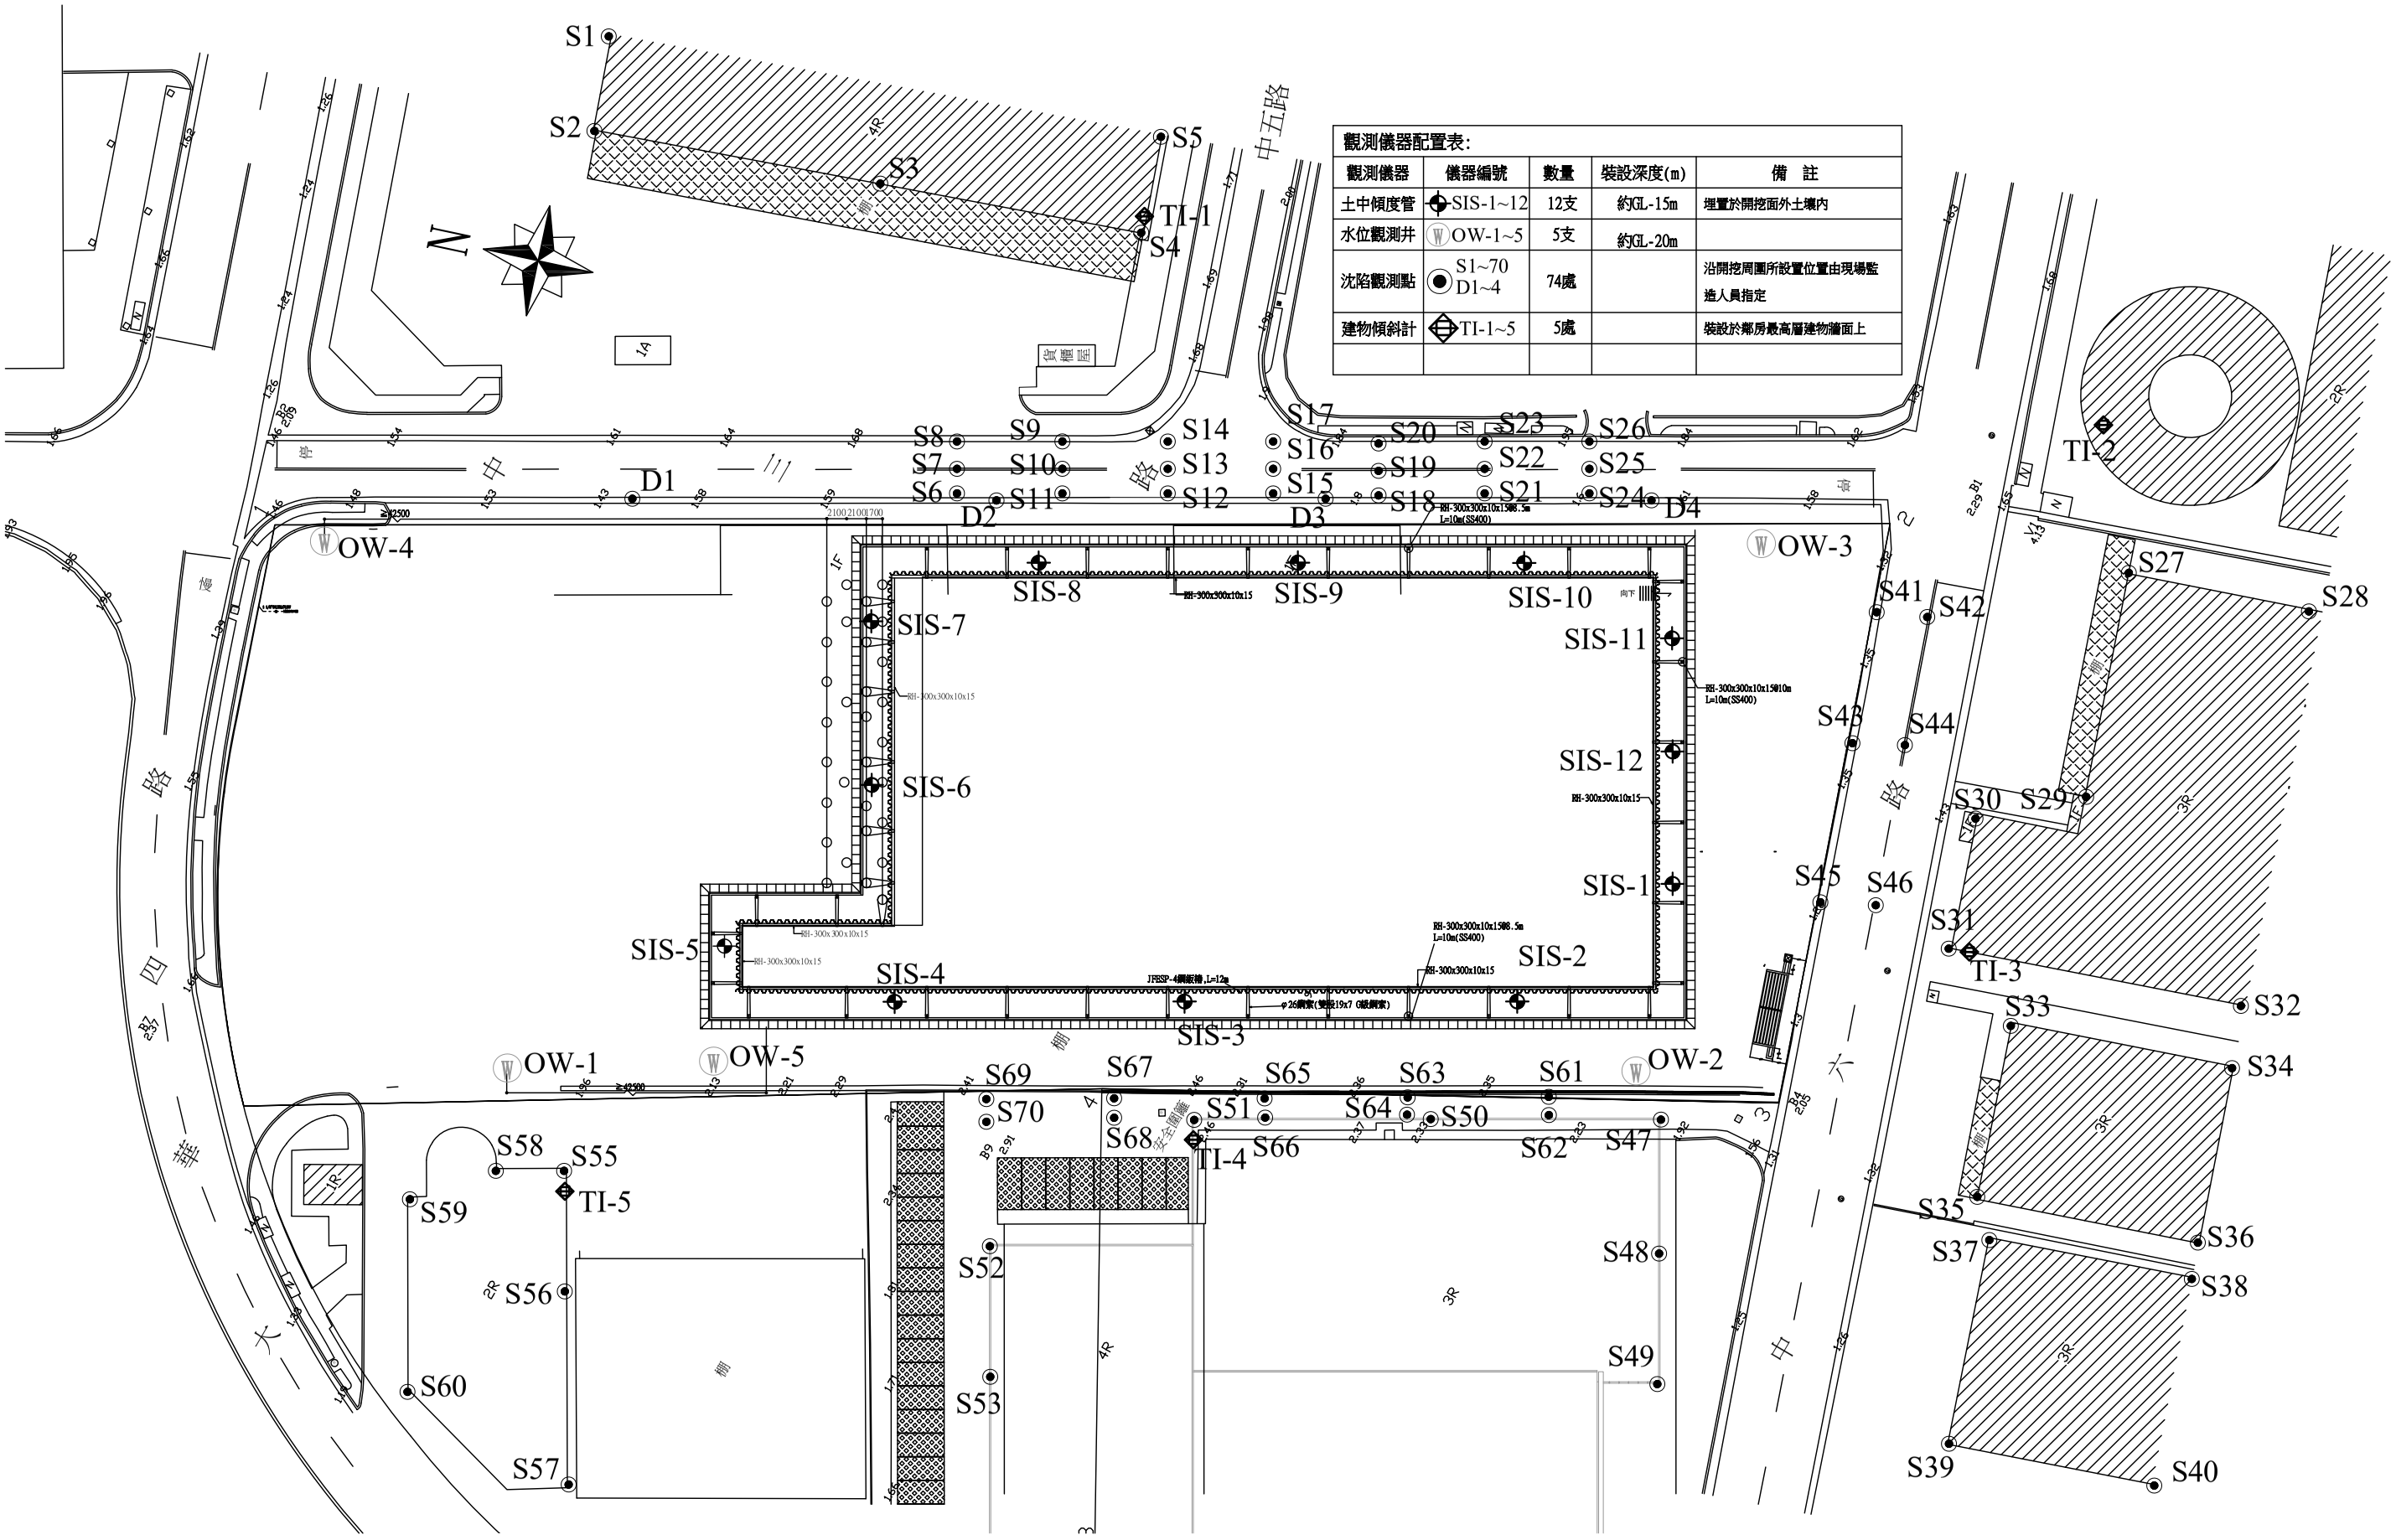

加基工程有限公司
Geodesik Engineering Co.,Lt

圖 1 安全監測系統配置圖

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測點

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 34 ℃
監測日期： 114 年 09月17日　AM:0930~1130　　濕度： 60 %
觀測儀器： 沉陷觀測點　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.00m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S1	114.02.05	120.43	120.03	-0.34	-0.40	3.0/4.0	GL：1.00m	
S2	114.02.05	122.99	122.41	-	-0.58	3.0/4.0	GL：1.00m	
S3	114.02.05	123.47	121.89	-	-1.58	3.0/4.0	GL：1.00m	
S4	114.02.05	126.06	123.38	-2.48	-2.68	3.0/4.0	GL：1.00m	
S5	114.02.05	123.80	121.26	-2.26	-2.54	3.0/4.0	GL：1.00m	
S6	114.02.05	31.36	23.59	-	-7.77	3.0/4.0	GL：1.00m	
S7	114.02.05	35.60	28.29	-6.90	-7.31	3.0/4.0	GL：1.00m	
S8	114.02.05	32.97	27.58	-5.02	-5.39	3.0/4.0	GL：1.00m	
S9	114.02.05	30.86	23.03	-	-7.83	3.0/4.0	GL：1.00m	
S10	114.02.05	36.93	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S11	114.02.05	38.31	32.53	-5.12	-5.78	3.0/4.0	GL：1.00m	
S12	114.02.05	27.24	-	-7.54	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S13	114.07.16	26.57	-	-1.12	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S14	114.02.05	32.89	27.83	-4.77	-5.06	3.0/4.0	GL：1.00m	
S15	114.02.05	19.37	-	-6.23	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S16	114.02.05	26.24	20.76	-5.26	-5.48	3.0/4.0	GL：1.00m	
S17	114.02.05	28.83	23.78	-4.78	-5.05	3.0/4.0	GL：1.00m	
S18	114.02.05	18.50	-	-6.43	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S19	114.02.05	25.13	-	-6.13	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S20	114.02.05	26.14	20.25	-5.50	-5.89	3.0/4.0	GL：1.00m	
S21	114.02.05	18.06	-	-6.13	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S22	114.02.05	22.80	16.86	-5.75	-5.94	3.0/4.0	GL：1.00m	
S23	114.02.05	23.44	17.56	-5.60	-5.88	3.0/4.0	GL：1.00m	
S24	114.02.13	18.85	-	-7.59	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
S25	114.02.05	26.99	21.24	-5.52	-5.75	3.0/4.0	GL：1.00m	
S26	114.02.05	30.27	25.29	-4.75	-4.98	3.0/4.0	GL：1.00m	
S27	114.02.05	60.35	58.81	-1.37	-1.54	3.0/4.0	GL：1.00m	
S28	114.02.05	118.63	118.10	-0.53	-0.53	3.0/4.0	GL：1.00m	
S29	114.02.05	80.33	-	-1.30	-	3.0/4.0	GL：1.00m	車輛阻擋
S30	114.02.05	73.26	71.68	-1.35	-1.58	3.0/4.0	GL：1.00m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測點

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 34 ℃
監測日期： 114 年 09月17日　AM:0930~1130　　濕度： 60 %
觀測儀器： 沉陷觀測點　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.00m


儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S31	114.02.05	52.84	51.00	-1.58	-1.84	3.0/4.0	GL：1.00m	
S32	114.02.05	49.21	48.43	-0.68	-0.78	3.0/4.0	GL：1.00m	
S33	114.02.05	46.69	46.08	-0.45	-0.61	3.0/4.0	GL：1.00m	
S34	114.02.05	49.37	49.02	-0.13	-0.35	3.0/4.0	GL：1.00m	
S35	114.02.05	49.55	49.53	0.14	-0.02	3.0/4.0	GL：1.00m	
S36	114.02.05	49.93	49.90	0.08	-0.03	3.0/4.0	GL：1.00m	
S37	114.02.05	241.74	241.97	0.29	0.23	3.0/4.0	GL：1.00m	
S38	114.02.05	248.36	248.47	0.26	0.11	3.0/4.0	GL：1.00m	
S39	114.02.05	237.60	237.91	0.53	0.31	3.0/4.0	GL：1.00m	
S40	114.02.05	239.48	239.81	0.62	0.33	3.0/4.0	GL：1.00m	
S41	114.07.16	9.86	9.20	-0.55	-0.66	3.0/4.0	GL：1.00m	
S42	114.07.16	25.43	24.57	-0.69	-0.86	3.0/4.0	GL：1.00m	
S43	114.07.16	8.76	8.28	-0.19	-0.48	3.0/4.0	GL：1.00m	
S44	114.07.16	21.46	20.72	-0.49	-0.74	3.0/4.0	GL：1.00m	
S45	114.07.16	7.40	6.94	-0.24	-0.46	3.0/4.0	GL：1.00m	
S46	114.07.16	19.73	18.81	-0.68	-0.92	3.0/4.0	GL：1.00m	
S47	114.02.05	132.71	132.74	0.17	0.03	3.0/4.0	GL：1.00m	
S48	114.02.05	83.77	83.92	0.51	0.15	3.0/4.0	GL：1.00m	
S49	114.02.05	135.35	135.69	0.64	0.34	3.0/4.0	GL：1.00m	
S50	114.02.05	104.44	104.70	0.64	0.26	3.0/4.0	GL：1.00m	
S51	114.02.05	115.32	115.43	0.36	0.11	3.0/4.0	GL：1.00m	
S52	114.02.05	109.36	108.19	-0.84	-1.17	3.0/4.0	GL：1.00m	
S53	114.02.05	104.23	-	-0.48	-	3.0/4.0	GL：1.00m	車輛阻擋
S54	114.02.05	104.19	-	0.11	-	3.0/4.0	GL：1.00m	車輛阻擋
S55	114.02.05	64.38	64.04	-0.13	-0.34	3.0/4.0	GL：1.00m	
S56	114.02.05	153.44	153.65	0.35	0.21	3.0/4.0	GL：1.00m	
S57	114.02.05	121.20	121.63	0.60	0.43	3.0/4.0	GL：1.00m	
S58	114.02.05	94.94	94.65	-0.08	-0.29	3.0/4.0	GL：1.00m	
S59	114.02.05	69.34	69.40	0.19	0.06	3.0/4.0	GL：1.00m	
S60	114.02.05	61.36	61.87	0.62	0.51	3.0/4.0	GL：1.00m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測點


工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 34 ℃
監測日期： 114 年 09月17日　AM:0930~1130　　濕度： 60 %
觀測儀器： 沉陷觀測點　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.00m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S61	114.05.02	78.98	76.89	-1.80	-2.09	3.0/4.0	GL：1.00m	
S62	114.05.02	89.43	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.00m	AC蓋住
S63	114.05.02	94.40	90.57	-3.34	-3.83	3.0/4.0	GL：1.00m	
S64	114.05.02	97.38	94.38	-2.76	-3.00	3.0/4.0	GL：1.00m	
S65	114.05.02	89.29	84.60	-4.27	-4.69	3.0/4.0	GL：1.00m	
S66	114.05.02	92.12	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.00m	AC蓋住
S67	114.05.02	91.31	87.00	-4.03	-4.31	3.0/4.0	GL：1.00m	
S68	114.05.02	93.19	88.94	-3.95	-4.25	3.0/4.0	GL：1.00m	
S69	114.05.02	82.99	79.68	-2.94	-3.31	3.0/4.0	GL：1.00m	
S70	114.05.02	84.97	82.05	-2.63	-2.92	3.0/4.0	GL：1.00m	
D1	114.05.16	22.89	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
D2	114.05.16	26.81	20.20	-	-6.61	3.0/4.0	GL：1.00m	
D3	114.05.16	15.43	-	-3.02	-	3.0/4.0	GL：1.00m	鋼筋阻擋
D4	114.05.16	18.84	15.70	-2.92	-3.14	3.0/4.0	GL：1.00m	


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

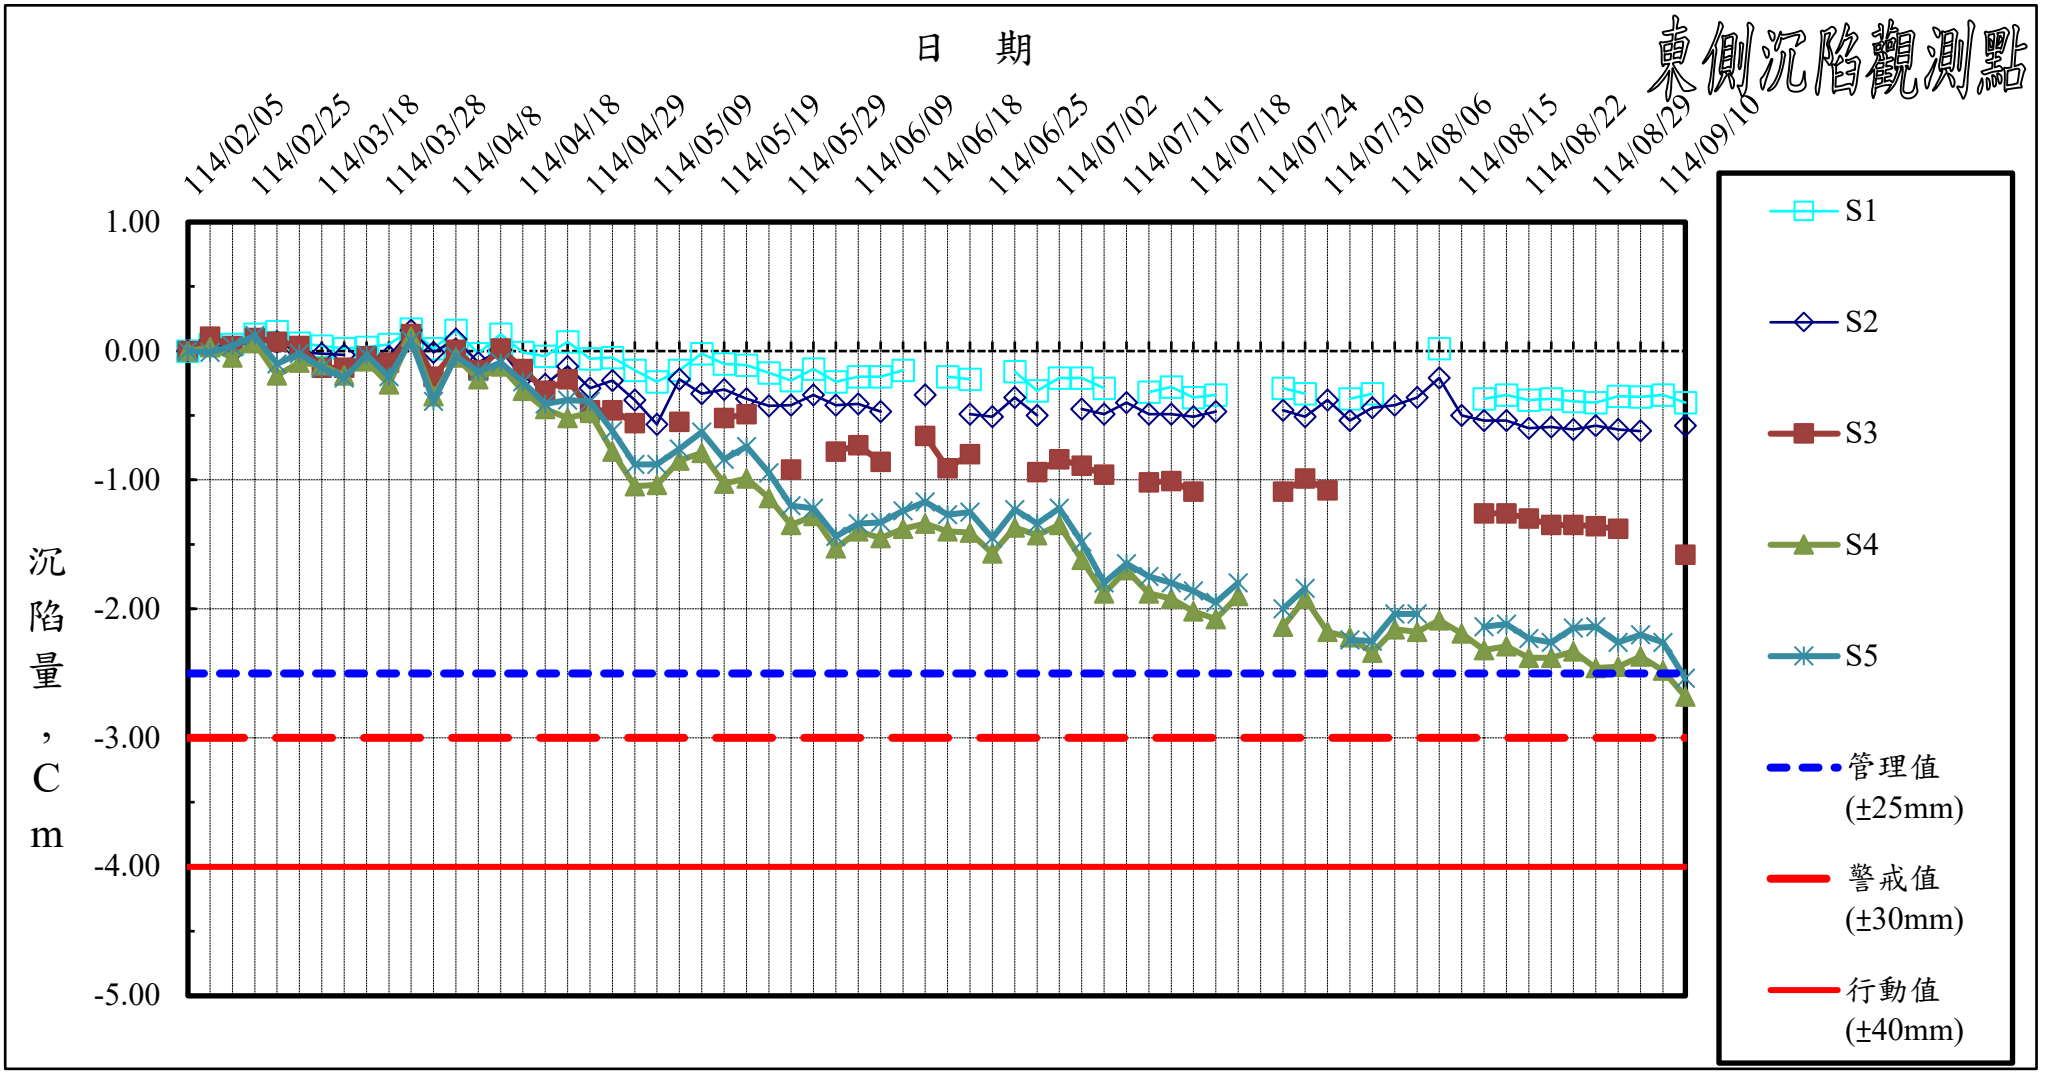


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

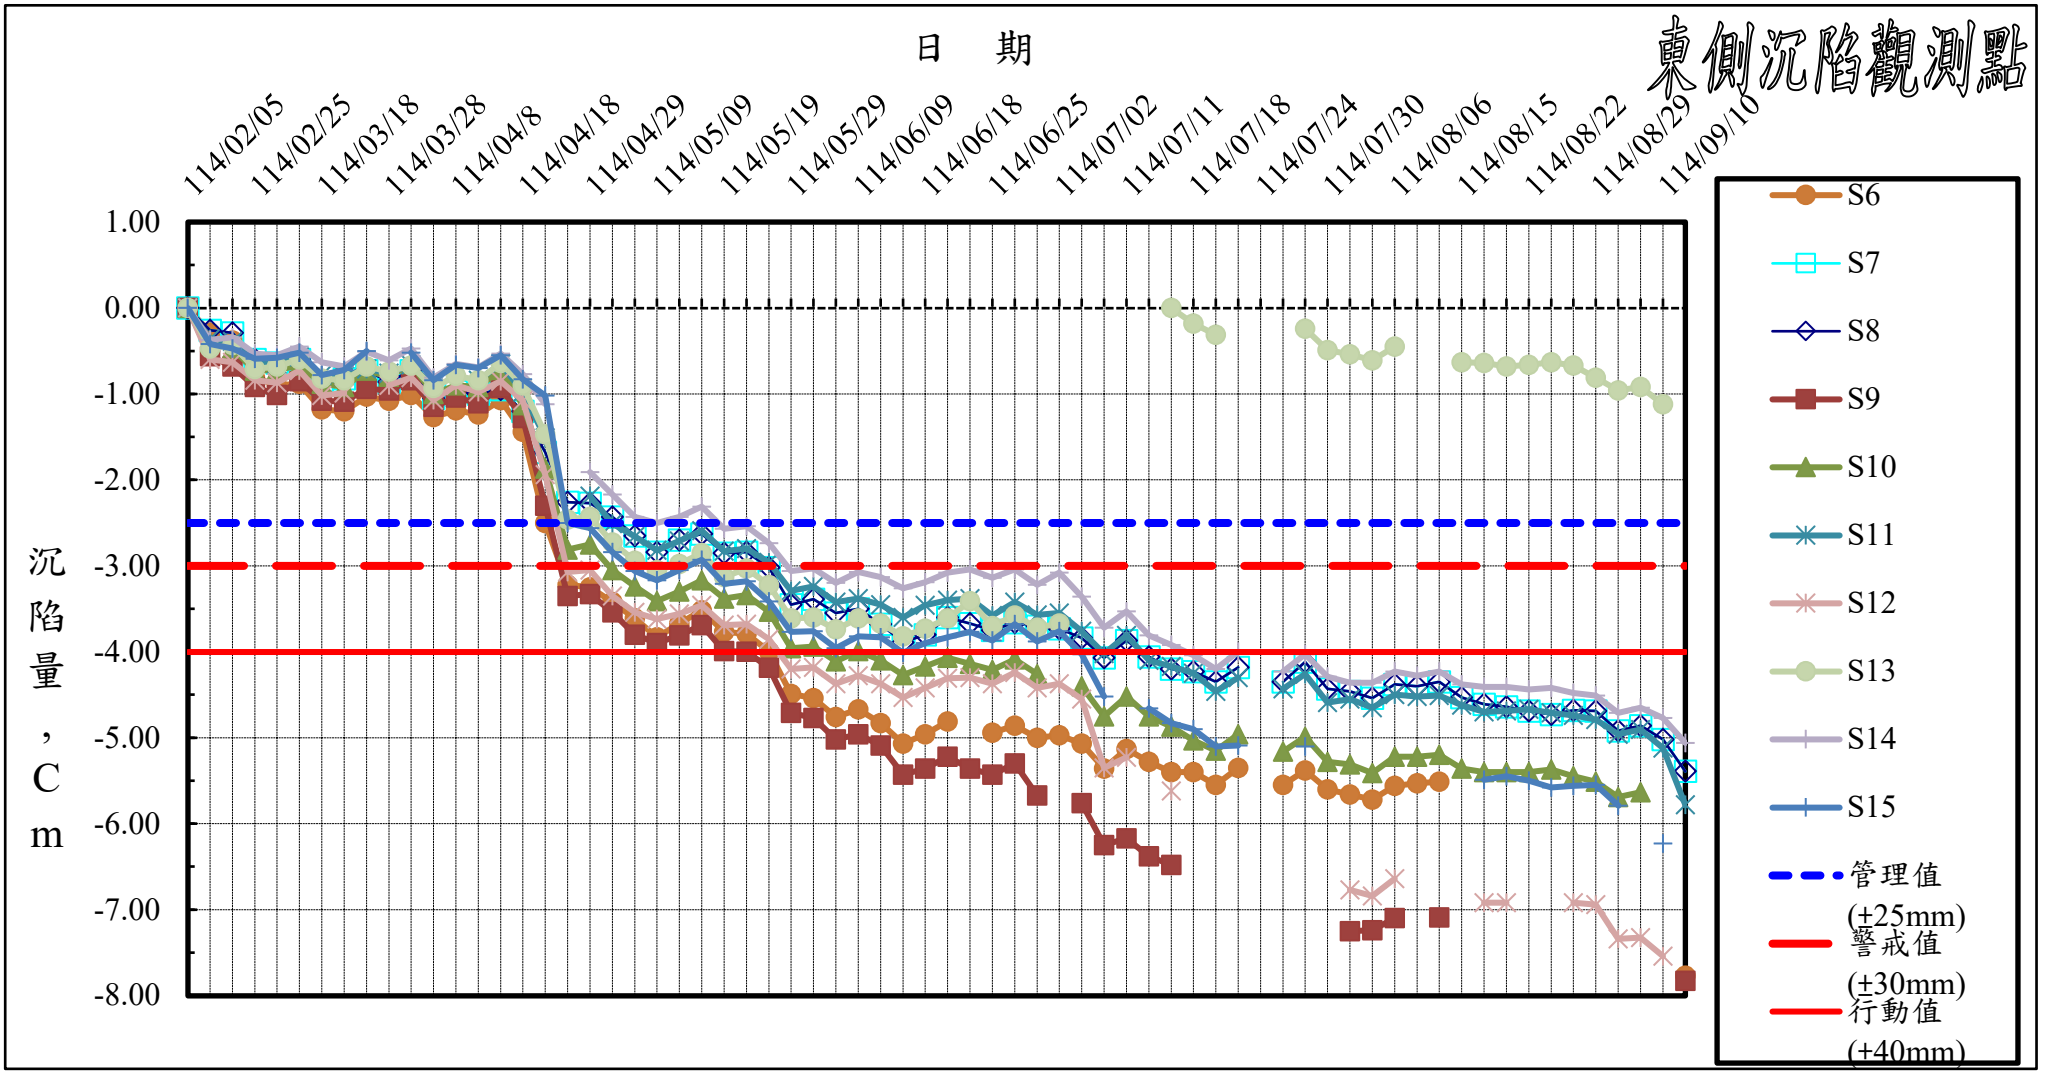


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

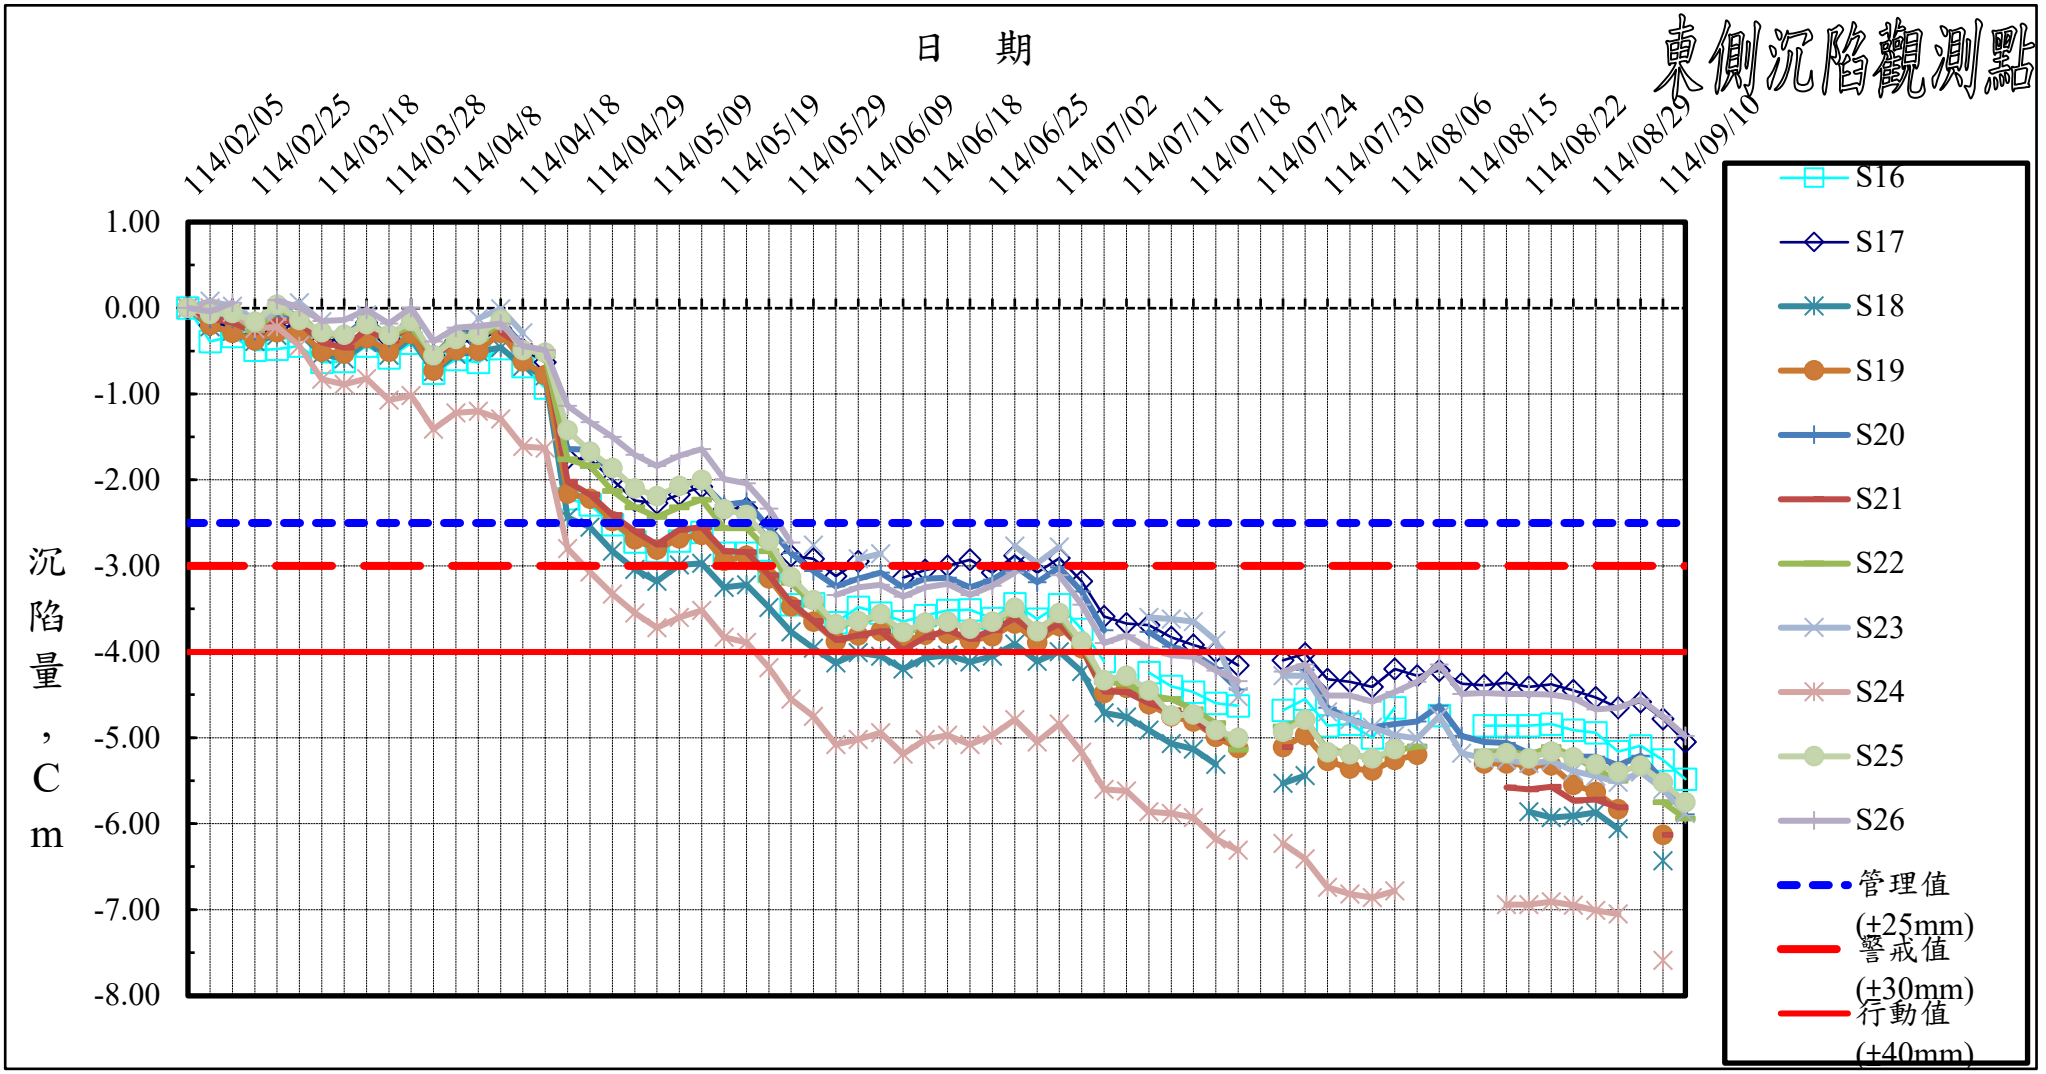


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

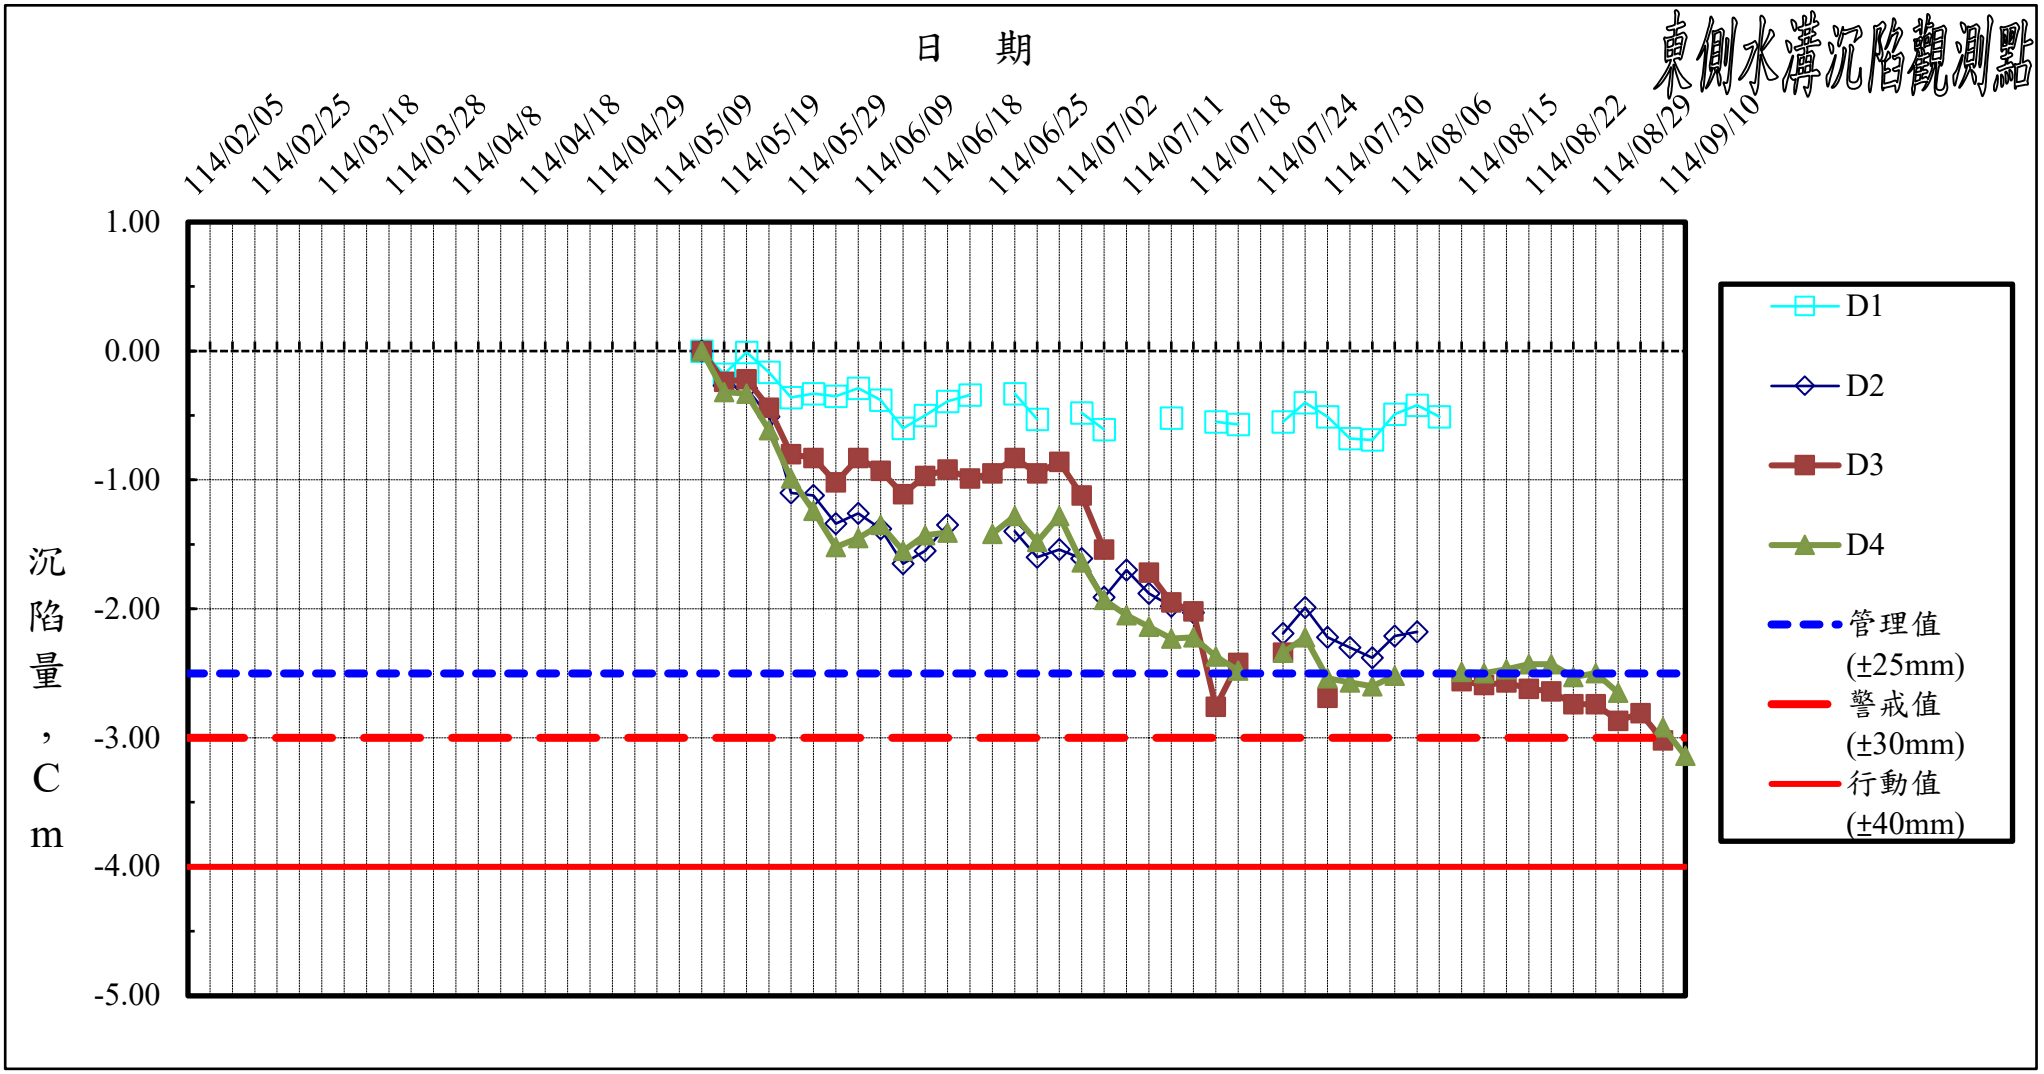


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

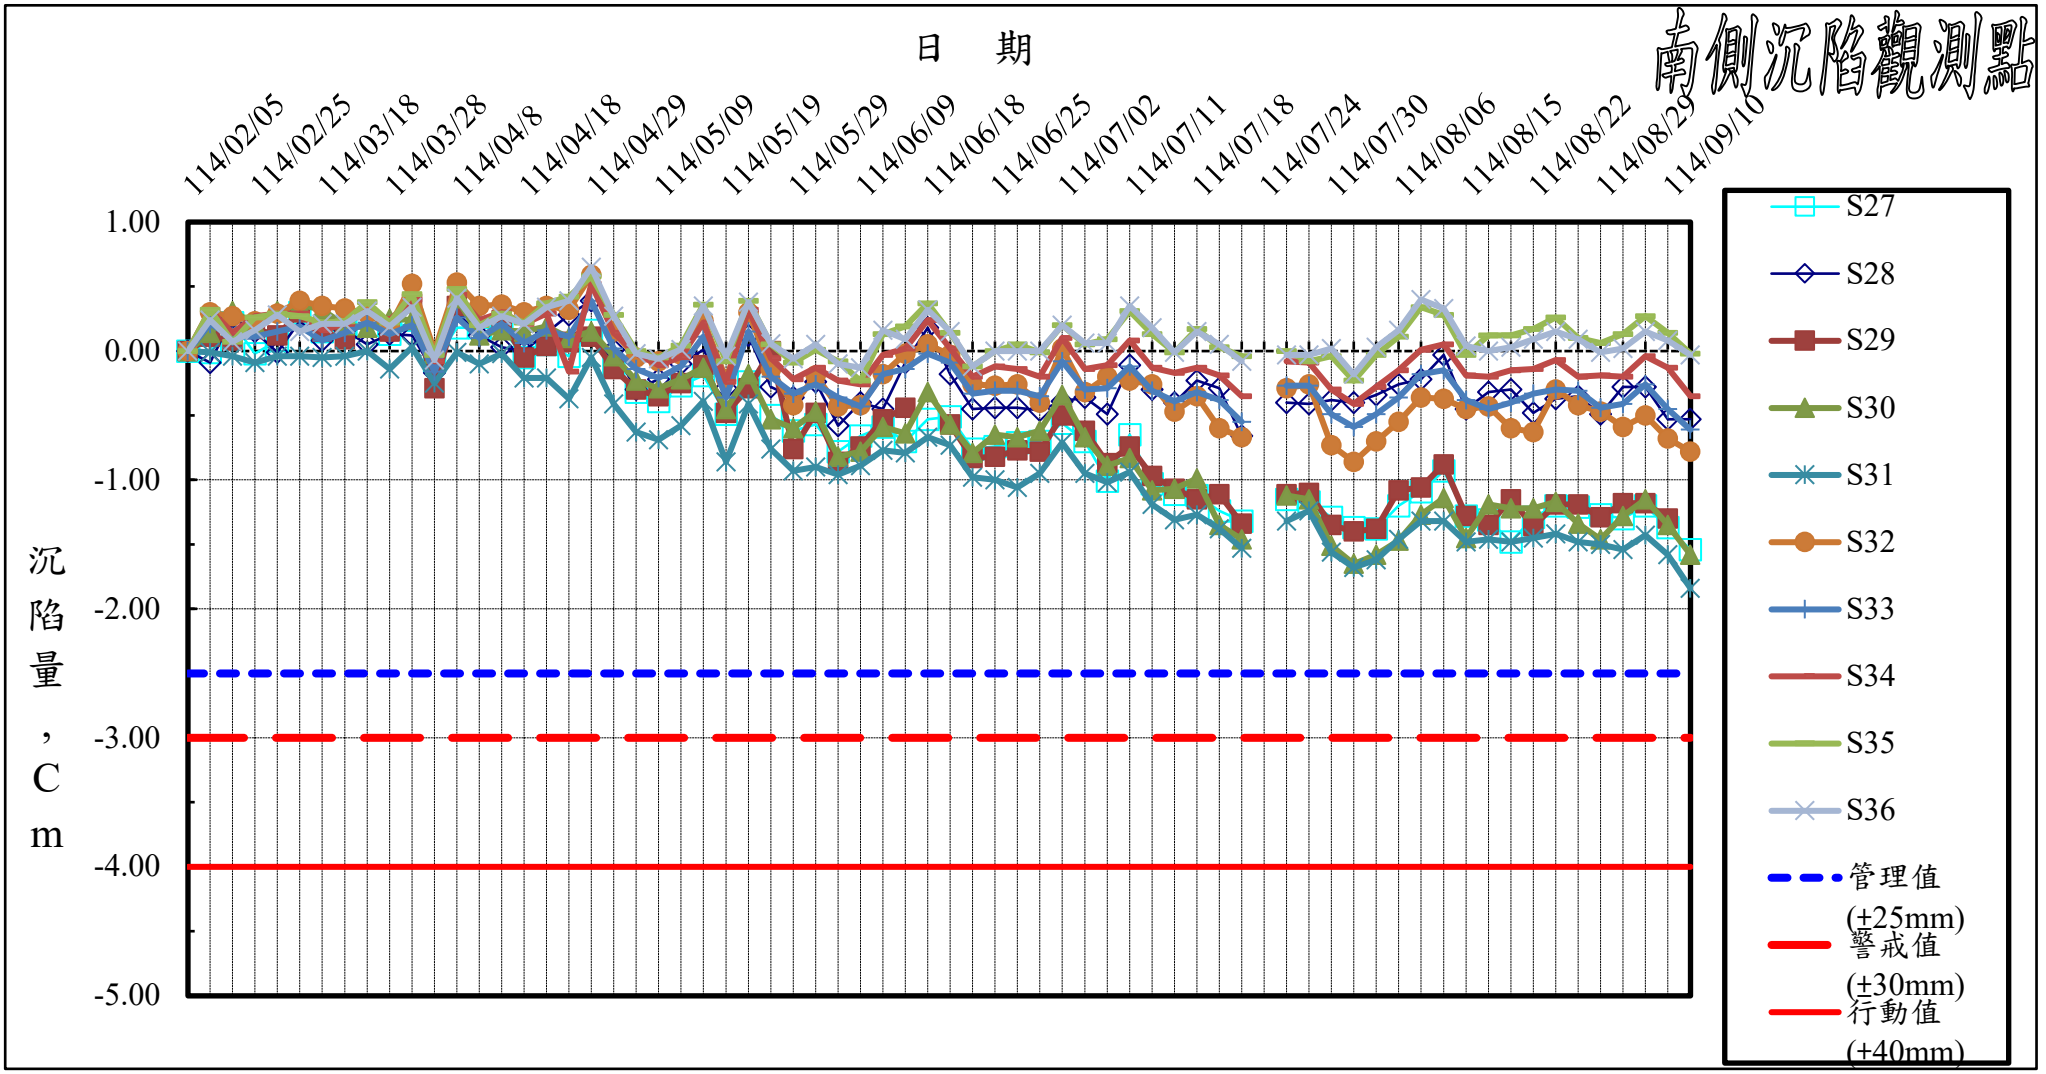


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

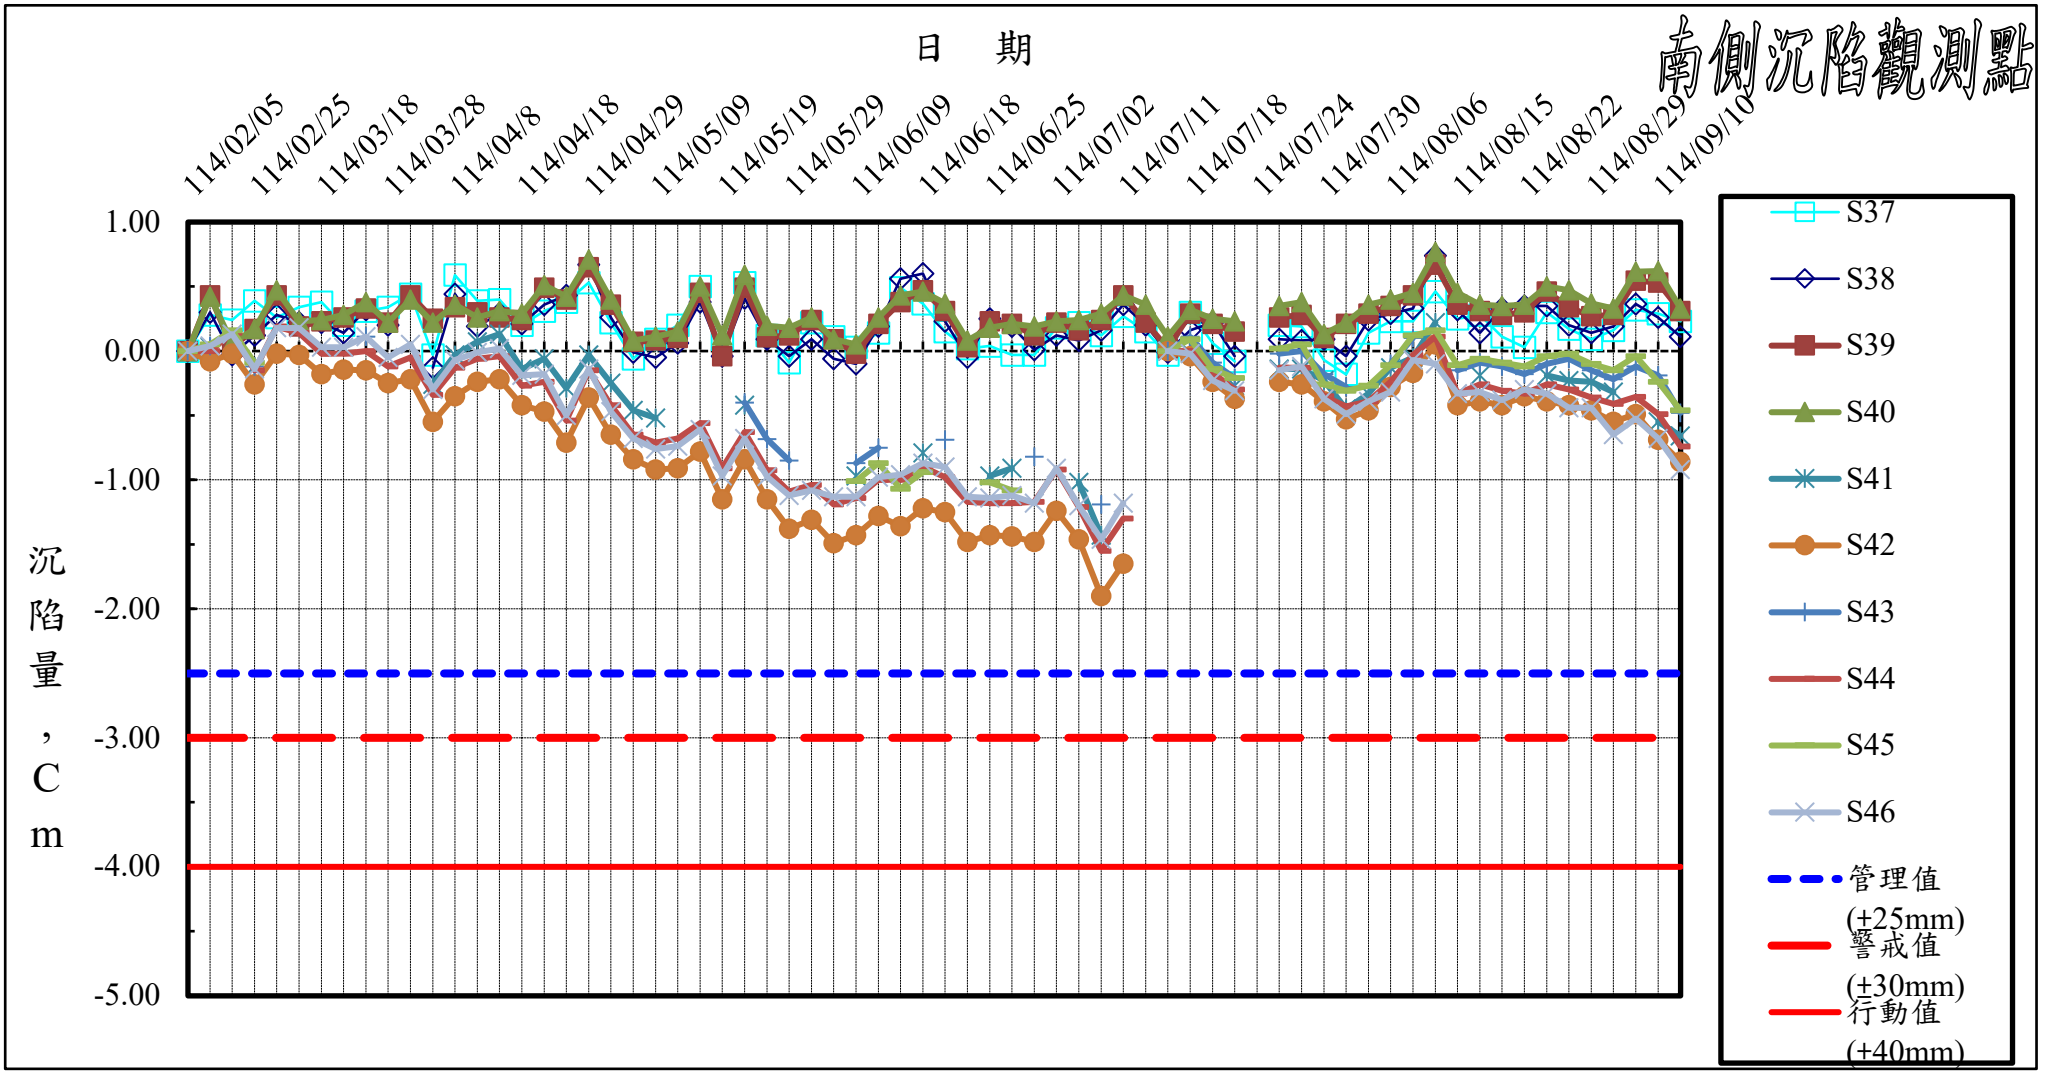

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

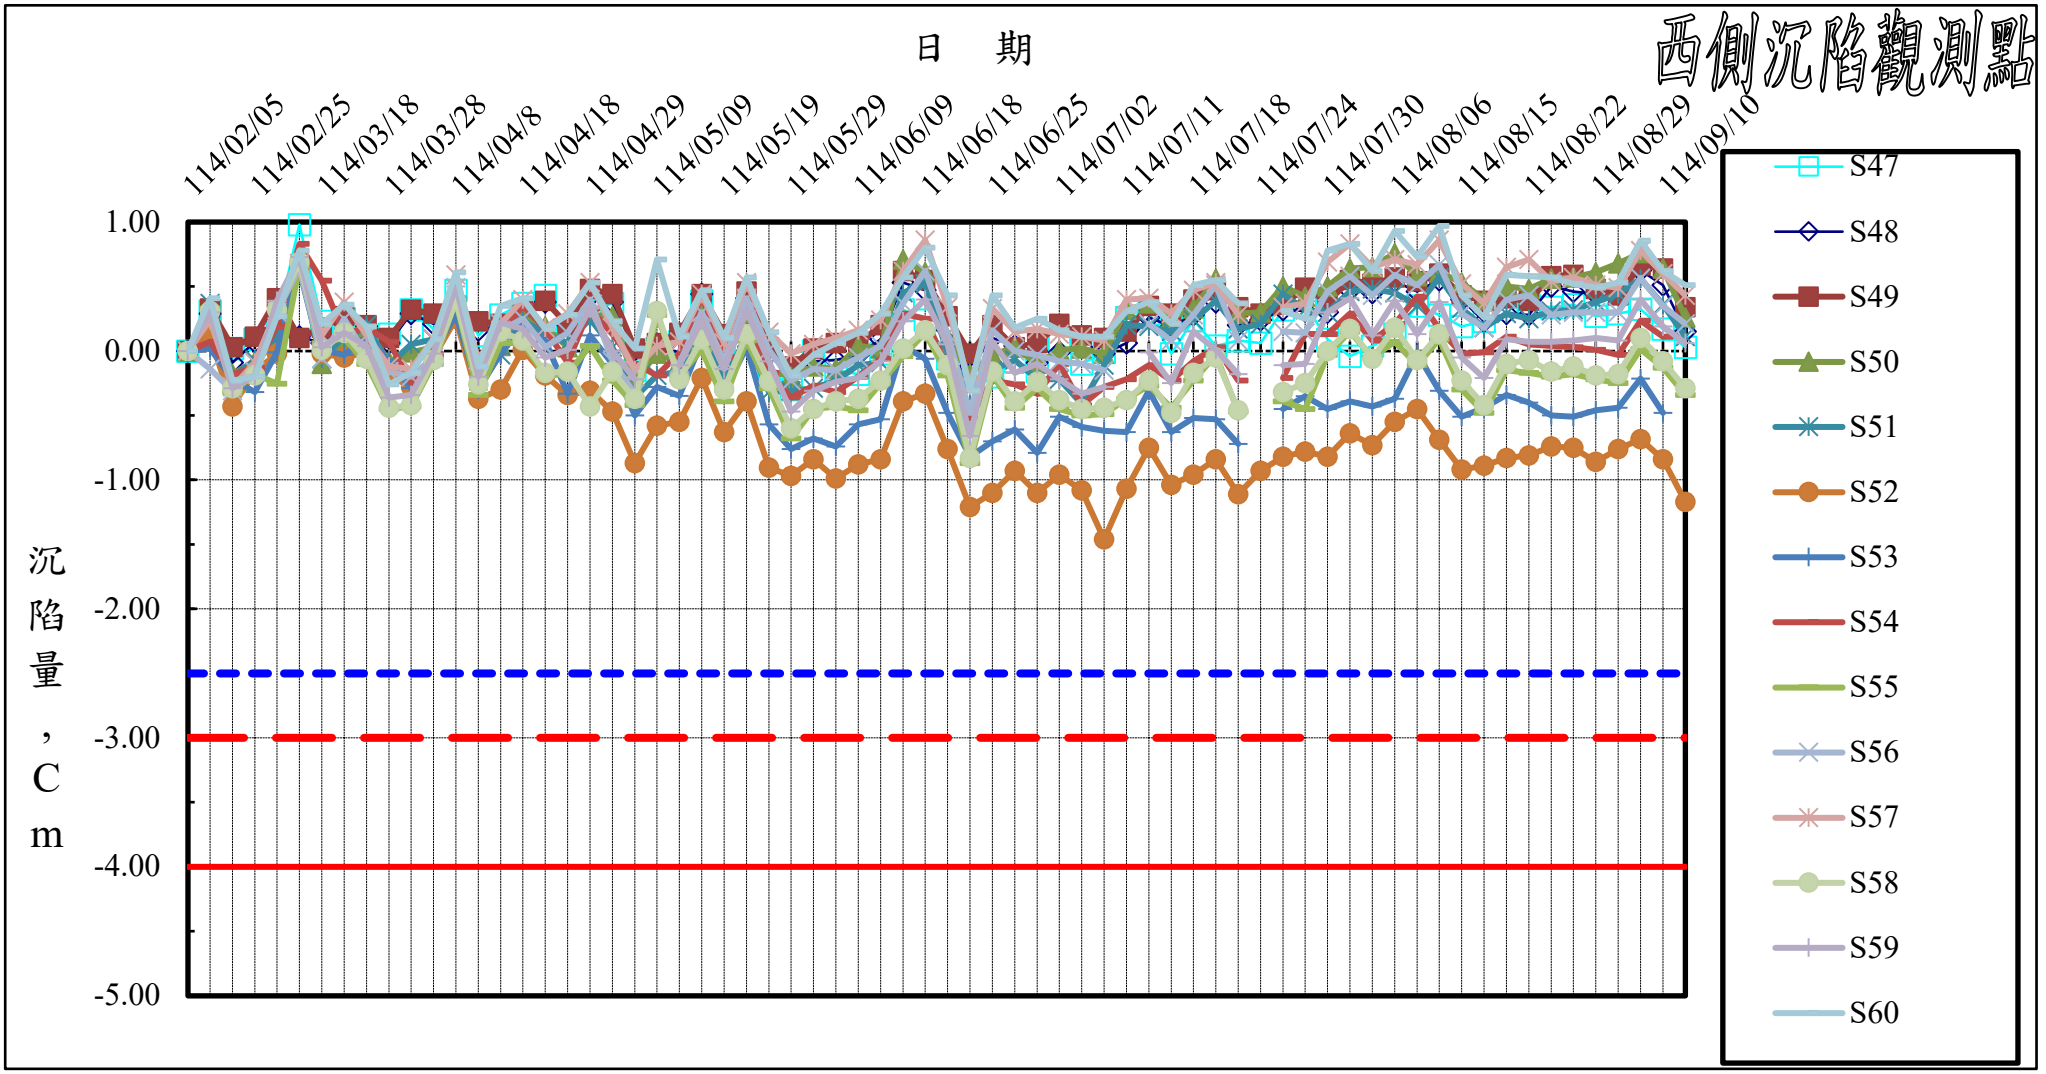

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測點歷時曲線圖

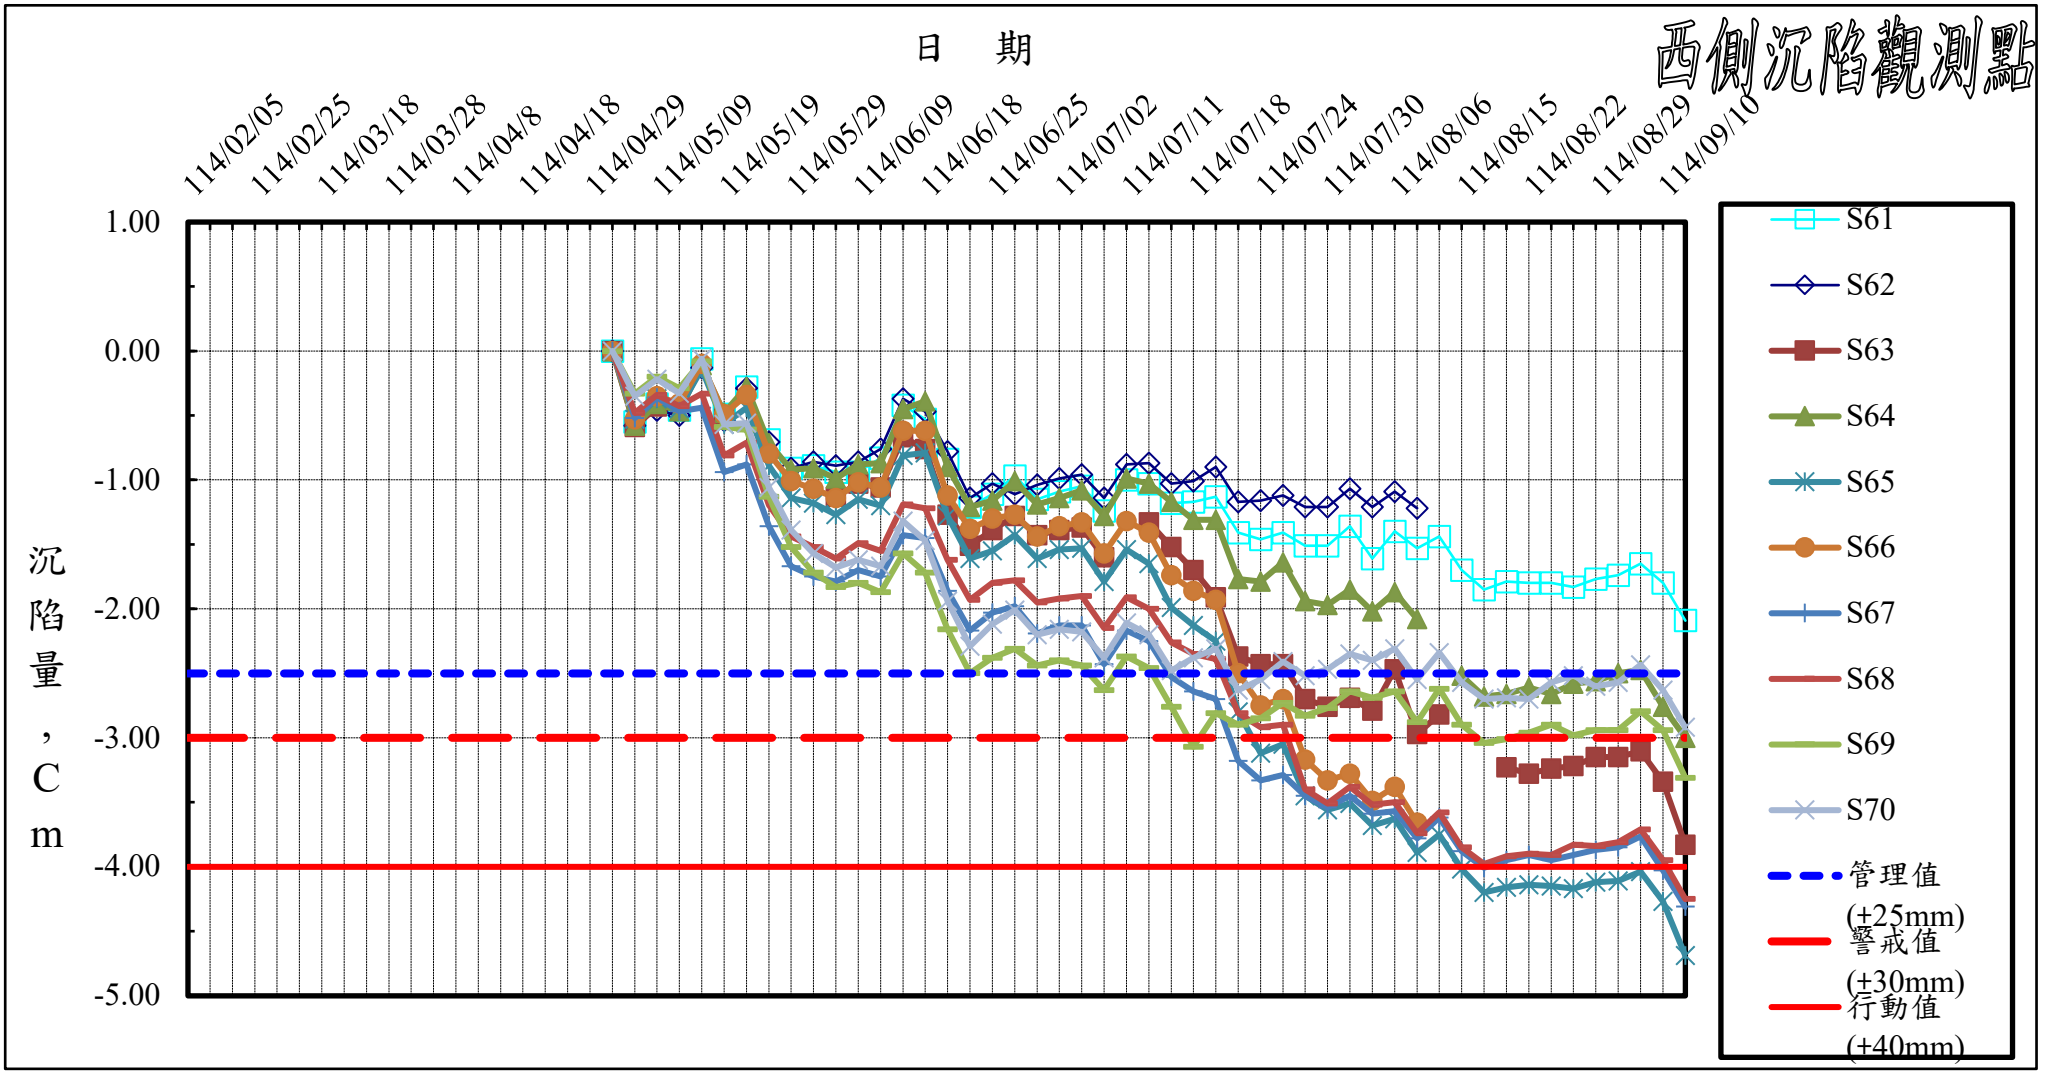


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-1建物傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 09月 17日 AM 0930~1130
觀測儀器： 建物傾斜計(TI-1)

天氣： 晴
溫度： 34 ℃
濕度： 60 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	338	-667.0	初始值		69	-65	134.0	初始值	
114/8/15	10:00	-350	300	-650.0	70.1	1/2941	52	-113	165.0	127.9	1/1613
114/8/18	10:00	-348	298	-646.0	86.6	1/2381	54	-111	165.0	127.9	1/1613
114/8/20	10:00	-304	344	-648.0	78.4	1/2632	90	-62	152.0	74.3	1/2778
114/8/22	10:00	-349	296	-645.0	90.8	1/2273	51	-112	163.0	119.6	1/1724
114/8/25	10:00	-304	348	-652.0	61.9	1/3333	93	-57	150.0	66.0	1/3125
114/8/27	10:30	-302	347	-649.0	74.3	1/2778	89	-55	144.0	41.3	1/5000
114/8/29	10:30	-300	350	-650.0	70.1	1/2941	92	-49	141.0	28.9	*註
114/9/1	10:30	-348	294	-642.0	103.1	1/2000	51	-111	162.0	115.5	1/1786
114/9/3	10:30	-346	291	-637.0	123.8	1/1667	52	-113	165.0	127.9	1/1613
114/9/10	10:30	-291	350	-641.0	107.3	1/1923	100	-53	153.0	78.4	1/2632
114/9/17	10:30	-293	354	-647.0	82.5	1/2500	101	-48	149.0	61.9	1/3333

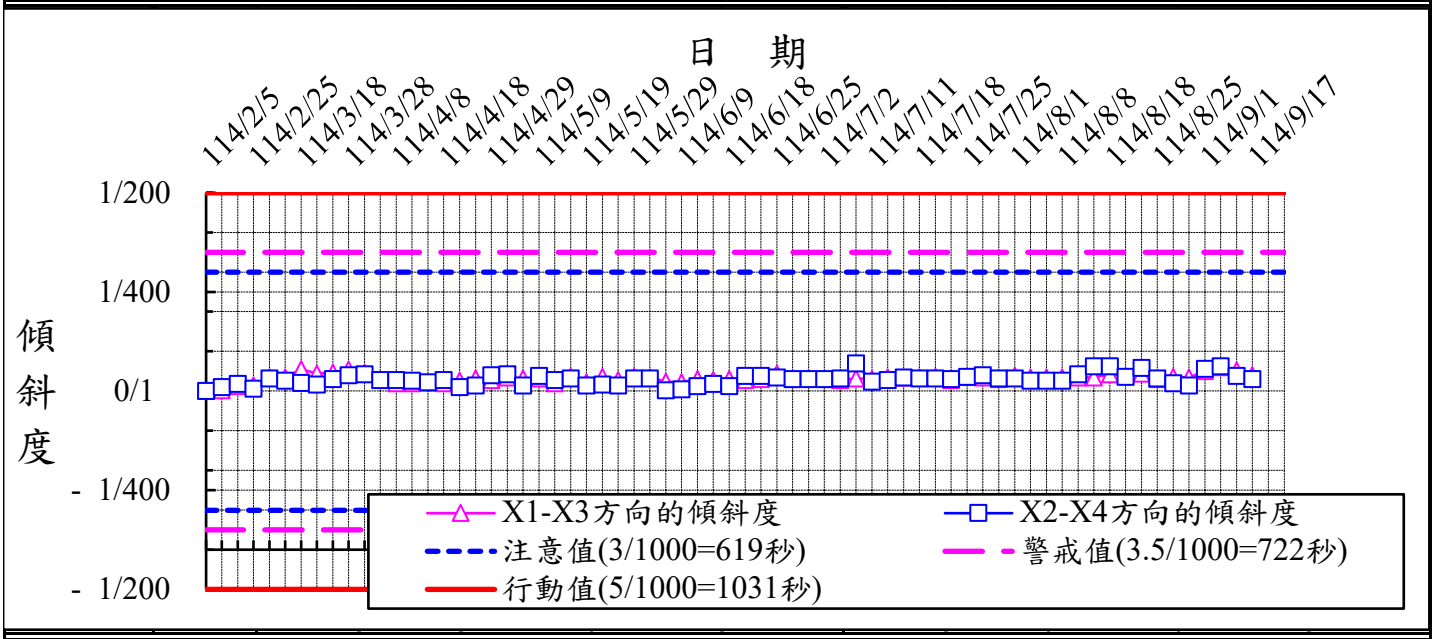

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




【結構物】
【開挖側】

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-2建物傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 09月 17日 AM 0930~1130
觀測儀器： 建物傾斜計(TI-2)

天氣： 晴
溫度： 34 ℃
濕度： 60 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	61	-52	113.0	初始值		185	-181	366.0	初始值	
114/8/15	10:00	34	-83	117.0	16.5	*註	131	-183	314.0	-214.5	1/-962
114/8/18	10:00	36	-87	123.0	41.3	*註	126	-186	312.0	-222.8	1/-926
114/8/20	10:00	76	-38	114.0	4.1	*註	175	-139	314.0	-214.5	1/-962
114/8/22	10:00	35	-87	122.0	37.1	*註	122	-186	308.0	-239.3	1/-862
114/8/25	10:00	80	-55	135.0	90.8	*註	182	-136	318.0	-198.0	1/-1042
114/8/27	10:30	80	-42	122.0	37.1	*註	178	-134	312.0	-222.8	1/-926
114/8/29	10:30	82	-35	117.0	16.5	*註	184	-133	317.0	-202.1	1/-1020
114/9/1	10:30	36	-89	125.0	49.5	*註	124	-187	311.0	-226.9	1/-909
114/9/3	10:30	34	-88	122.0	37.1	*註	123	-186	309.0	-235.1	1/-877
114/9/10	10:30	85	-27	112.0	-4.1	*註	180	-130	310.0	-231.0	1/-893
114/9/17	10:30	86	-25	111.0	-8.3	*註	187	-126	313.0	-218.6	1/-943

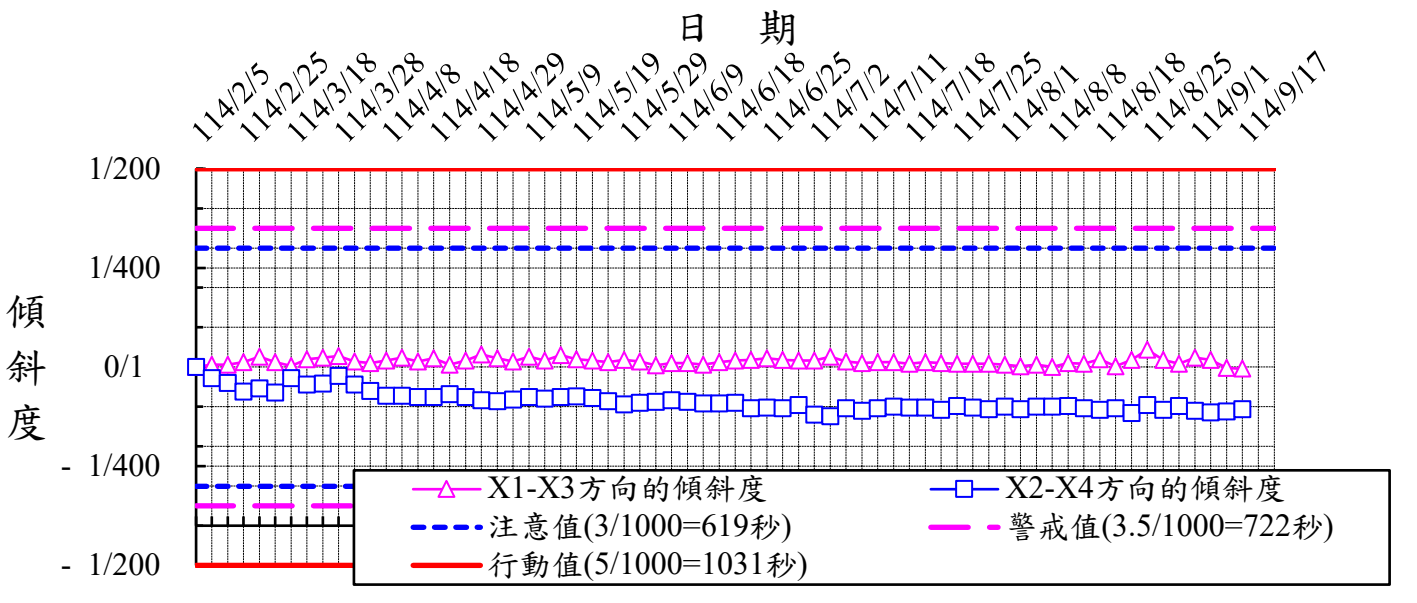

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度


註：表示量測傾斜度未超過±1/5000



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-3建物傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 34 ℃
監測日期： 114 年 09月 17日 AM 0930~1130　　濕度： 60 %
觀測儀器： 建物傾斜計(TI-3)　　測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	336	-665.0	初始值		23	-19	42.0	初始值	
114/8/15	10:00	-346	298	-644.0	86.6	1/2381	-3	-51	48.0	24.8	*註
114/8/18	10:00	-351	298	-649.0	66.0	1/3125	0	-56	56.0	57.8	1/3571
114/8/20	10:00	-305	346	-651.0	57.8	1/3571	39	-8	47.0	20.6	*註
114/8/22	10:00	-352	297	-649.0	66.0	1/3125	-1	-57	56.0	57.8	1/3571
114/8/25	10:00	-302	350	-652.0	53.6	1/3846	39	-5	44.0	8.3	*註
114/8/27	10:30	-302	349	-651.0	57.8	1/3571	39	4	35.0	-28.9	*註
114/8/29	10:30	-300	352	-652.0	53.6	1/3846	40	5	35.0	-28.9	*註
114/9/1	10:30	-354	298	-652.0	53.6	1/3846	-1	-59	58.0	66.0	1/3125
114/9/3	10:30	-355	299	-654.0	45.4	1/4545	1	-60	61.0	78.4	1/2632
114/9/10	10:30	-297	357	-654.0	45.4	1/4545	50	-5	55.0	53.6	1/3846
114/9/17	10:30	-294	356	-650.0	61.9	1/3333	49	-1	50.0	33.0	*註

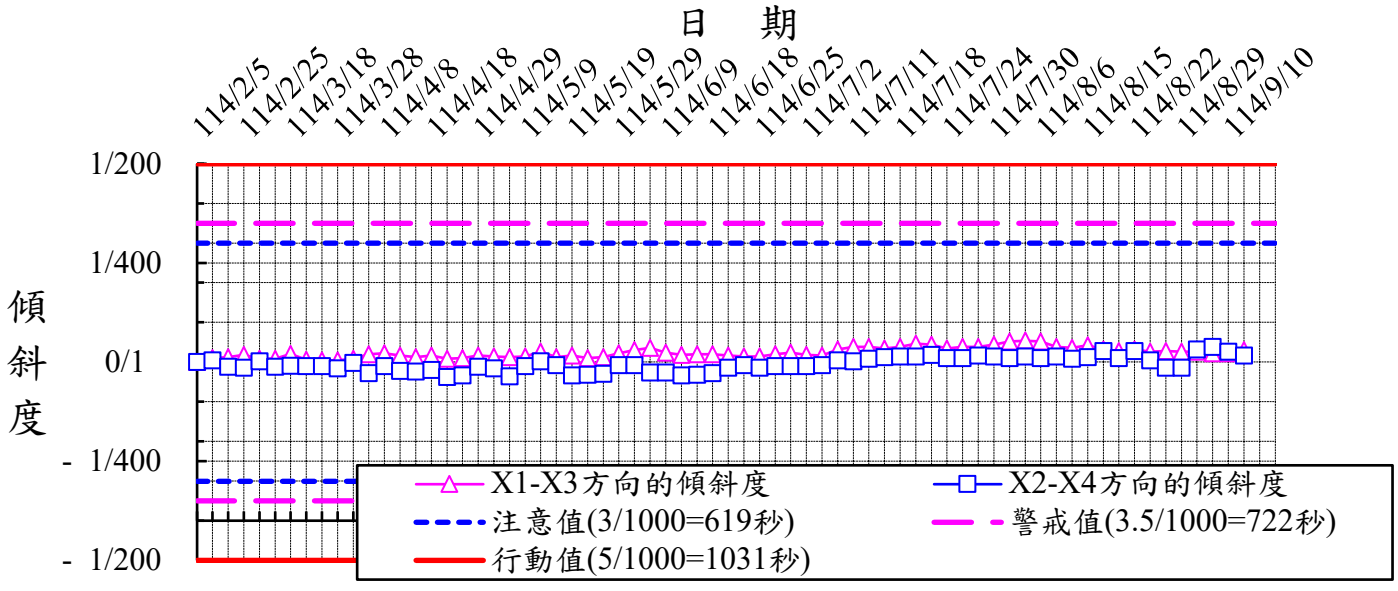

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-4建物傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 09月 17日 AM 0930~1130
觀測儀器： 建物傾斜計(TI-4)

天氣： 晴
溫度： 34 ℃
濕度： 60 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	106	-98	204.0	初始值		-41	50	-91.0	初始值	
114/8/15	10:00	85	-129	214.0	41.3	1/5000	-57	12	-69.0	90.8	1/2273
114/8/18	10:00	78	-130	208.0	16.5	*註	-61	12	-73.0	74.3	1/2778
114/8/20	10:00	130	-85	215.0	45.4	1/4545	-15	55	-70.0	86.6	1/2381
114/8/22	10:00	77	-134	211.0	28.9	*註	-63	10	-73.0	74.3	1/2778
114/8/25	10:00	130	-83	213.0	37.1	*註	-9	55	-64.0	111.4	1/1852
114/8/27	10:30	131	-83	214.0	41.3	1/5000	-9	56	-65.0	107.3	1/1923
114/8/29	10:30	133	-80	213.0	37.1	*註	-6	59	-65.0	107.3	1/1923
114/9/1	10:30	78	-133	211.0	28.9	*註	-62	4	-66.0	103.1	1/2000
114/9/3	10:30	76	-133	209.0	20.6	*註	-61	9	-70.0	86.6	1/2381
114/9/10	10:30	136	-76	212.0	33.0	*註	-2	60	-62.0	119.6	1/1724
114/9/17	10:30	138	-77	215.0	45.4	1/4545	-2	62	-64.0	111.4	1/1852

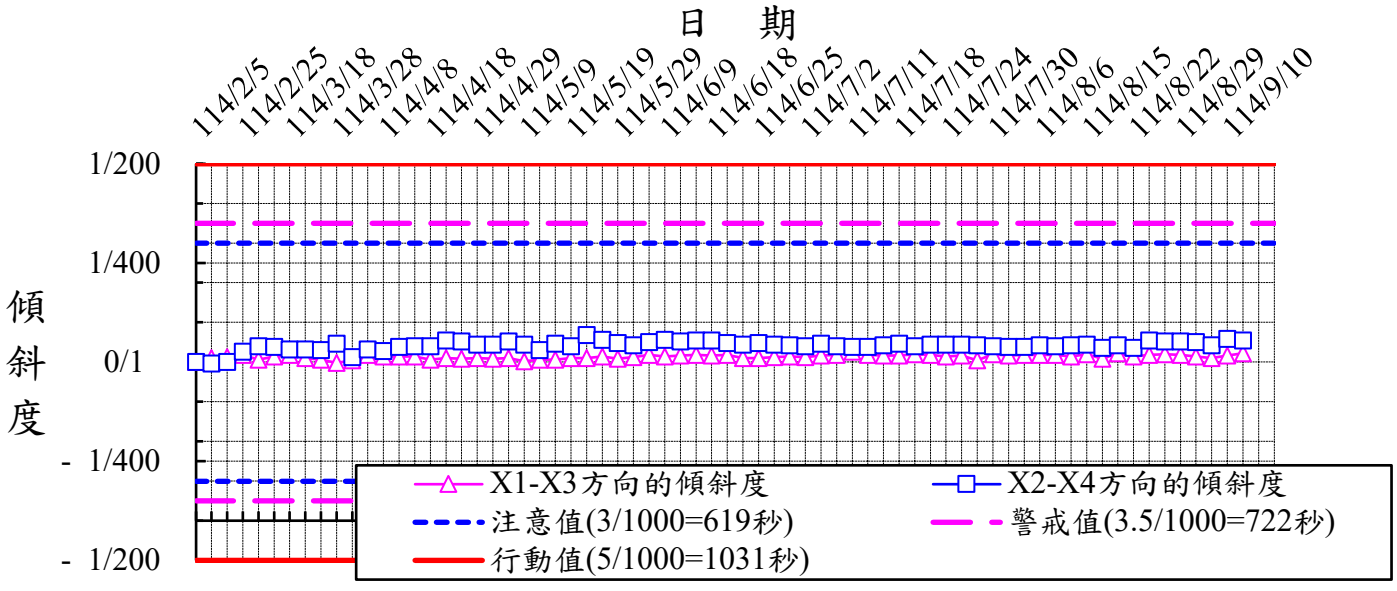

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-5建物傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 09月 17日 AM 0930~1130
觀測儀器： 建物傾斜計(TI-5)

天氣： 晴
溫度： 34 ℃
濕度： 60 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	73	-65	138.0	初始值		-47	55	-102.0	初始值	
114/8/15	10:00	29	-75	104.0	-140.3	1/-1471	-67	21	-88.0	57.8	1/3571
114/8/18	10:00	23	-76	99.0	-160.9	1/-1282	-70	18	-88.0	57.8	1/3571
114/8/20	10:00	76	-35	111.0	-111.4	1/-1852	-20	65	-85.0	70.1	1/2941
114/8/22	10:00	22	-80	102.0	-148.5	1/-1389	-72	14	-86.0	66.0	1/3125
114/8/25	10:00	74	-29	103.0	-144.4	1/-1429	-18	64	-82.0	82.5	1/2500
114/8/27	10:30	80	-32	112.0	-107.3	1/-1923	-19	67	-86.0	66.0	1/3125
114/8/29	10:30	79	-28	107.0	-127.9	1/-1613	-16	68	-84.0	74.3	1/2778
114/9/1	10:30	23	-80	103.0	-144.4	1/-1429	-72	15	-87.0	61.9	1/3333
114/9/3	10:30	23	-80	103.0	-144.4	1/-1429	-72	14	-86.0	66.0	1/3125
114/9/10	10:30	82	-23	105.0	-136.1	1/-1515	-12	71	-83.0	78.4	1/2632
114/9/17	10:30	86	-26	112.0	-107.3	1/-1923	-15	71	-86.0	66.0	1/3125

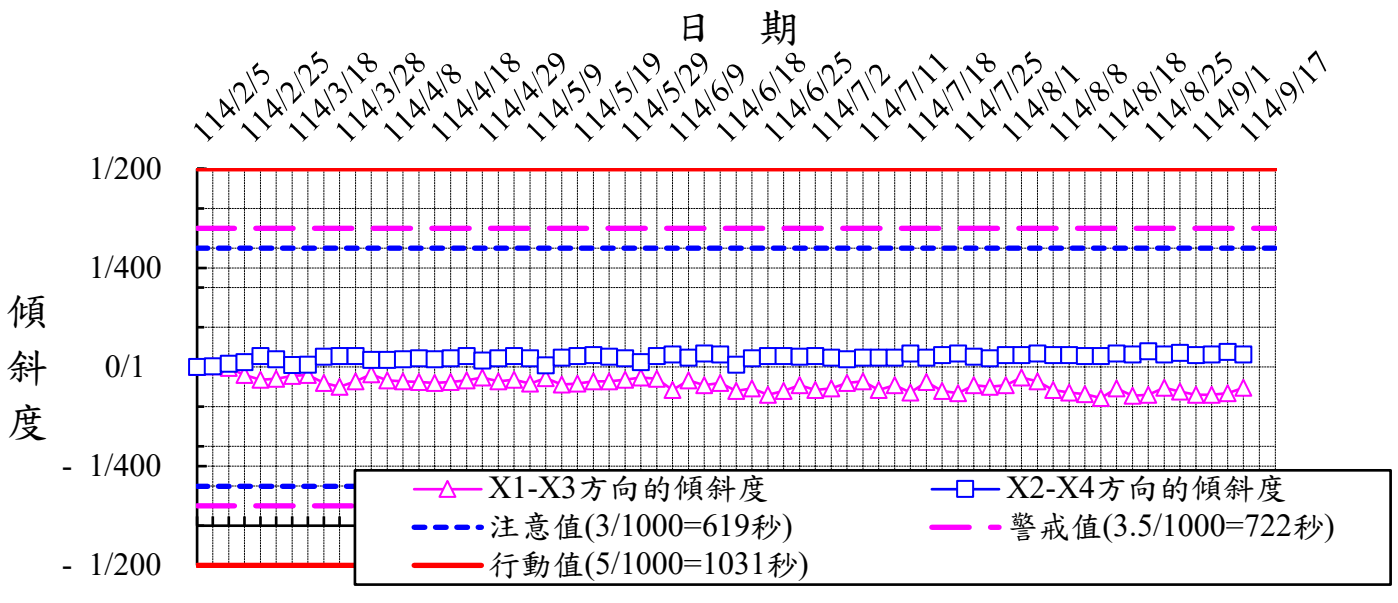

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--水位觀測計

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴


承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 34 ℃

監測日期： 114 年 09月17日 AM:0930~1130　　濕度： 60 %

觀測儀器： 水位觀測計　　儀器型式及編號： RST Model 3001

參考水準點編號： GL:1.0000m


編號		OW1	OW2	OW3	OW4	OW5	備註
埋設日期		114/1/21	114/1/20	114/1/22	114/1/21	114/1/20	水位觀測計高程以
埋設深度，m		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	GL:1.0000m
觀測計管口高程，m		0.4310	0.3804	0.2334	0.2640	0.6687	為基準
日期	時間	地下水位面深度，GL-m					
114/2/5	15:10	-1.92	-1.90	-1.51	-2.02	-1.93	初值
114/8/8	10:10	-3.45	-4.49	-6.00	阻擋	-3.16	第二階段開挖完成
114/8/11	10:10	-3.32	-4.29	-5.83	阻擋	-3.45	第二階段開挖完成
114/8/15	10:10	-2.85	-3.69	-4.99	阻擋	-2.31	第二階段開挖完成
114/8/18	10:10	-2.77	-3.62	-4.88	阻擋	-2.43	第二階段開挖完成
114/8/20	10:10	阻擋	-3.79	-5.01	阻擋	-2.31	第二階段開挖完成
114/8/22	10:10	-3.07	-3.72	-4.90	阻擋	-2.93	第二階段開挖完成
114/8/25	10:10	-3.31	-4.25	-5.94	阻擋	-3.06	第二階段開挖完成
114/8/27	10:10	-3.02	-3.93	-5.31	阻擋	損壞	第二階段開挖完成
114/8/29	10:10	-3.04	-3.99	-5.34	阻擋	損壞	大底構築中
114/9/1	10:10	-3.23	阻擋	-5.51	阻擋	損壞	大底構築中
114/9/3	10:10	-3.21	阻擋	-5.57	阻擋	-1.89	大底構築中
114/9/10	10:10	阻擋	阻擋	-5.29	阻擋	阻擋	大底構築中
114/9/17	10:10	阻擋	阻擋	-5.06	阻擋	阻擋	大底構築中

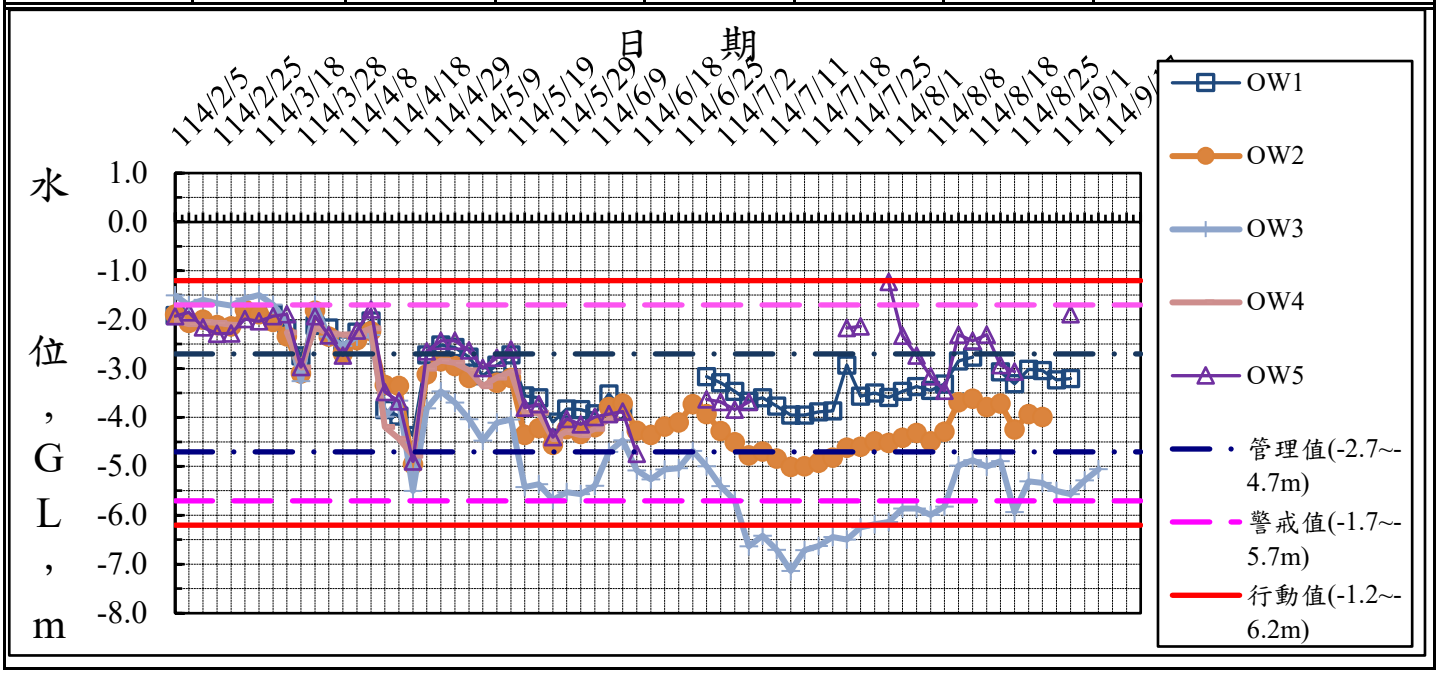

SIS-1 土中傾度管量測記錄

量測日期 深度(m)	114/08/24	114/08/25	114/08/26	114/08/27	114/08/28	114/08/29	114/08/30	114/08/31	114/09/01	114/09/02	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	156.48	155.26	154.04	156.09	154.04	156.09	156.09	155.94	155.78	155.67	155.98	160.33	164.06
-1.0	140.79	139.42	138.05	140.03	138.05	140.03	140.03	139.92	139.82	139.87	140.08	142.50	144.86
-1.5	124.29	123.10	121.92	123.54	121.92	123.54	123.54	123.44	123.34	123.30	123.50	125.12	127.57
-2.0	105.48	105.03	104.58	105.31	104.58	105.31	105.31	105.23	105.16	104.68	104.83	105.78	108.20
-2.5	83.26	82.90	82.54	83.18	82.54	83.18	83.18	83.11	83.04	82.45	82.59	83.56	86.29
-3.0	79.56	79.21	78.86	79.50	78.86	79.50	79.50	79.44	79.38	78.86	78.98	79.71	82.33
-3.5	74.10	73.76	73.42	74.05	73.42	74.05	74.05	73.99	73.92	73.39	73.52	74.09	76.69
-4.0	68.72	68.45	68.18	68.72	68.18	68.72	68.72	68.67	68.61	68.01	68.12	68.51	71.08
-4.5	61.08	60.87	60.67	61.15	60.67	61.15	61.15	61.09	61.03	60.40	60.52	60.89	63.31
-5.0	51.49	51.32	51.14	51.58	51.14	51.58	51.58	51.52	51.47	50.88	50.99	51.35	53.63
-5.5	42.64	42.53	42.43	42.74	42.43	42.74	42.74	42.70	42.67	42.16	42.23	42.66	44.74
-6.0	34.39	34.30	34.21	34.50	34.21	34.50	34.50	34.46	34.43	33.99	34.06	34.59	36.47
-6.5	27.34	27.26	27.18	27.43	27.18	27.43	27.43	27.40	27.38	26.97	27.02	27.62	29.35
-7.0	21.03	20.98	20.92	21.11	20.92	21.11	21.11	21.09	21.07	20.68	20.72	21.35	23.00
-7.5	16.39	16.31	16.24	16.40	16.24	16.40	16.40	16.39	16.39	16.05	16.06	16.69	18.23
-8.0	13.00	12.88	12.76	12.95	12.76	12.95	12.95	12.93	12.92	12.60	12.63	13.25	14.68
-8.5	10.27	10.14	10.01	10.18	10.01	10.18	10.18	10.18	10.17	9.91	9.92	10.46	11.77
-9.0	8.72	8.61	8.51	8.61	8.51	8.61	8.61	8.61	8.60	8.28	8.29	8.77	10.05
-9.5	6.98	6.92	6.87	6.89	6.87	6.89	6.89	6.92	6.94	6.66	6.61	7.06	8.25
-10.0	6.60	6.50	6.39	6.45	6.39	6.45	6.45	6.47	6.50	6.28	6.23	6.59	7.70
-10.5	5.87	5.74	5.62	5.68	5.62	5.68	5.68	5.71	5.73	5.56	5.51	5.85	6.83
-11.0	5.46	5.32	5.18	5.27	5.18	5.27	5.27	5.27	5.28	5.09	5.08	5.41	6.36
-11.5	4.80	4.85	4.90	5.02	4.90	5.02	5.02	4.98	4.94	4.86	4.94	5.25	6.03
-12.0	5.20	5.20	5.20	5.36	5.20	5.36	5.36	5.32	5.28	5.16	5.24	5.53	6.27
-12.5	4.51	4.52	4.54	4.68	4.54	4.68	4.68	4.64	4.60	4.45	4.53	4.81	5.52
-13.0	4.03	4.05	4.07	4.20	4.07	4.20	4.20	4.17	4.14	3.97	4.03	4.29	4.97
-13.5	4.11	4.13	4.14	4.28	4.14	4.28	4.28	4.24	4.21	4.04	4.11	4.34	4.98
-14.0	3.93	3.94	3.94	4.09	3.94	4.09	4.09	4.05	4.02	3.91	3.98	4.13	4.67
-14.5	3.41	3.45	3.48	3.59	3.48	3.59	3.59	3.56	3.53	3.49	3.55	3.61	4.09
-15.0	2.77	2.76	2.75	2.89	2.75	2.89	2.89	2.86	2.83	2.81	2.87	2.87	3.30
-15.5	2.32	2.33	2.34	2.47	2.34	2.47	2.47	2.44	2.40	2.40	2.47	2.39	2.80
-16.0	1.85	1.80	1.74	1.94	1.74	1.94	1.94	1.90	1.87	1.87	1.94	1.83	2.18
-16.5	1.00	0.88	0.76	1.03	0.76	1.03	1.03	0.99	0.96	0.96	1.03	0.85	1.19
-17.0	0.38	0.35	0.32	0.43	0.32	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.34	0.51


SIS-1 土中傾度管變位量歷時曲線圖

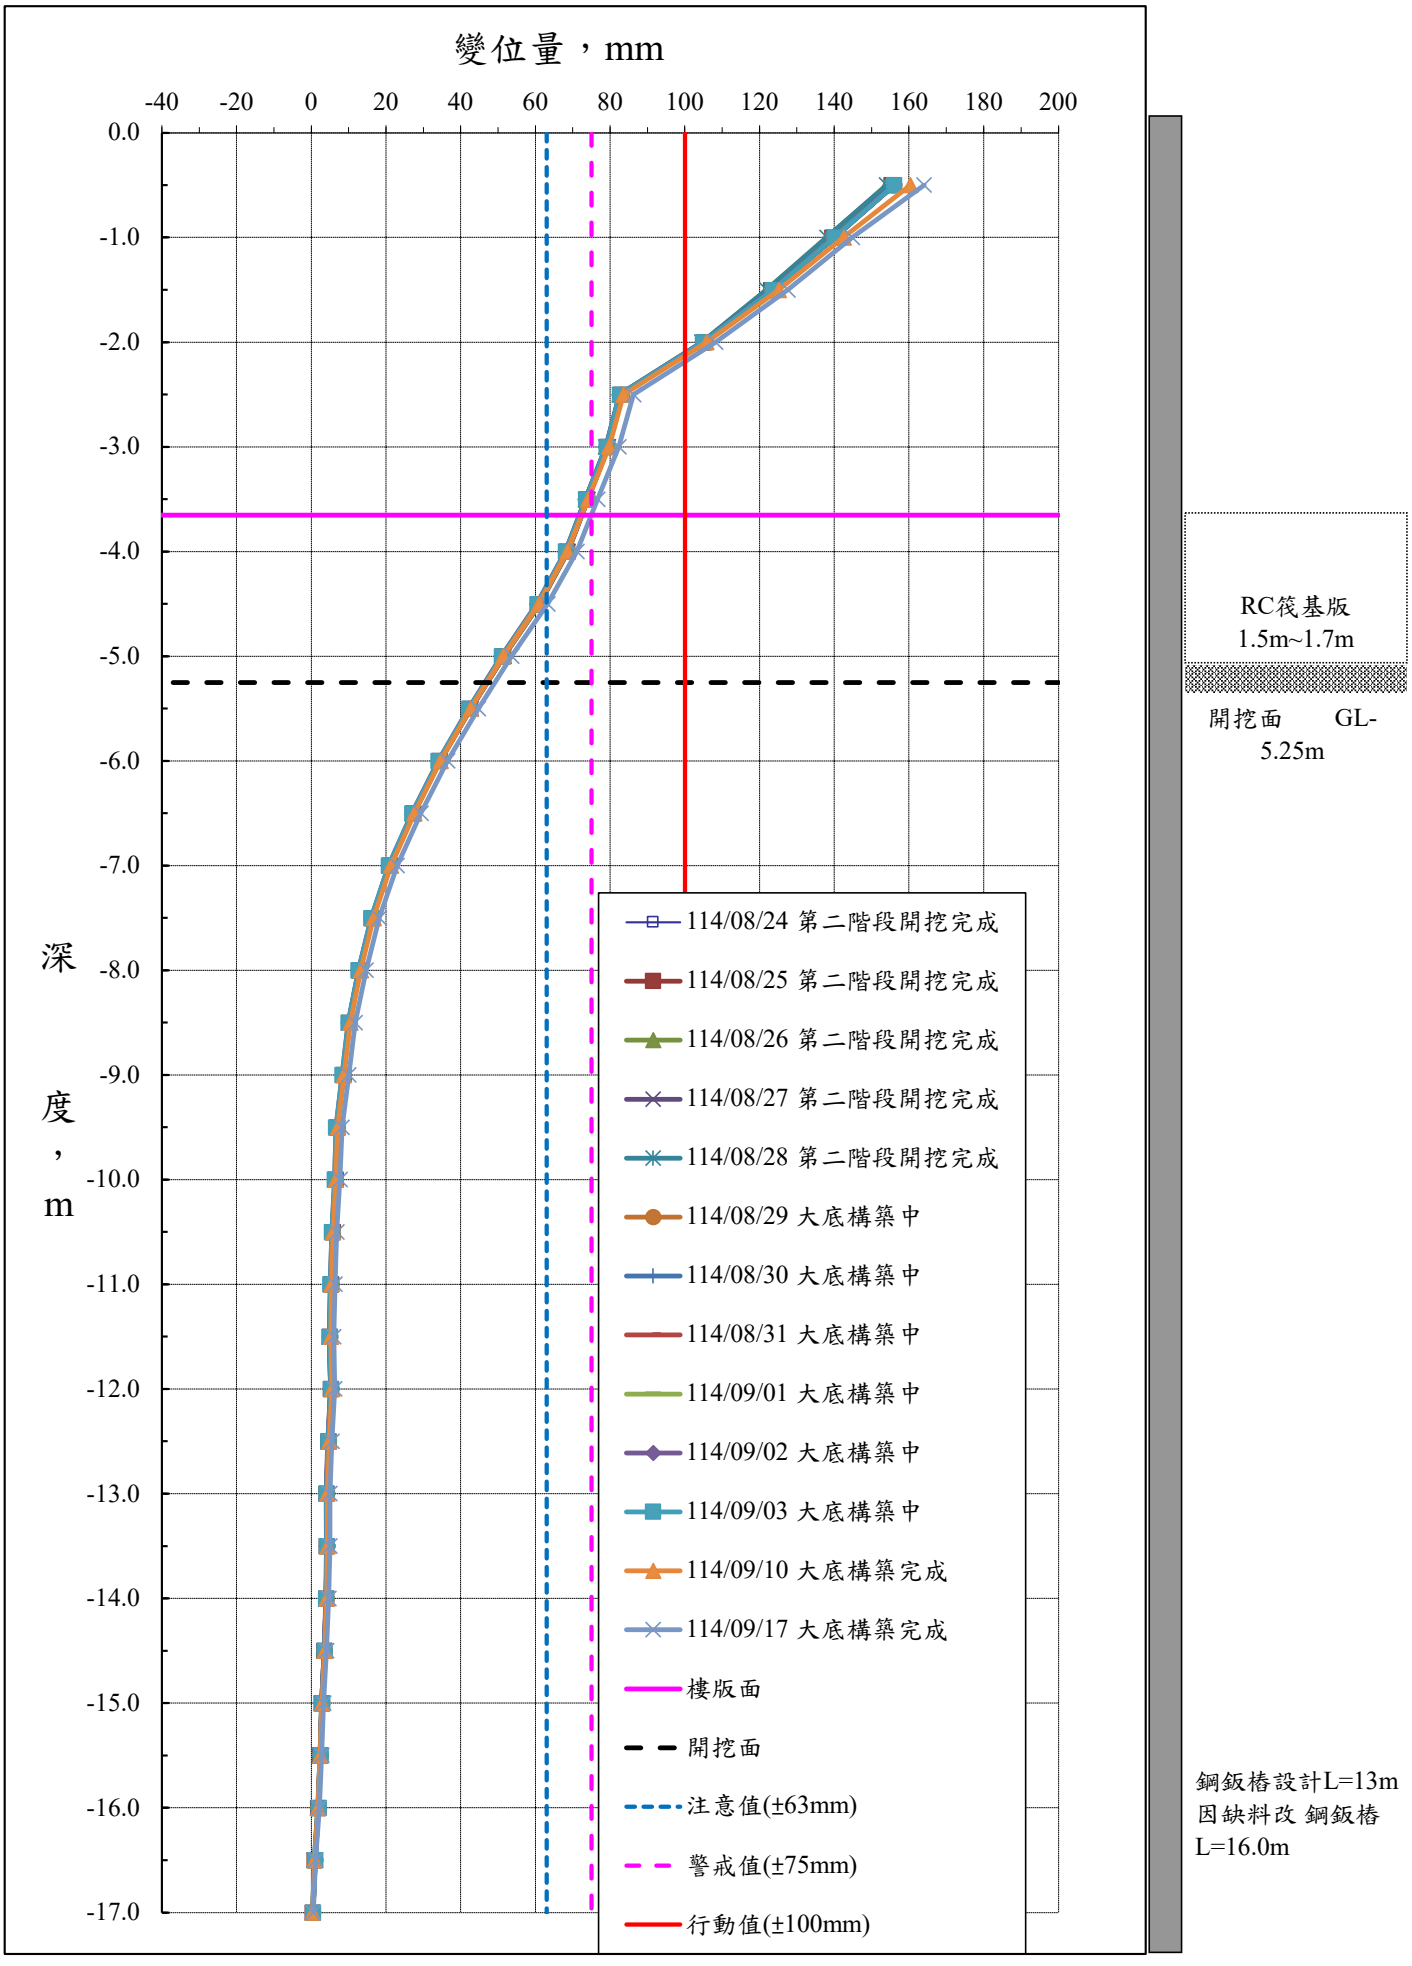

SIS-2 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/24	114/08/25	114/08/26	114/08/27	114/08/28	114/08/29	114/08/30	114/08/31	114/09/01	114/09/02	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	149.39	148.76	148.13	150.20	150.00	148.96	149.45	149.91	149.83	149.74	149.49	151.82	153.50
-1.0	136.77	136.11	135.45	137.62	137.19	136.54	136.86	137.22	137.24	137.13	136.93	138.95	140.62
-1.5	123.77	123.18	122.59	124.52	124.14	123.56	123.80	124.15	124.16	124.05	123.84	125.18	126.72
-2.0	111.49	110.94	110.39	112.12	111.79	111.27	111.50	111.80	111.81	111.70	111.50	112.26	113.62
-2.5	99.16	98.66	98.16	99.75	99.45	98.96	99.20	99.46	99.48	99.37	99.17	99.61	100.85
-3.0	89.17	88.68	88.19	89.70	89.46	88.92	89.17	89.45	89.44	89.31	89.04	89.40	90.54
-3.5	80.81	80.34	79.87	81.33	81.13	80.54	80.80	81.10	81.07	80.92	80.59	80.93	81.99
-4.0	72.20	71.73	71.26	72.68	72.49	71.92	72.17	72.46	72.43	72.27	71.93	72.27	73.20
-4.5	63.02	62.54	62.06	63.44	63.28	62.70	62.94	63.24	63.19	63.05	62.73	63.05	63.84
-5.0	53.13	52.63	52.13	53.47	53.33	52.77	52.97	53.28	53.22	53.10	52.79	53.13	53.80
-5.5	45.41	44.91	44.41	45.67	45.49	45.09	45.16	45.45	45.42	45.30	45.02	45.36	45.94
-6.0	37.65	37.17	36.69	37.90	37.73	37.34	37.35	37.68	37.63	37.53	37.28	37.64	38.22
-6.5	29.26	28.77	28.28	29.48	29.32	28.93	28.92	29.26	29.20	29.13	28.93	29.32	29.78
-7.0	23.99	23.47	22.95	24.18	23.98	23.67	23.66	23.95	23.92	23.84	23.64	24.04	24.48
-7.5	20.66	20.07	19.48	20.76	20.54	20.29	20.19	20.51	20.48	20.42	20.27	20.64	21.09
-8.0	17.06	16.55	16.04	17.22	17.03	16.74	16.76	17.01	16.99	16.94	16.81	17.21	17.56
-8.5	13.61	13.07	12.53	13.74	13.56	13.25	13.26	13.53	13.50	13.46	13.36	13.73	14.03
-9.0	11.47	10.94	10.41	11.56	11.42	11.08	11.10	11.38	11.33	11.30	11.18	11.53	11.78
-9.5	10.10	9.52	8.94	10.16	10.00	9.68	9.65	9.95	9.91	9.87	9.75	10.08	10.31
-10.0	9.48	8.91	8.34	9.53	9.39	9.05	8.98	9.32	9.26	9.22	9.09	9.43	9.62
-10.5	6.42	5.97	5.52	6.48	6.44	6.01	6.09	6.36	6.29	6.27	6.16	6.45	6.49
-11.0	4.64	4.18	3.72	4.63	4.61	4.20	4.29	4.54	4.46	4.44	4.32	4.57	4.59
-11.5	5.18	4.62	4.06	5.12	5.10	4.64	4.69	5.00	4.91	4.88	4.73	4.96	5.02
-12.0	5.25	4.61	3.97	5.13	5.12	4.62	4.66	5.01	4.90	4.86	4.69	4.84	5.00
-12.5	4.95	4.28	3.61	4.83	4.82	4.29	4.31	4.70	4.57	4.55	4.37	4.47	4.65
-13.0	4.09	3.41	2.73	3.96	3.97	3.40	3.45	3.84	3.71	3.68	3.50	3.59	3.70
-13.5	2.56	1.93	1.30	2.44	2.48	1.89	1.98	2.35	2.21	2.19	2.02	2.10	2.14
-14.0	1.23	1.24	1.25	1.27	1.24	1.27	1.30	1.26	1.29	1.30	1.35	1.35	1.37
-14.5	0.80	0.80	0.80	0.82	0.81	0.81	0.85	0.82	0.84	0.84	0.86	0.87	0.90
-15.0	0.49	0.48	0.47	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.52	0.51	0.53


SIS-2 土中傾度管變位量歷時曲線圖

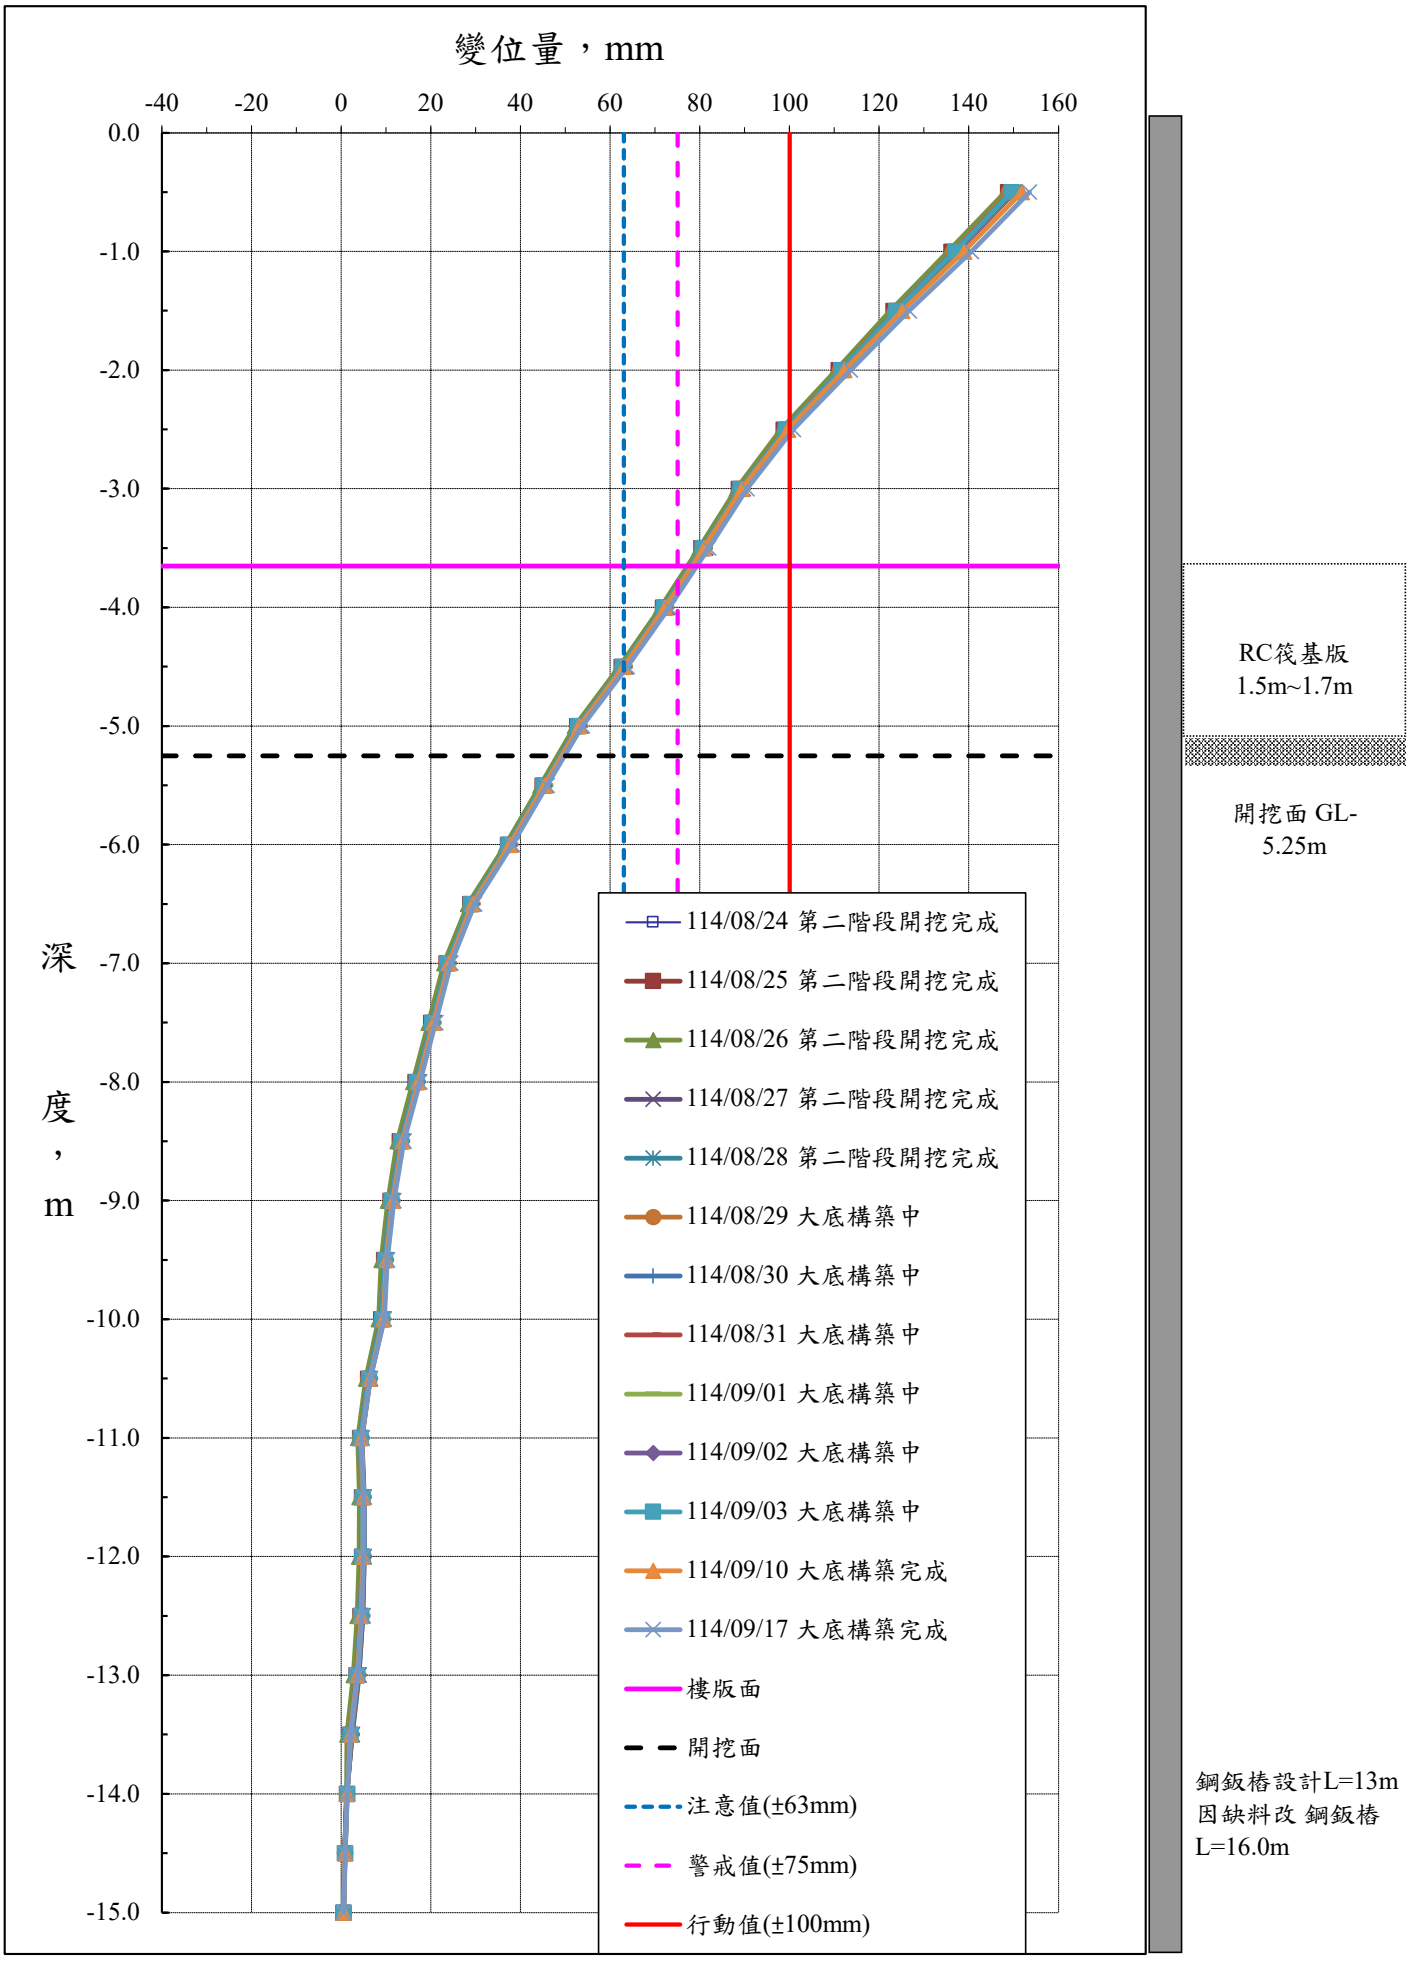

SIS-3 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/24	114/08/25	114/08/26	114/08/27	114/08/28	114/08/29	114/08/30	114/08/31	114/09/01	114/09/02	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	64.11	64.32	64.53	64.75	63.93	65.14	65.60	64.66	64.18	65.46	67.54	70.63	72.16
-1.0	61.59	61.82	62.05	62.27	61.46	62.63	62.96	62.05	61.46	62.59	64.25	66.99	68.39
-1.5	59.46	59.63	59.80	59.98	59.23	60.38	60.68	59.66	58.94	59.93	61.20	63.41	64.82
-2.0	57.52	57.74	57.96	58.18	57.54	58.38	58.68	57.61	56.84	57.62	58.41	60.21	61.50
-2.5	54.81	55.08	55.35	55.63	55.04	55.67	55.94	54.88	54.08	54.71	55.16	56.75	57.96
-3.0	49.83	50.11	50.39	50.66	50.13	50.64	50.88	49.81	48.98	49.53	49.80	51.34	52.44
-3.5	45.92	46.21	46.50	46.80	46.31	46.70	46.90	45.85	45.00	45.53	45.74	47.21	48.24
-4.0	41.45	41.73	42.01	42.29	41.85	42.17	42.40	41.38	40.58	41.07	41.24	42.57	43.50
-4.5	38.20	38.50	38.80	39.09	38.69	38.90	39.15	38.22	37.53	37.94	38.06	39.25	40.00
-5.0	33.22	33.50	33.78	34.07	33.64	33.93	34.11	33.35	32.76	33.10	33.19	34.22	34.82
-5.5	27.53	27.81	28.09	28.36	27.94	28.23	28.39	27.76	27.29	27.56	27.64	28.48	28.97
-6.0	23.44	23.68	23.92	24.15	23.77	24.06	24.17	23.68	23.29	23.55	23.68	24.24	24.78
-6.5	20.97	21.19	21.41	21.63	21.28	21.54	21.64	21.23	20.91	21.14	21.28	21.73	22.20
-7.0	19.09	19.28	19.47	19.66	19.32	19.62	19.68	19.37	19.12	19.30	19.41	19.81	20.21
-7.5	17.31	17.51	17.71	17.90	17.63	17.78	17.86	17.59	17.40	17.56	17.68	17.99	18.36
-8.0	14.38	14.59	14.80	15.00	14.72	14.87	15.01	14.72	14.57	14.71	14.83	15.09	15.36
-8.5	11.20	11.39	11.58	11.77	11.50	11.66	11.77	11.52	11.37	11.50	11.62	11.82	12.07
-9.0	11.00	11.14	11.28	11.41	11.14	11.41	11.49	11.27	11.13	11.26	11.37	11.51	11.75
-9.5	12.73	12.87	13.01	13.16	12.92	13.11	13.18	12.98	12.84	12.96	13.05	13.17	13.42
-10.0	14.18	14.26	14.34	14.41	14.22	14.45	14.56	14.36	14.26	14.36	14.45	14.54	14.78
-10.5	12.14	12.28	12.42	12.57	12.43	12.42	12.56	12.35	12.27	12.34	12.41	12.55	12.74
-11.0	9.61	9.73	9.85	9.97	9.82	9.88	9.98	9.81	9.74	9.80	9.86	9.98	10.14
-11.5	8.29	8.42	8.55	8.68	8.57	8.53	8.63	8.47	8.41	8.47	8.52	8.65	8.75
-12.0	7.12	7.23	7.34	7.44	7.34	7.33	7.40	7.27	7.20	7.26	7.32	7.42	7.50
-12.5	5.95	6.04	6.13	6.22	6.12	6.14	6.22	6.09	6.04	6.09	6.13	6.20	6.28
-13.0	5.00	5.04	5.08	5.12	4.99	5.17	5.14	5.12	5.07	5.10	5.12	5.17	5.24
-13.5	4.21	4.22	4.23	4.24	4.13	4.33	4.25	4.30	4.26	4.28	4.27	4.31	4.39
-14.0	3.11	3.12	3.13	3.13	3.06	3.19	3.14	3.17	3.15	3.16	3.16	3.19	3.25
-14.5	2.37	2.37	2.37	2.36	2.31	2.42	2.39	2.42	2.41	2.41	2.40	2.42	2.47
-15.0	1.31	1.31	1.31	1.32	1.29	1.34	1.31	1.34	1.33	1.33	1.33	1.34	1.35


SIS-3 土中傾度管變位量歷時曲線圖

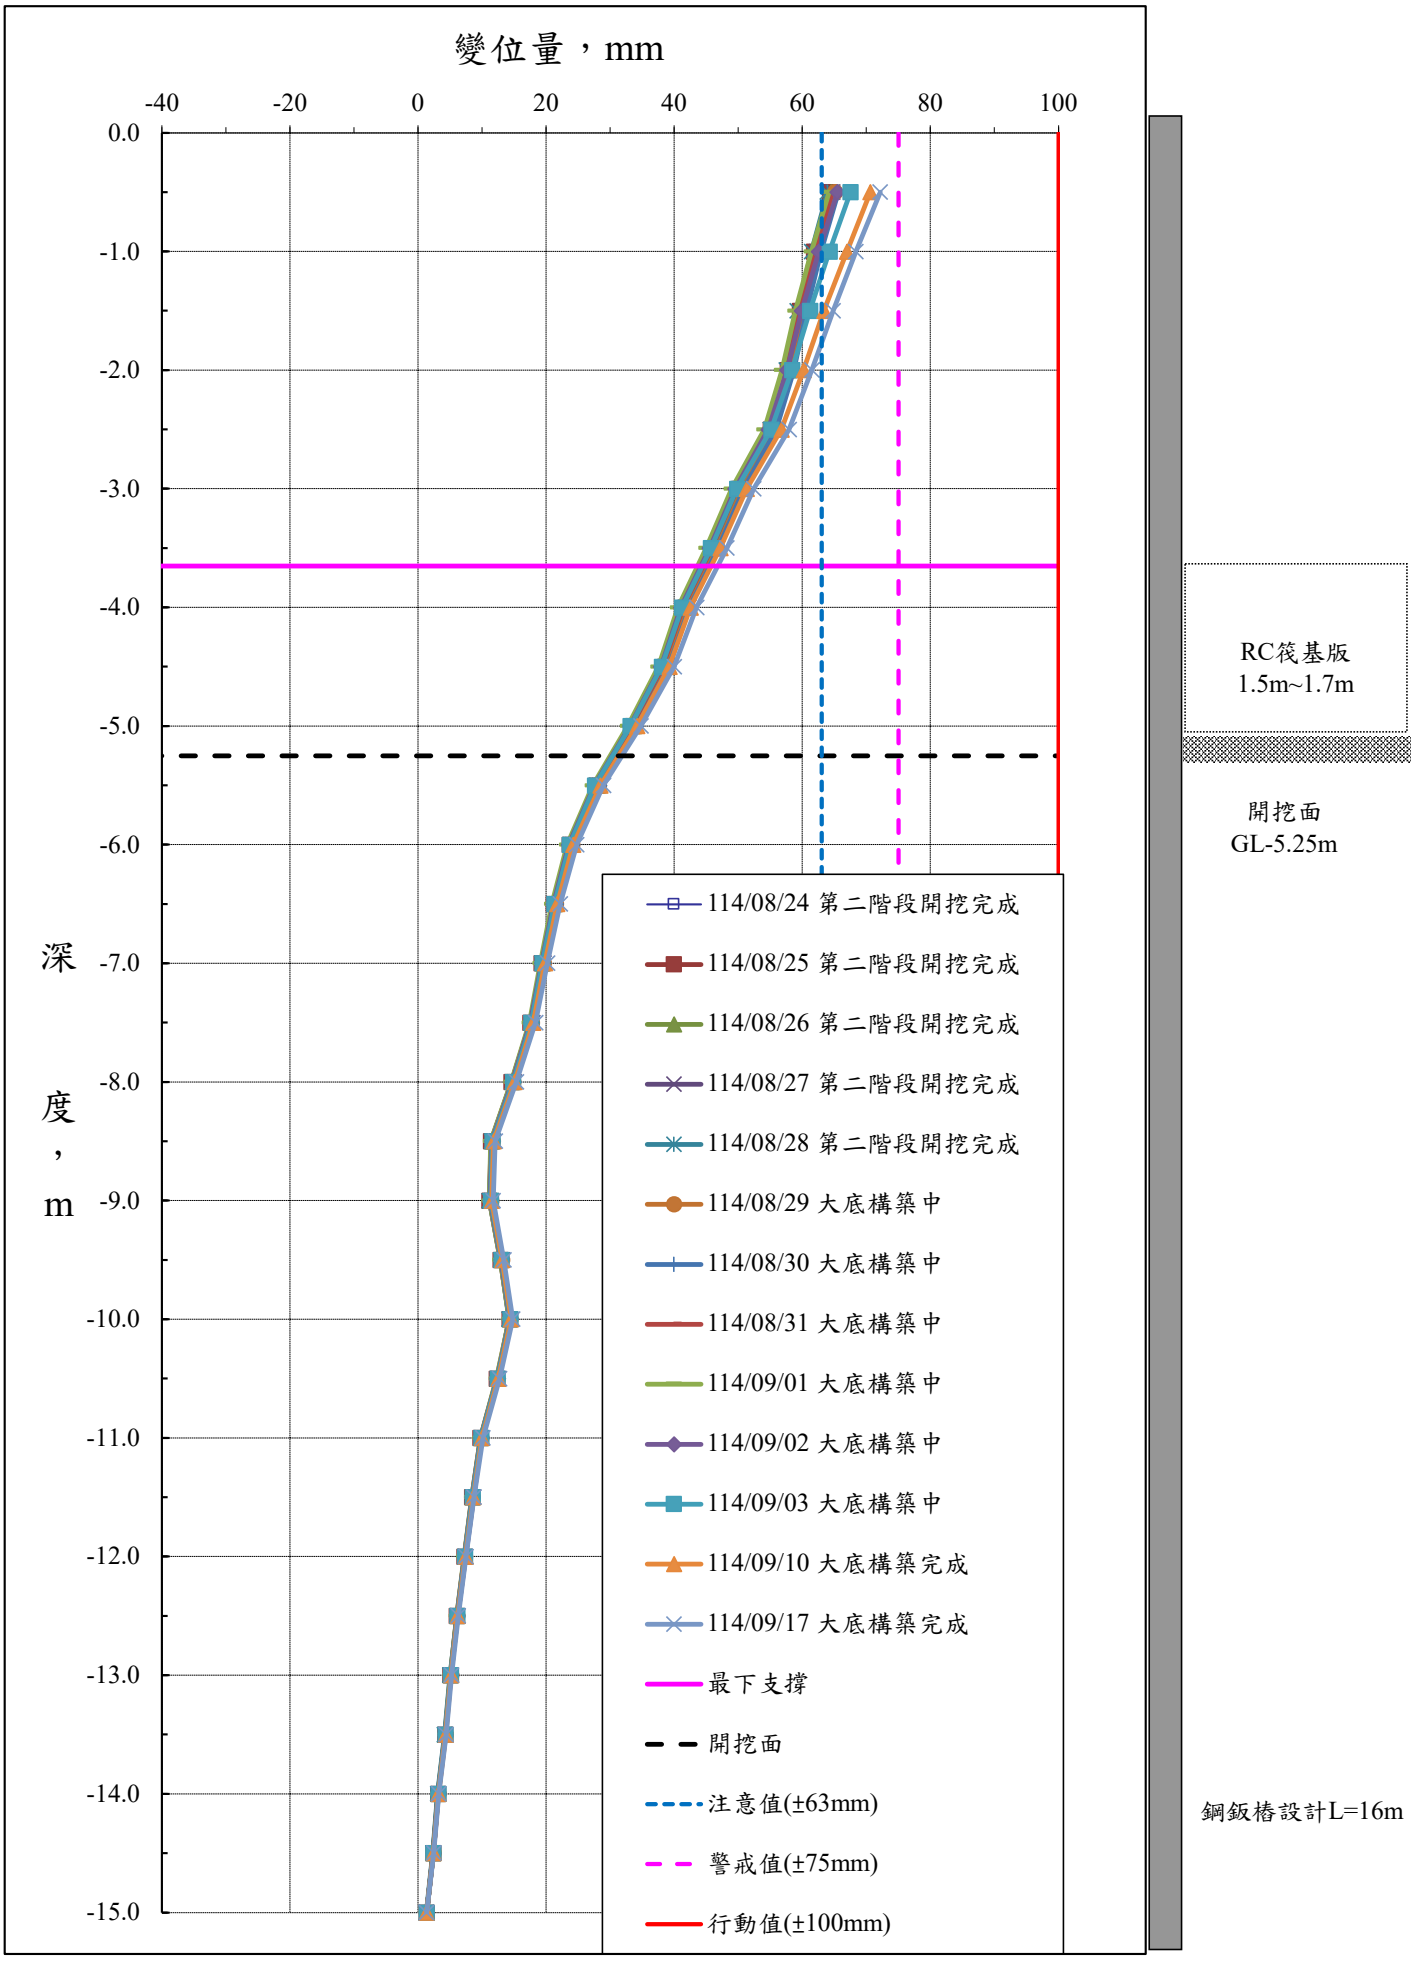

SIS-4 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	174.29	173.33	174.09	174.34	171.59	172.96	170.38	171.75	171.92	173.13	174.67	172.96	174.34
-1.0	160.31	159.90	160.23	160.47	155.31	157.89	154.54	157.12	158.93	159.70	164.09	157.89	160.47
-1.5	145.47	145.70	145.47	145.73	141.11	143.42	140.50	142.81	144.51	145.12	149.13	143.42	145.73
-2.0	131.27	131.82	131.37	131.74	127.95	129.85	127.43	129.33	130.70	131.22	134.49	129.85	131.74
-2.5	116.51	117.26	116.60	116.86	113.88	115.37	113.43	114.92	115.96	116.41	118.94	115.37	116.86
-3.0	102.78	103.51	102.76	102.94	100.76	101.85	100.31	101.40	102.04	102.49	104.21	101.85	102.94
-3.5	89.04	89.69	89.01	89.20	87.40	88.30	86.96	87.86	88.32	88.76	90.11	88.30	89.20
-4.0	78.54	79.03	78.60	78.78	77.00	77.89	76.59	77.48	77.96	78.37	79.74	77.89	78.78
-4.5	69.16	68.79	69.20	69.40	67.04	68.22	66.67	67.85	68.66	69.03	71.03	68.22	69.40
-5.0	57.69	57.26	57.69	57.87	55.68	56.78	55.37	56.47	57.25	57.56	59.44	56.78	57.87
-5.5	45.37	44.93	45.30	45.45	43.53	44.49	43.23	44.19	44.85	45.15	46.77	44.49	45.45
-6.0	36.24	35.72	36.25	36.42	34.46	35.44	34.18	35.16	35.86	36.14	37.81	35.44	36.42
-6.5	28.71	28.21	28.81	29.01	27.04	28.02	26.79	27.77	28.51	28.76	30.47	28.02	29.01
-7.0	22.57	22.18	22.69	22.88	21.94	22.41	21.70	22.17	22.40	22.64	23.34	22.41	22.88
-7.5	18.62	18.21	18.74	18.92	17.93	18.43	17.68	18.18	18.42	18.67	19.41	18.43	18.92
-8.0	15.82	15.45	16.03	16.24	15.18	15.71	15.00	15.53	15.88	16.06	16.94	15.71	16.24
-8.5	13.06	12.71	13.21	13.39	12.40	12.90	12.27	12.77	13.13	13.26	14.12	12.90	13.39
-9.0	10.55	10.22	10.51	10.65	9.76	10.21	9.68	10.13	10.49	10.57	11.38	10.21	10.65
-9.5	8.85	8.51	8.76	8.89	7.97	8.43	7.91	8.37	8.77	8.83	9.69	8.43	8.89
-10.0	7.24	7.02	7.13	7.26	6.48	6.87	6.44	6.83	7.18	7.22	7.96	6.87	7.26
-10.5	5.42	5.42	5.15	5.25	4.84	5.04	4.77	4.97	5.11	5.18	5.52	5.04	5.25
-11.0	4.70	4.67	4.41	4.53	4.06	4.30	4.02	4.26	4.45	4.49	4.92	4.30	4.53
-11.5	4.66	4.64	4.58	4.70	4.38	4.54	4.37	4.53	4.68	4.69	4.99	4.54	4.70
-12.0	4.38	4.35	4.49	4.55	4.44	4.50	4.46	4.52	4.59	4.57	4.70	4.50	4.55
-12.5	2.88	2.88	2.77	2.82	2.52	2.67	2.55	2.70	2.88	2.85	3.18	2.67	2.82
-13.0	2.70	2.61	2.79	2.87	2.56	2.72	2.54	2.70	2.83	2.85	3.14	2.72	2.87
-13.5	2.04	1.91	2.02	2.09	1.67	1.88	1.64	1.85	2.03	2.06	2.44	1.88	2.09
-14.0	1.79	1.67	1.90	1.96	1.70	1.83	1.66	1.79	1.88	1.92	2.13	1.83	1.96
-14.5	1.21	1.11	1.29	1.32	1.25	1.28	1.19	1.22	1.20	-0.03	-0.02	0.00	-1.25
-15.0	0.60	0.57	0.66	0.70	0.61	0.66	0.57	0.62	0.62	0.62	0.68	0.62	0.64

SIS-4 土中傾度管變位量歷時曲線圖

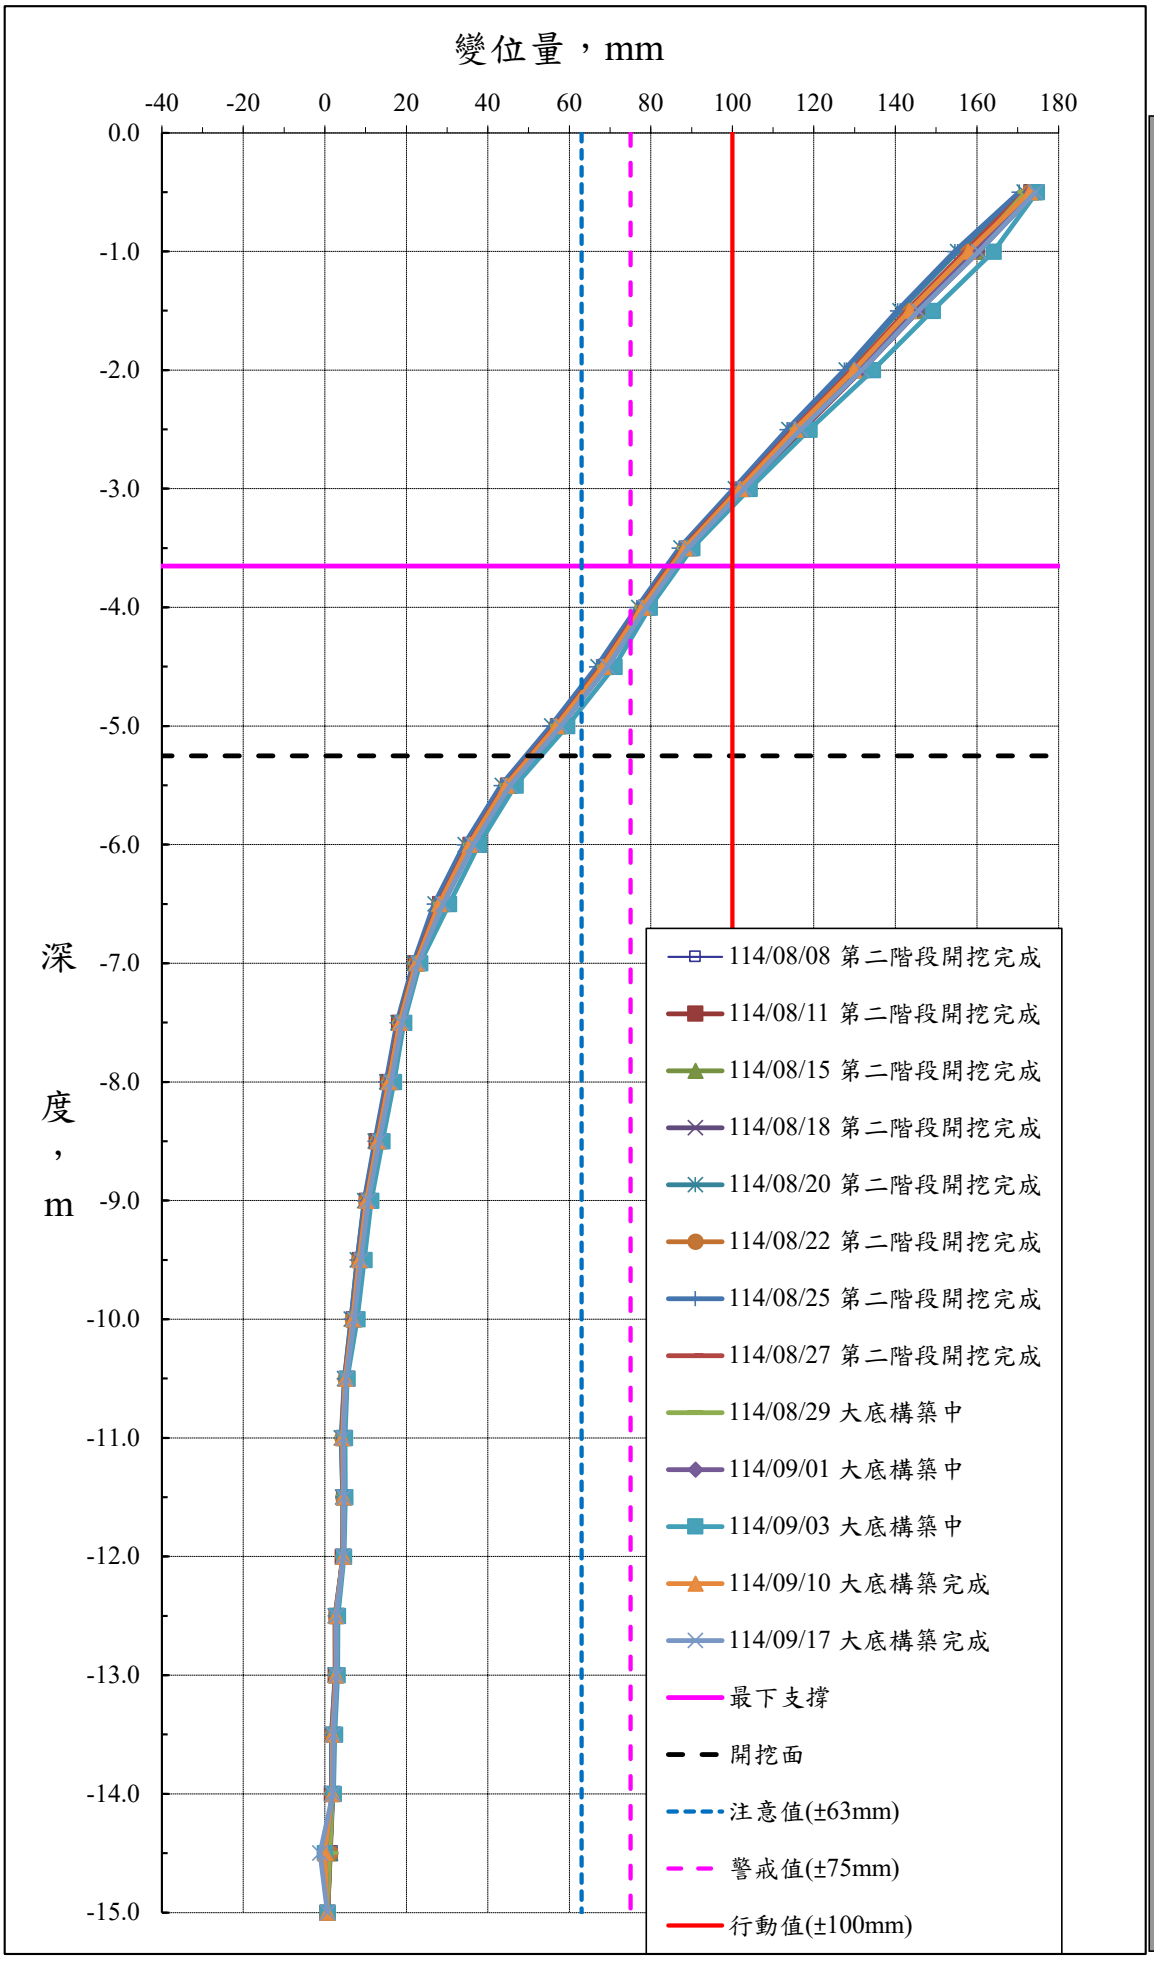

RC筏基版
1.5m~1.7m


開挖面　GL-5.25m

鋼鈑樁設計L=13m
因缺料改 鋼鈑樁
L=16.0m

SIS-5 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測
-1.0													
-1.5													
-2.0													
-2.5													
-3.0													
-3.5													
-4.0													
-4.5													
-5.0													
-5.5													
-6.0													
-6.5													
-7.0													
-7.5													
-8.0													
-8.5													
-9.0													
-9.5													
-10.0													
-10.5													
-11.0													
-11.5													
-12.0													
-12.5													
-13.0													
-13.5													
-14.0													
-14.5													
-15.0													


SIS-5 土中傾度管變位量歷時曲線圖

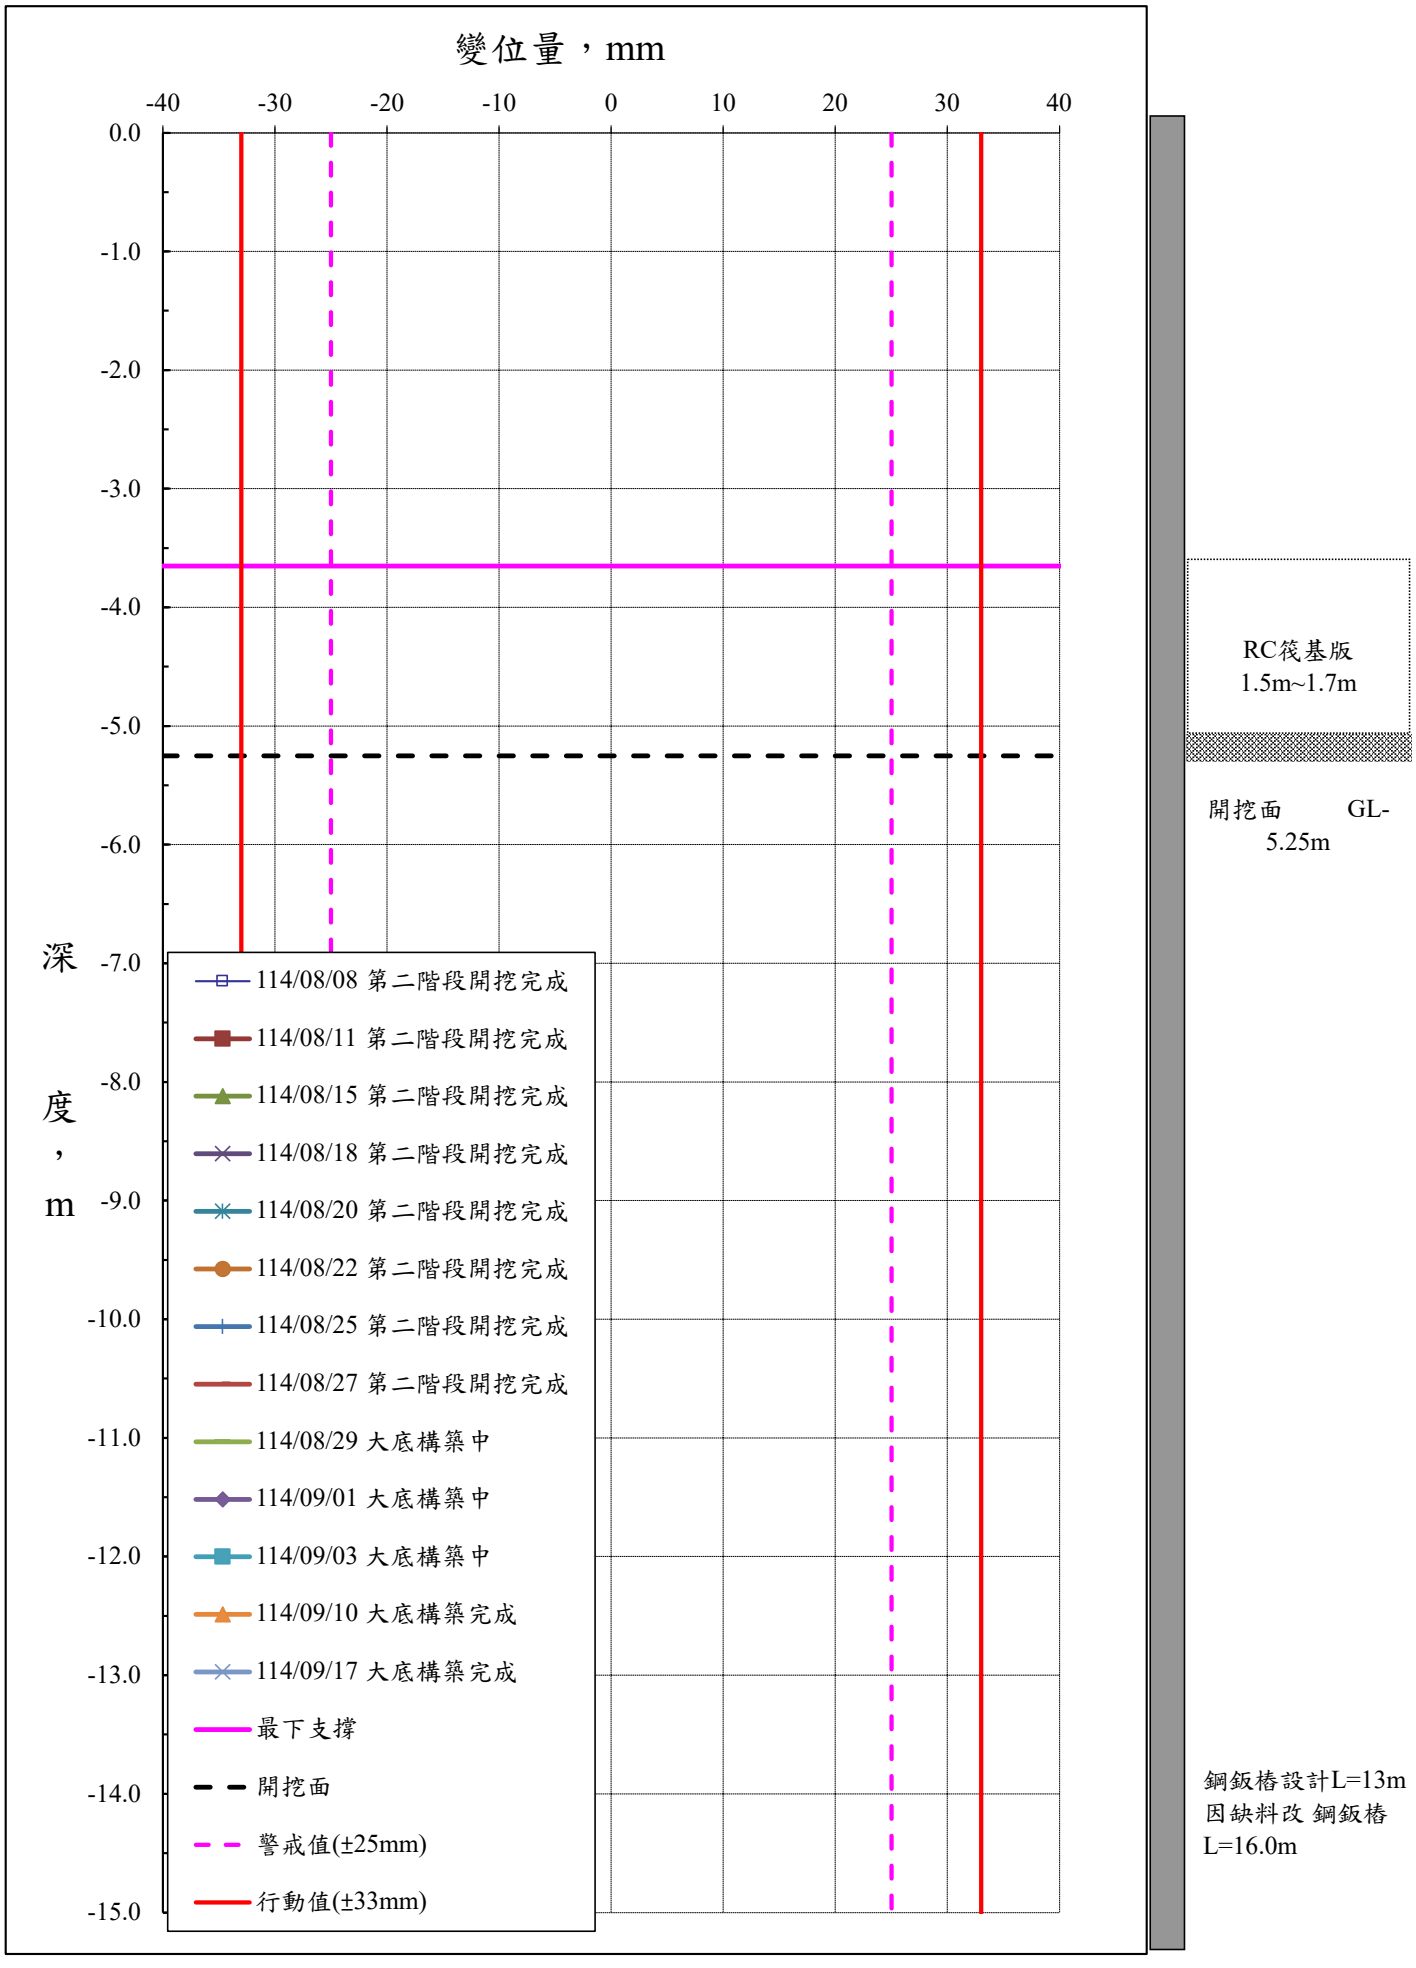

SIS-6 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	5.40	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測
-1.0	22.42												
-1.5	28.26												
-2.0	23.29												
-2.5	21.81												
-3.0	19.12												
-3.5	15.49												
-4.0	13.08												
-4.5	14.94												
-5.0	12.89												
-5.5	10.04												
-6.0	7.53												
-6.5	5.59												
-7.0	4.69												
-7.5	4.19												
-8.0	3.40												
-8.5	2.86												
-9.0	2.44												
-9.5	2.15												
-10.0	1.91												
-10.5	1.66												
-11.0	1.57												
-11.5	1.72												
-12.0	1.42												
-12.5	0.96												
-13.0	1.03												
-13.5	0.75												
-14.0	0.52												
-14.5	0.29												
-15.0	0.08												


SIS-6 土中傾度管變位量歷時曲線圖

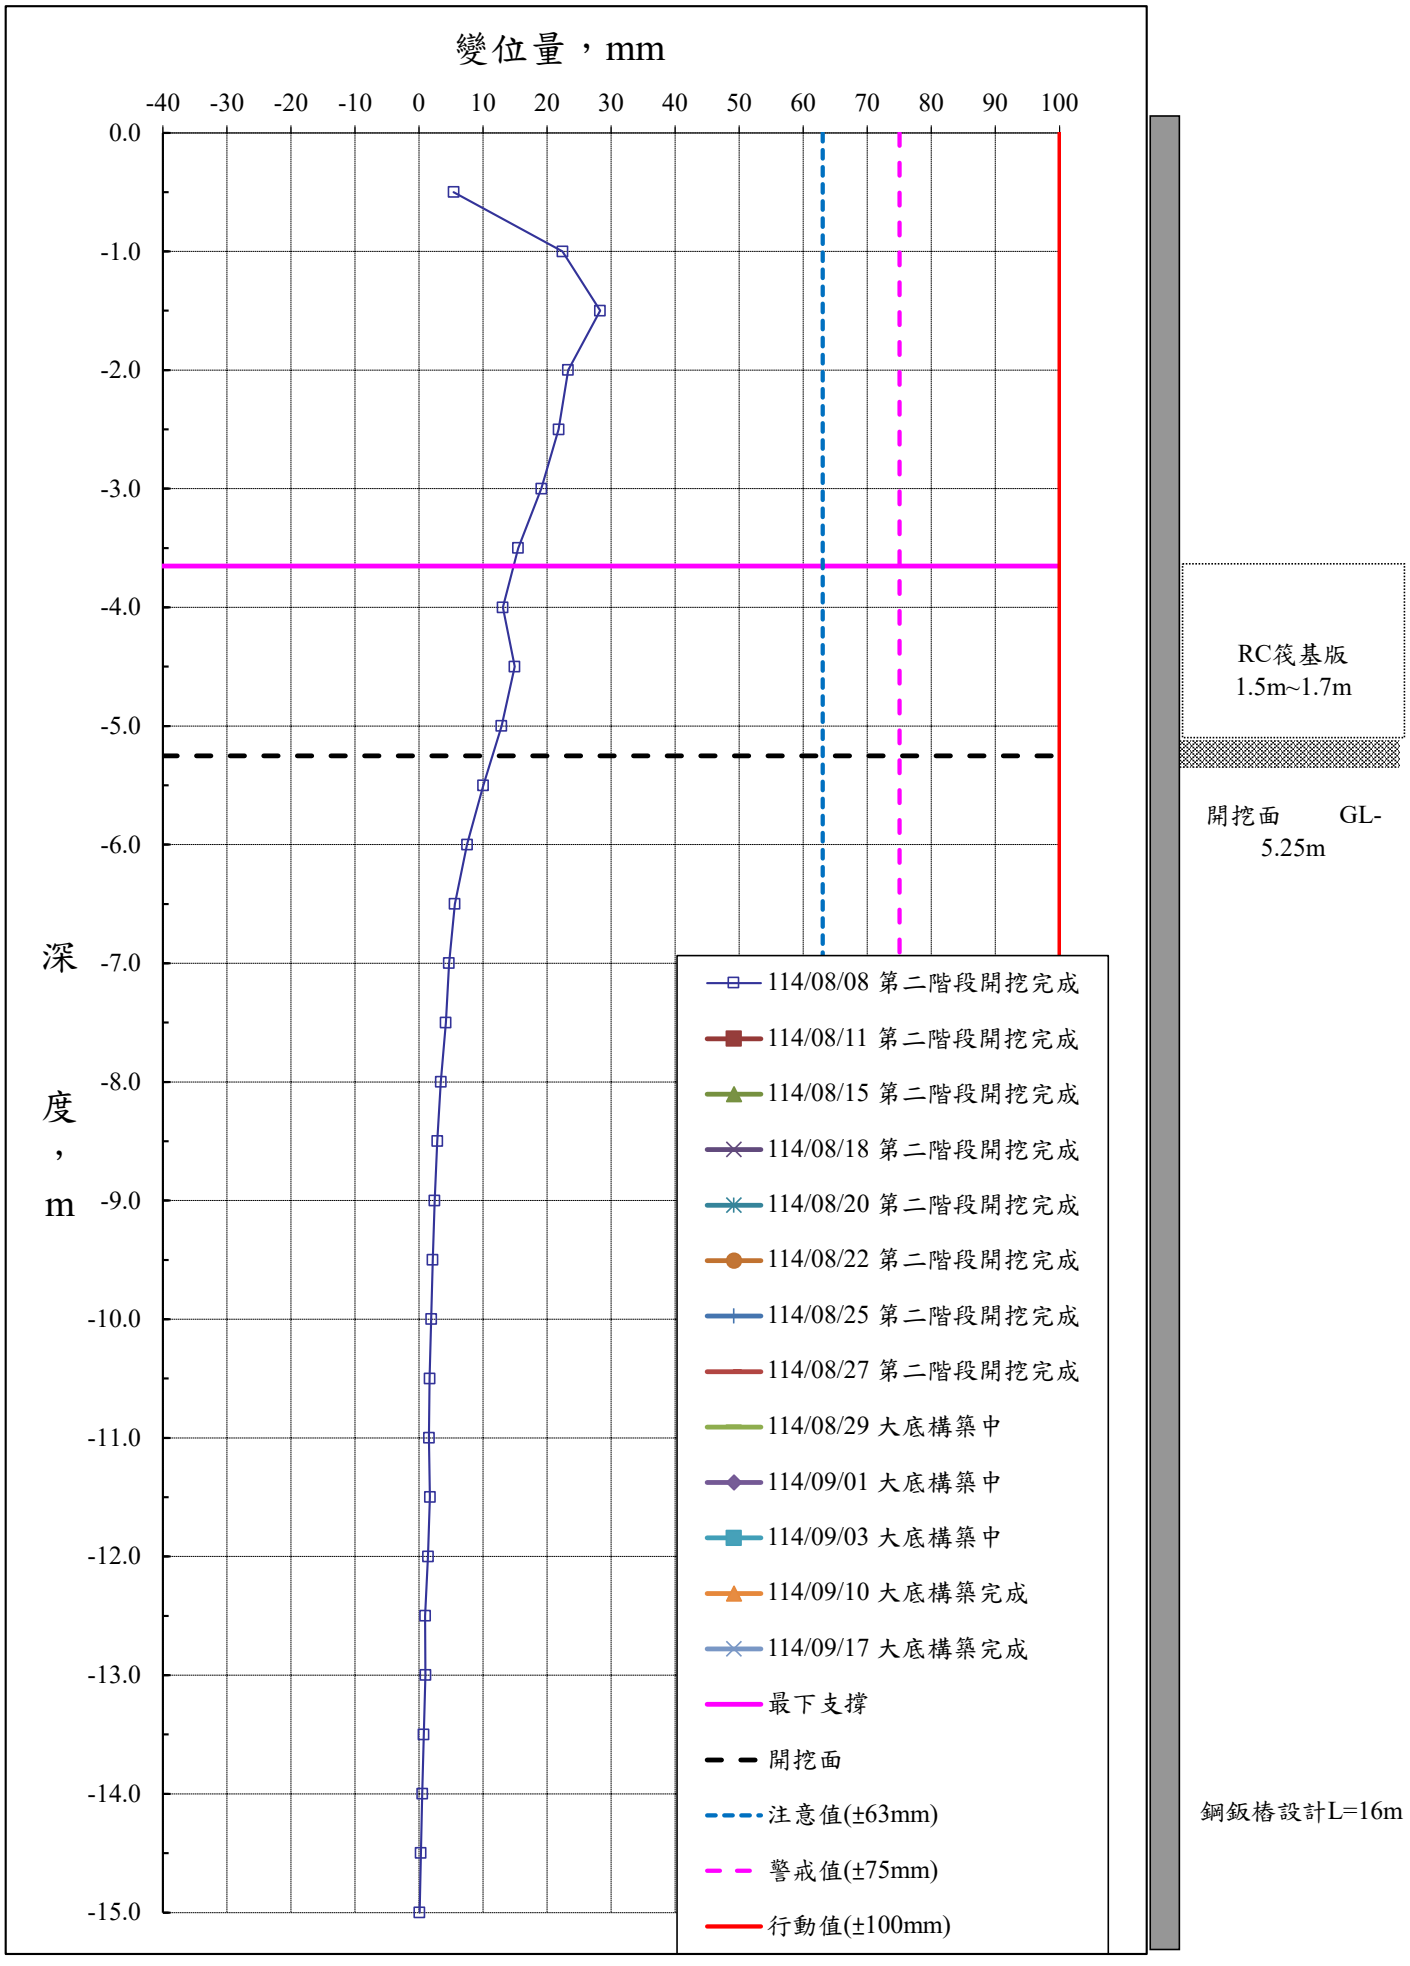

SIS-7 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	10.64	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測
-1.0	39.18												
-1.5	54.98												
-2.0	43.03												
-2.5	38.65												
-3.0	33.07												
-3.5	32.71												
-4.0	31.74												
-4.5	26.87												
-5.0	22.42												
-5.5	18.03												
-6.0	14.36												
-6.5	9.99												
-7.0	6.78												
-7.5	5.79												
-8.0	4.48												
-8.5	3.49												
-9.0	2.48												
-9.5	1.75												
-10.0	1.46												
-10.5	1.26												
-11.0	1.12												
-11.5	1.09												
-12.0	1.70												
-12.5	1.05												
-13.0	0.33												
-13.5	0.01												
-14.0	-0.18												
-14.5	-0.49												
-15.0	-0.04												


SIS-7 土中傾度管變位量歷時曲線圖

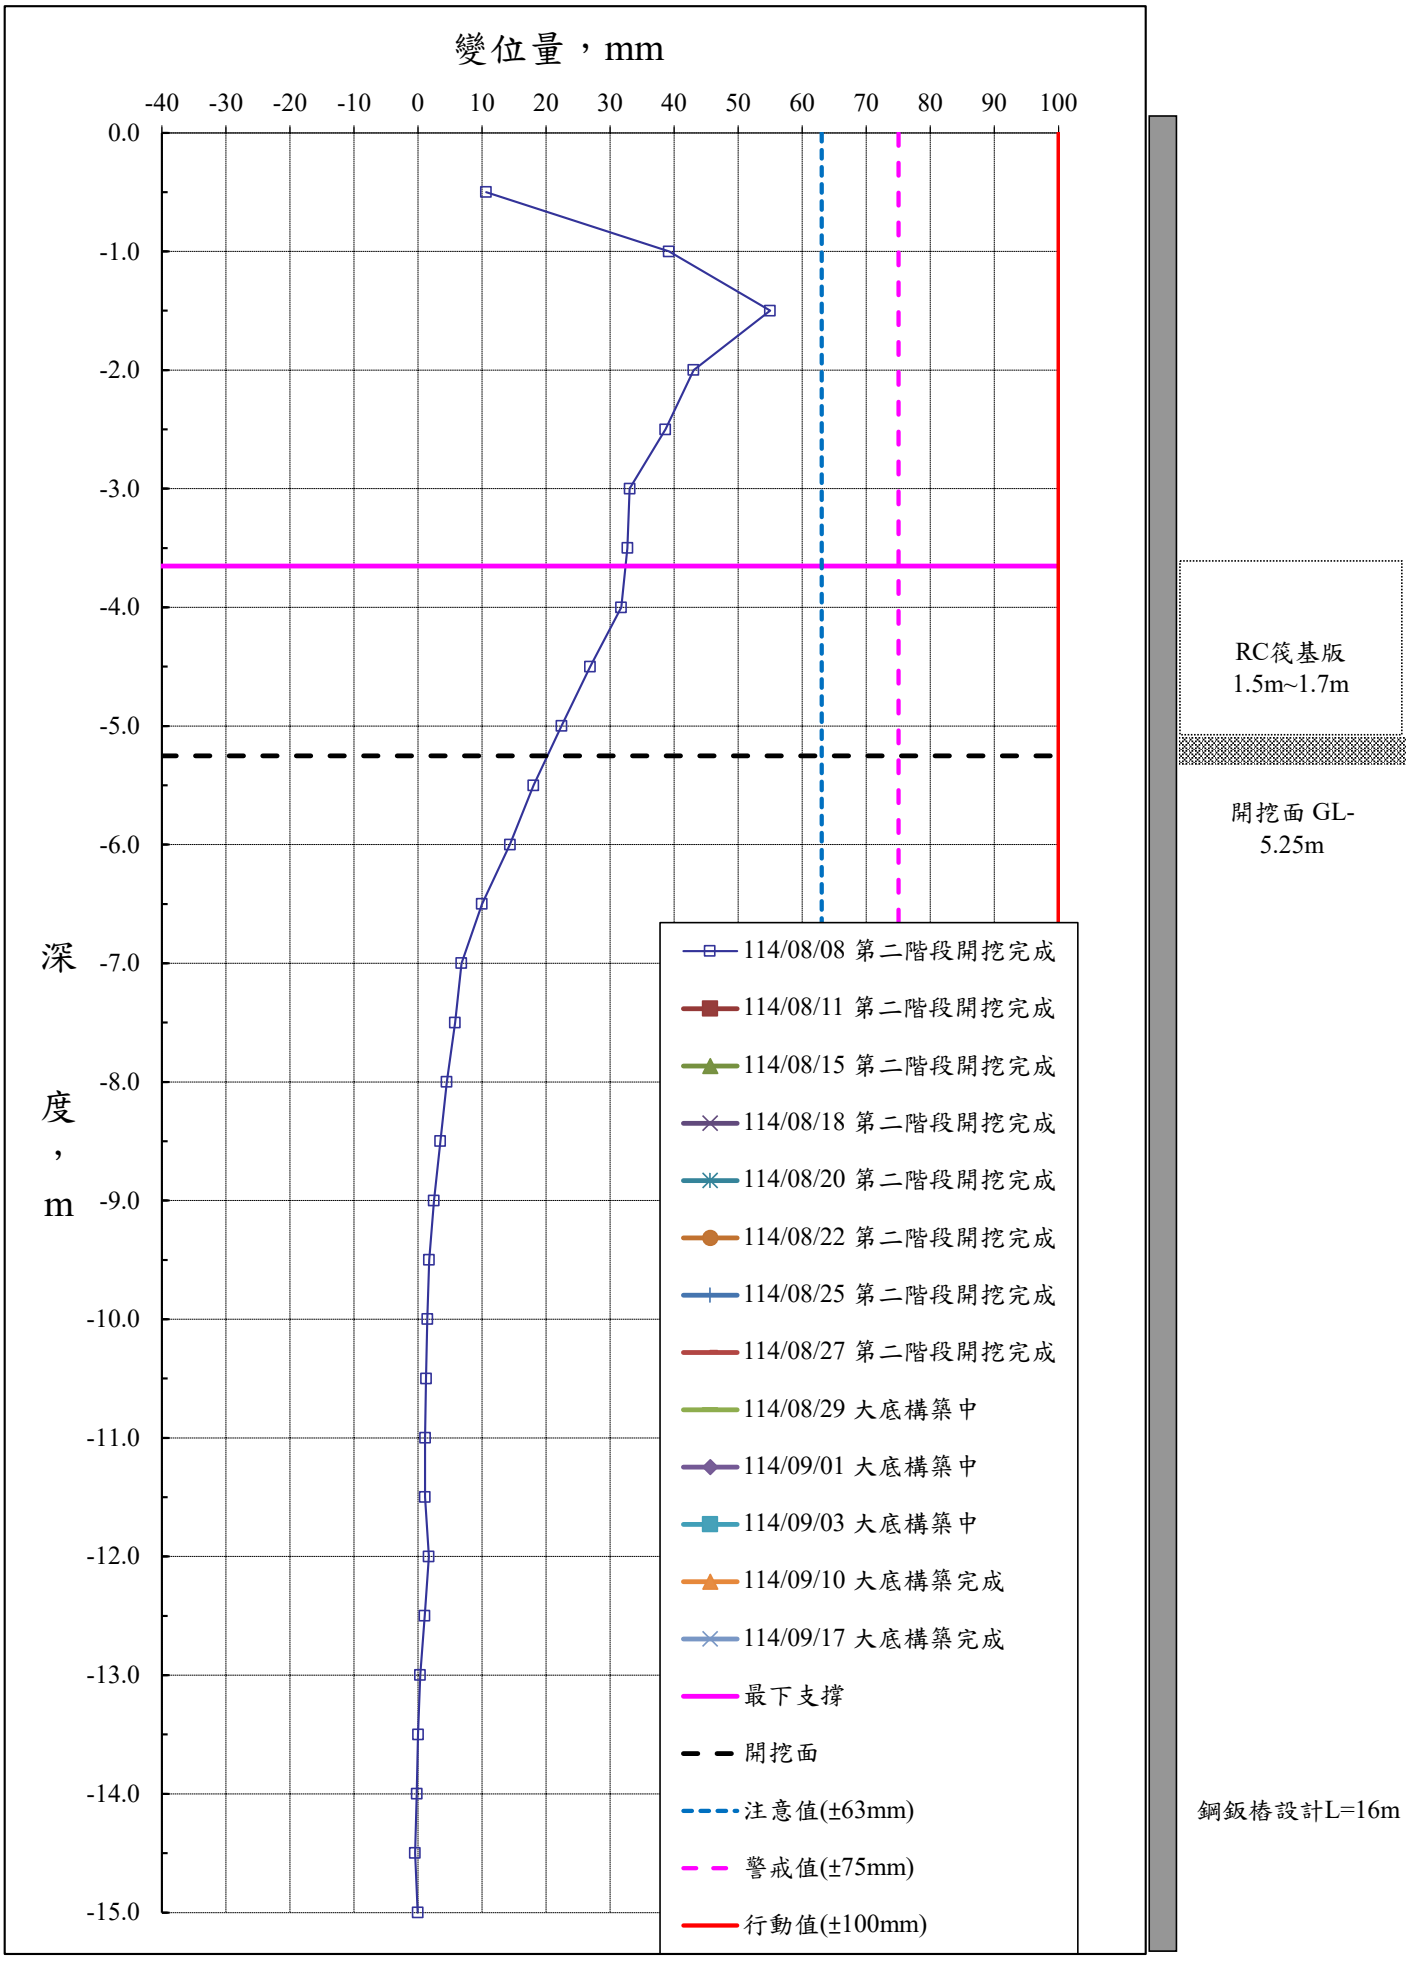

SIS-8 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	72.46	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測	因鋼鈑樁拔除時損壞無法量測
-1.0	69.40												
-1.5	63.57												
-2.0	57.60												
-2.5	51.09												
-3.0	42.62												
-3.5	35.87												
-4.0	30.11												
-4.5	24.39												
-5.0	19.03												
-5.5	13.83												
-6.0	8.79												
-6.5	6.75												
-7.0	5.06												
-7.5	4.31												
-8.0	3.99												
-8.5	3.58												
-9.0	3.49												
-9.5	3.37												
-10.0	3.44												
-10.5	3.25												
-11.0	2.97												
-11.5	2.67												
-12.0	2.42												
-12.5	2.48												
-13.0	1.90												
-13.5	1.35												
-14.0	1.06												
-14.5	0.84												
-15.0	0.39												


SIS-8 土中傾度管變位量歷時曲線圖

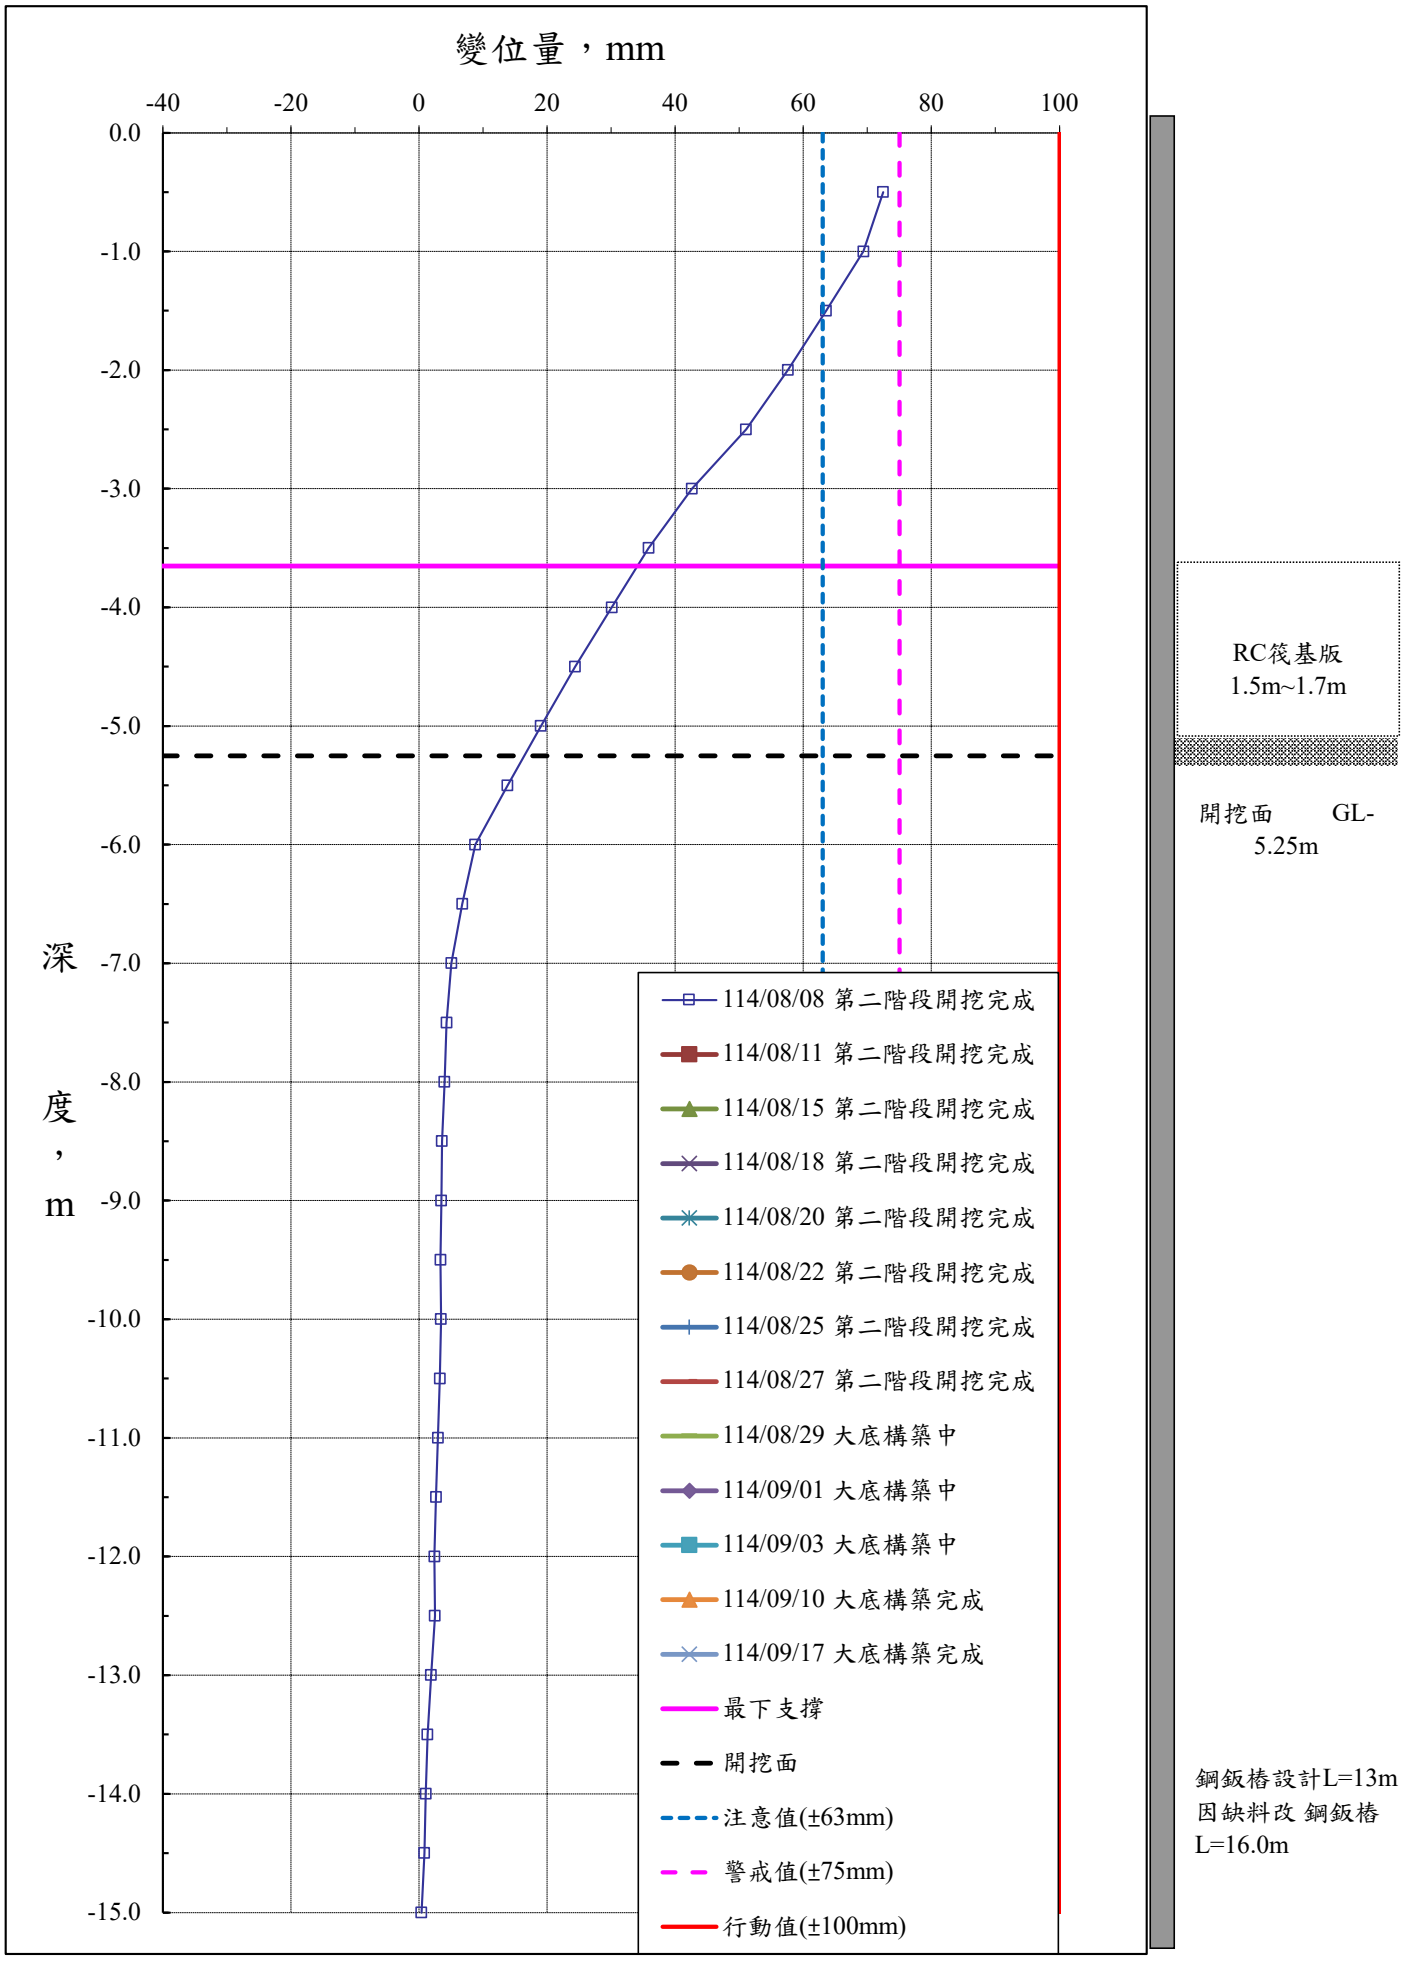

SIS-9 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	43.19	44.35	45.92	46.10	46.28	46.22	45.54	46.87	46.19	43.82	46.11	50.93	52.72
-1.0	40.98	41.12	43.96	44.11	44.25	43.70	42.91	43.95	43.16	41.12	43.95	48.68	49.72
-1.5	38.01	38.03	40.72	40.82	40.93	40.60	39.93	40.86	40.19	38.07	40.57	44.27	45.44
-2.0	33.54	33.72	36.10	36.01	35.92	36.20	35.60	36.43	35.83	33.78	35.91	38.72	40.01
-2.5	28.21	28.31	30.72	30.66	30.60	30.96	30.49	31.23	30.76	28.84	30.67	32.91	34.21
-3.0	23.68	23.48	26.38	26.47	26.57	26.58	26.14	26.81	26.37	24.78	26.24	28.21	29.29
-3.5	18.49	18.07	21.13	21.30	21.46	21.32	20.91	21.55	21.14	19.59	20.85	22.63	23.57
-4.0	13.95	13.45	16.37	16.56	16.74	16.58	16.19	16.78	16.39	14.94	16.02	17.56	18.41
-4.5	10.32	9.77	12.55	12.76	12.97	12.78	12.42	12.96	12.60	11.28	12.21	13.55	14.28
-5.0	6.78	6.13	8.76	8.99	9.22	8.97	8.61	9.11	8.75	7.66	8.45	9.62	10.22
-5.5	4.20	3.60	5.94	6.10	6.25	6.12	5.80	6.24	5.92	4.91	5.57	6.56	7.11
-6.0	3.86	3.46	5.37	5.40	5.43	5.56	5.26	5.65	5.35	4.37	4.97	5.83	6.40
-6.5	2.99	2.57	4.34	4.38	4.42	4.50	4.24	4.58	4.32	3.43	3.95	4.71	5.22
-7.0	2.57	2.21	3.77	3.79	3.80	3.92	3.67	3.97	3.72	2.95	3.43	4.08	4.53
-7.5	2.59	2.27	3.64	3.63	3.62	3.79	3.60	3.84	3.65	2.95	3.39	3.94	4.33
-8.0	2.14	1.80	3.06	3.07	3.07	3.18	2.98	3.20	3.00	2.42	2.80	3.25	3.58
-8.5	1.91	1.82	2.48	2.31	2.14	2.60	2.38	2.57	2.35	1.94	2.23	2.60	2.90
-9.0	2.38	2.52	2.90	2.58	2.27	3.03	2.83	3.00	2.80	2.47	2.77	3.04	3.34
-9.5	3.23	3.34	3.78	3.54	3.29	3.90	3.78	3.91	3.79	3.41	3.71	3.97	4.25
-10.0	3.41	3.51	3.91	3.71	3.50	4.03	3.91	4.04	3.92	3.62	3.89	4.11	4.37
-10.5	3.76	3.95	4.25	4.05	3.86	4.36	4.28	4.36	4.28	4.04	4.26	4.45	4.70
-11.0	3.84	3.65	4.44	4.53	4.62	4.52	4.47	4.54	4.49	4.31	4.51	4.69	4.86
-11.5	2.61	2.03	3.27	3.67	4.08	3.30	3.28	3.32	3.30	3.17	3.32	3.52	3.63
-12.0	2.41	2.06	2.94	3.15	3.36	2.98	2.96	2.97	2.95	2.84	2.96	3.16	3.24
-12.5	2.00	1.41	2.51	2.88	3.25	2.51	2.53	2.54	2.56	2.44	2.53	2.71	2.77
-13.0	1.72	1.14	2.19	2.56	2.93	2.17	2.19	2.21	2.23	2.11	2.19	2.34	2.39
-13.5	1.22	0.54	1.68	2.11	2.54	1.61	1.66	1.67	1.72	1.59	1.66	1.79	1.79
-14.0	0.67	-0.06	1.09	1.58	2.06	0.98	1.05	1.07	1.14	1.01	1.07	1.17	1.12
-14.5	0.26	-0.36	0.60	0.99	1.38	0.54	0.57	0.58	0.61	0.52	0.56	0.65	0.59
-15.0	0.03	-0.40	0.27	0.55	0.82	0.20	0.21	0.23	0.24	0.19	0.20	0.28	0.25

SIS-9 土中傾度管變位量歷時曲線圖

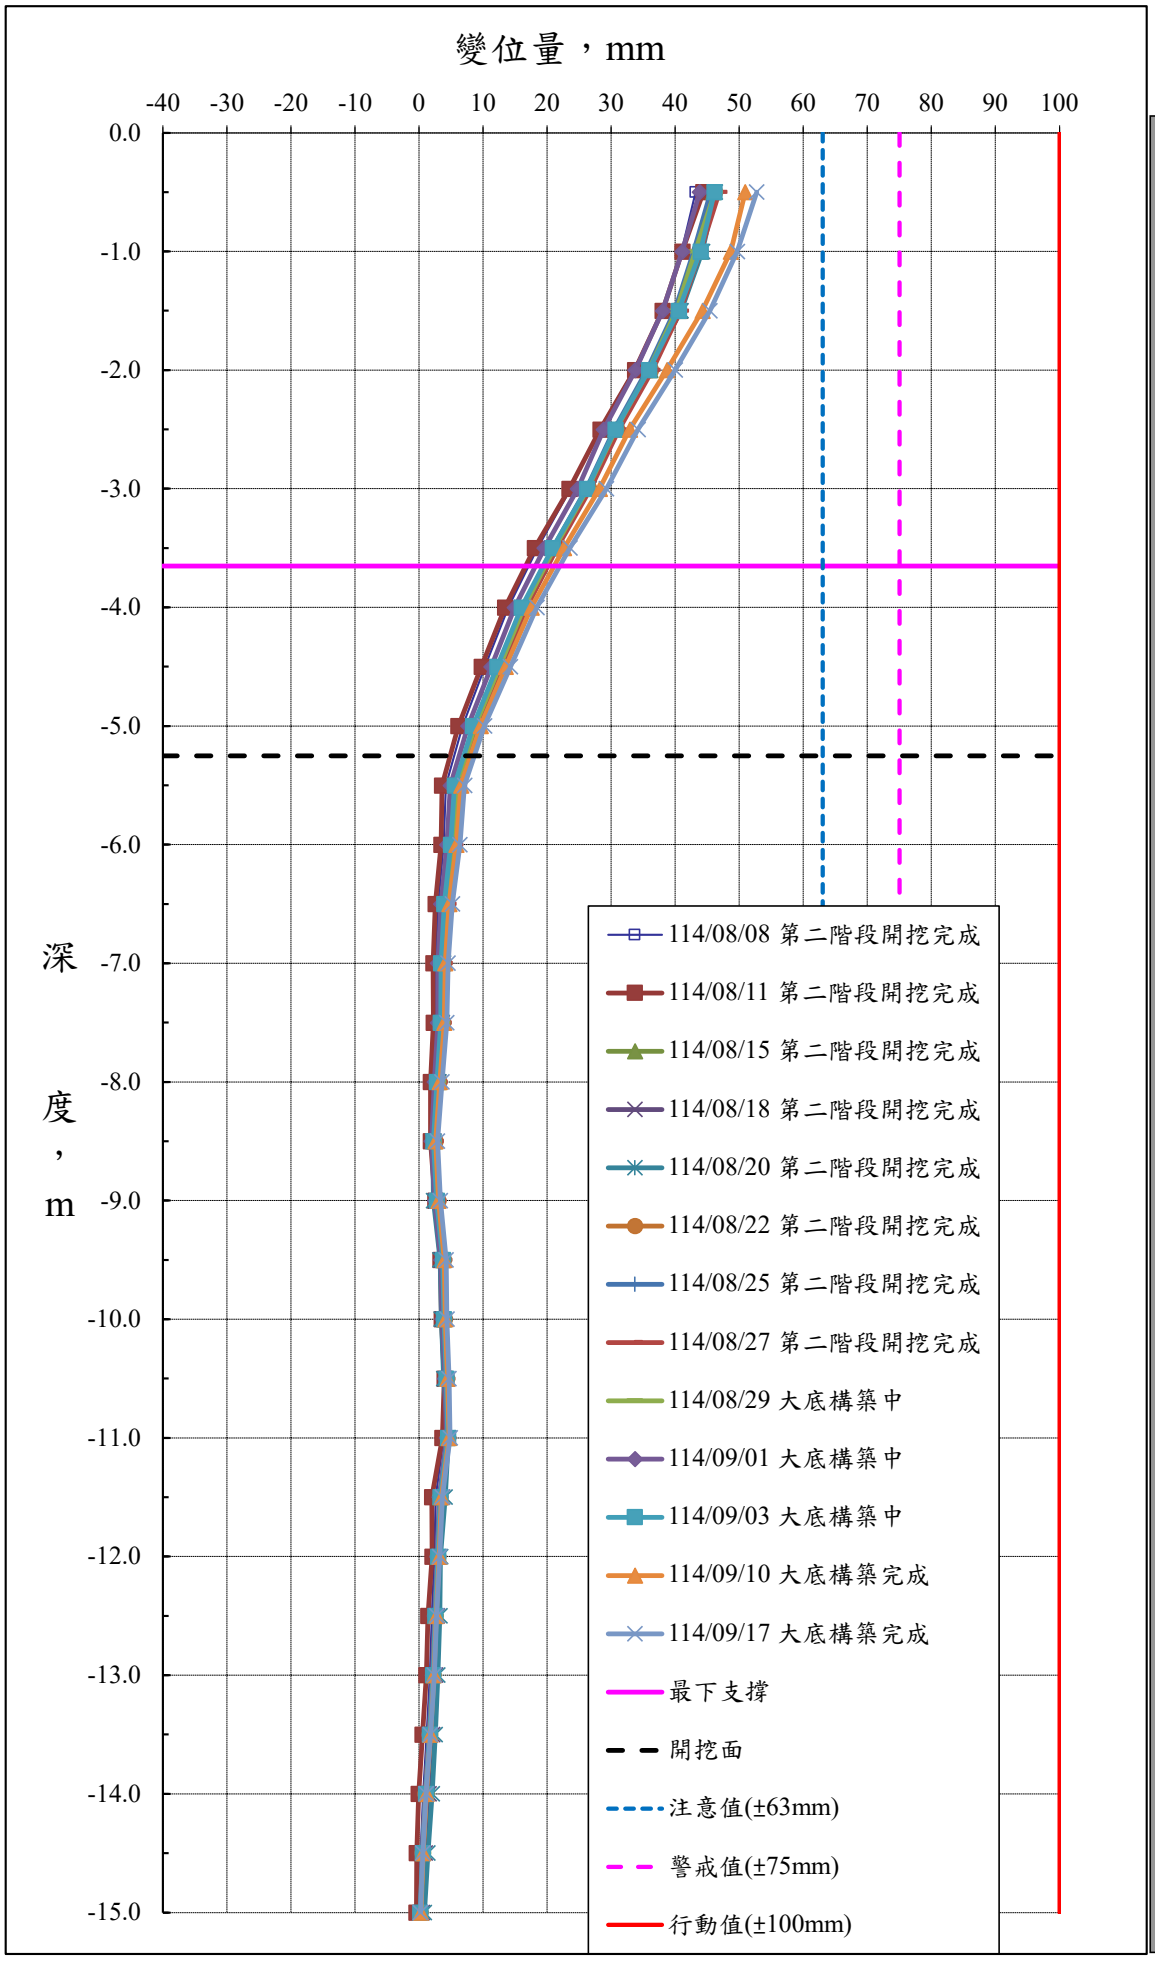

RC筏基版
1.5m~1.7m


開挖面
GL-5.25m

鋼鈑樁設計L=13m
因缺料改 鋼鈑樁
L=16.0m

SIS-10 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/08	114/08/11	114/08/15	114/08/18	114/08/20	114/08/22	114/08/25	114/08/27	114/08/29	114/09/01	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	24.85	24.43	26.38	26.80	27.23	26.66	26.11	25.69	25.84	26.96	26.19	28.08	30.87
-1.0	29.58	29.30	30.90	31.18	31.46	30.77	30.42	30.14	31.21	32.25	31.12	33.29	35.69
-1.5	32.48	32.22	33.67	33.93	34.20	33.66	33.42	33.16	34.18	34.96	34.09	35.74	38.12
-2.0	31.00	30.96	32.00	32.04	32.07	32.09	31.98	31.94	32.77	32.86	32.45	32.95	35.64
-2.5	28.32	28.28	29.28	29.32	29.36	29.52	29.50	29.46	30.15	30.01	29.86	29.86	32.15
-3.0	24.76	24.92	25.93	25.77	25.61	26.10	26.11	26.27	26.68	26.18	26.46	25.69	28.10
-3.5	20.81	21.02	21.96	21.75	21.54	22.05	22.08	22.29	22.59	22.05	22.44	21.50	23.48
-4.0	17.16	17.25	18.19	18.10	18.02	18.28	18.35	18.44	18.82	18.49	18.63	18.15	19.39
-4.5	14.03	14.15	14.95	14.83	14.71	15.03	15.12	15.24	15.55	15.14	15.39	14.73	15.90
-5.0	11.32	11.42	12.09	11.99	11.88	12.15	12.26	12.36	12.63	12.25	12.49	11.87	12.79
-5.5	8.42	8.37	8.93	8.98	9.03	9.10	9.15	9.10	9.51	9.39	9.39	9.26	9.64
-6.0	7.38	7.36	7.78	7.80	7.82	7.86	8.01	7.99	8.29	8.10	8.20	7.92	8.27
-6.5	6.47	6.40	6.76	6.83	6.90	6.84	6.99	6.92	7.24	7.15	7.19	7.05	7.21
-7.0	5.18	5.14	5.42	5.46	5.51	5.47	5.62	5.58	5.84	5.73	5.82	5.62	5.81
-7.5	4.40	4.46	4.61	4.55	4.49	4.62	4.77	4.83	4.99	4.71	4.97	4.43	4.94
-8.0	3.78	3.76	3.95	3.97	3.98	3.98	4.10	4.08	4.31	4.19	4.28	4.08	4.25
-8.5	3.38	3.46	3.50	3.42	3.35	3.53	3.65	3.73	3.83	3.53	3.80	3.23	3.76
-9.0	3.32	3.34	3.40	3.38	3.35	3.47	3.61	3.63	3.74	3.48	3.69	3.22	3.66
-9.5	2.72	3.07	2.83	2.48	2.13	2.87	3.02	3.37	3.12	2.23	3.13	1.34	3.05
-10.0	2.69	2.95	2.78	2.52	2.26	2.81	3.00	3.26	3.07	2.33	3.08	1.59	3.01
-10.5	1.78	2.50	1.98	1.26	0.53	1.87	2.15	2.87	2.17	0.55	2.23	-1.06	2.13
-11.0	1.21	2.14	1.47	0.54	-0.38	1.29	1.64	2.57	1.60	-0.42	1.72	-2.45	1.59
-11.5	1.49	2.28	1.71	0.92	0.13	1.56	1.90	2.69	1.85	0.08	1.97	-1.69	1.85
-12.0	1.74	2.28	1.89	1.35	0.80	1.80	2.09	2.63	2.03	0.74	2.14	-0.54	2.06
-12.5	1.80	2.01	1.89	1.68	1.47	1.89	2.09	2.30	2.05	1.43	2.11	0.81	2.10
-13.0	1.73	1.76	1.78	1.75	1.71	1.81	1.96	1.99	1.91	1.66	1.95	1.42	1.96
-13.5	0.77	1.09	0.89	0.57	0.24	0.80	1.02	1.34	0.91	0.13	1.00	-0.64	0.97
-14.0	0.06	0.81	0.22	-0.53	-1.28	0.02	0.31	1.06	0.17	-1.42	0.31	-3.02	0.21
-14.5	-0.02	0.48	0.09	-0.41	-0.91	-0.06	0.15	0.65	0.06	-1.00	0.13	-2.05	0.07
-15.0	0.32	0.21	0.26	0.37	0.49	0.31	0.29	0.18	0.30	0.50	0.29	0.70	0.29


SIS-10 土中傾度管變位量歷時曲線圖

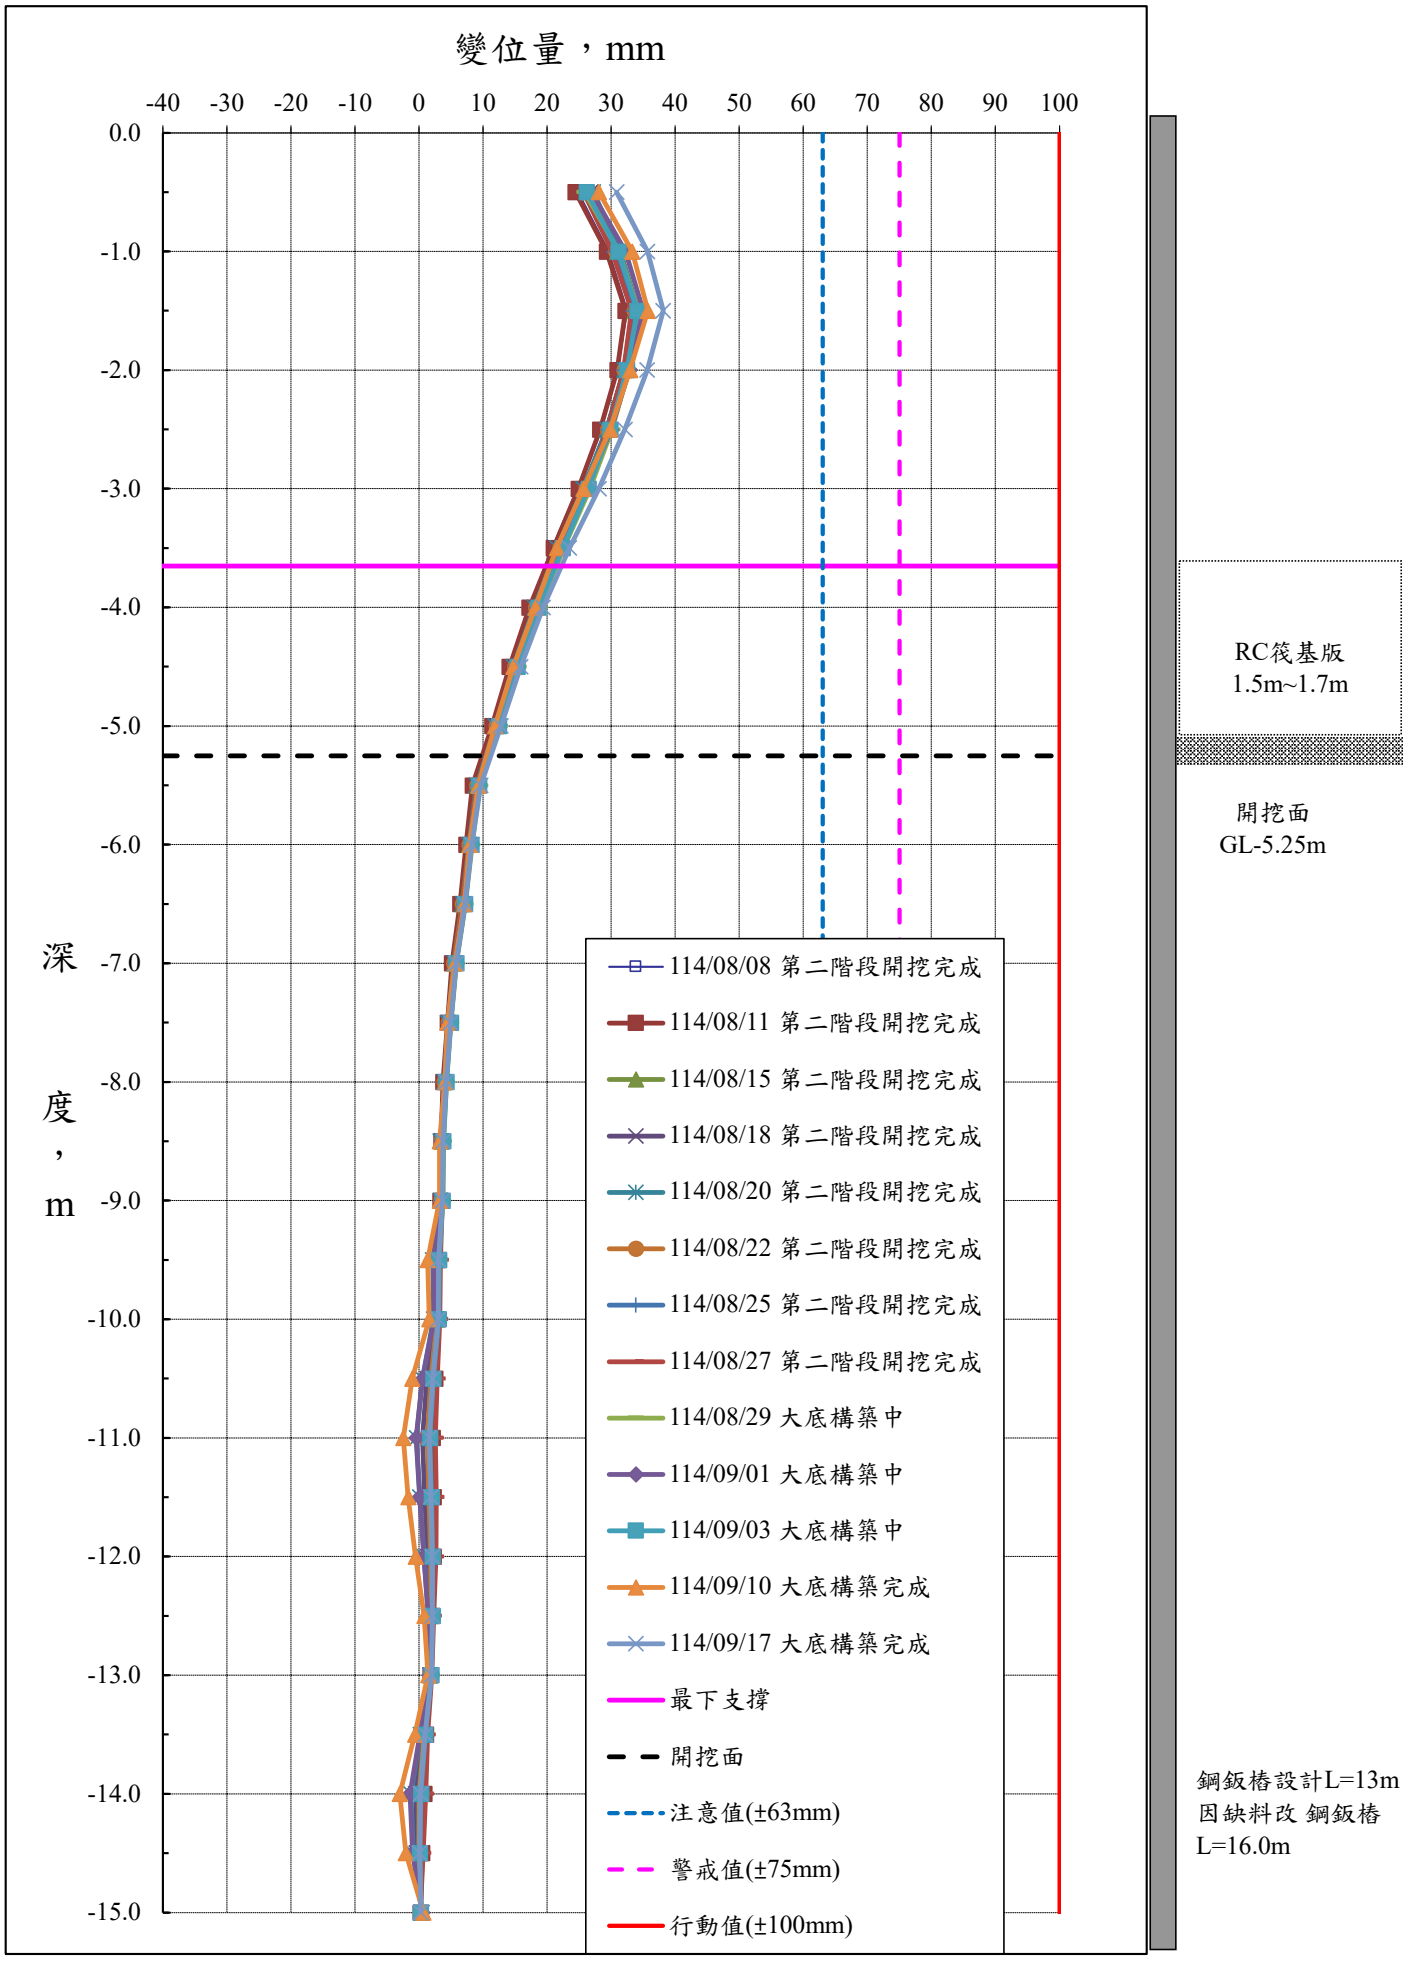

SIS-11 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/24	114/08/25	114/08/26	114/08/27	114/08/28	114/08/29	114/08/30	114/08/31	114/09/01	114/09/02	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測	因傾斜管儀器卡住無法量測
-1.0													
-1.5													
-2.0													
-2.5													
-3.0													
-3.5													
-4.0													
-4.5													
-5.0													
-5.5													
-6.0													
-6.5													
-7.0													
-7.5													
-8.0													
-8.5													
-9.0													
-9.5													
-10.0													
-10.5													
-11.0													
-11.5													
-12.0													
-12.5													
-13.0													
-13.5													
-14.0													
-14.5													
-15.0													

SIS-11 土中傾度管變位量歷時曲線圖

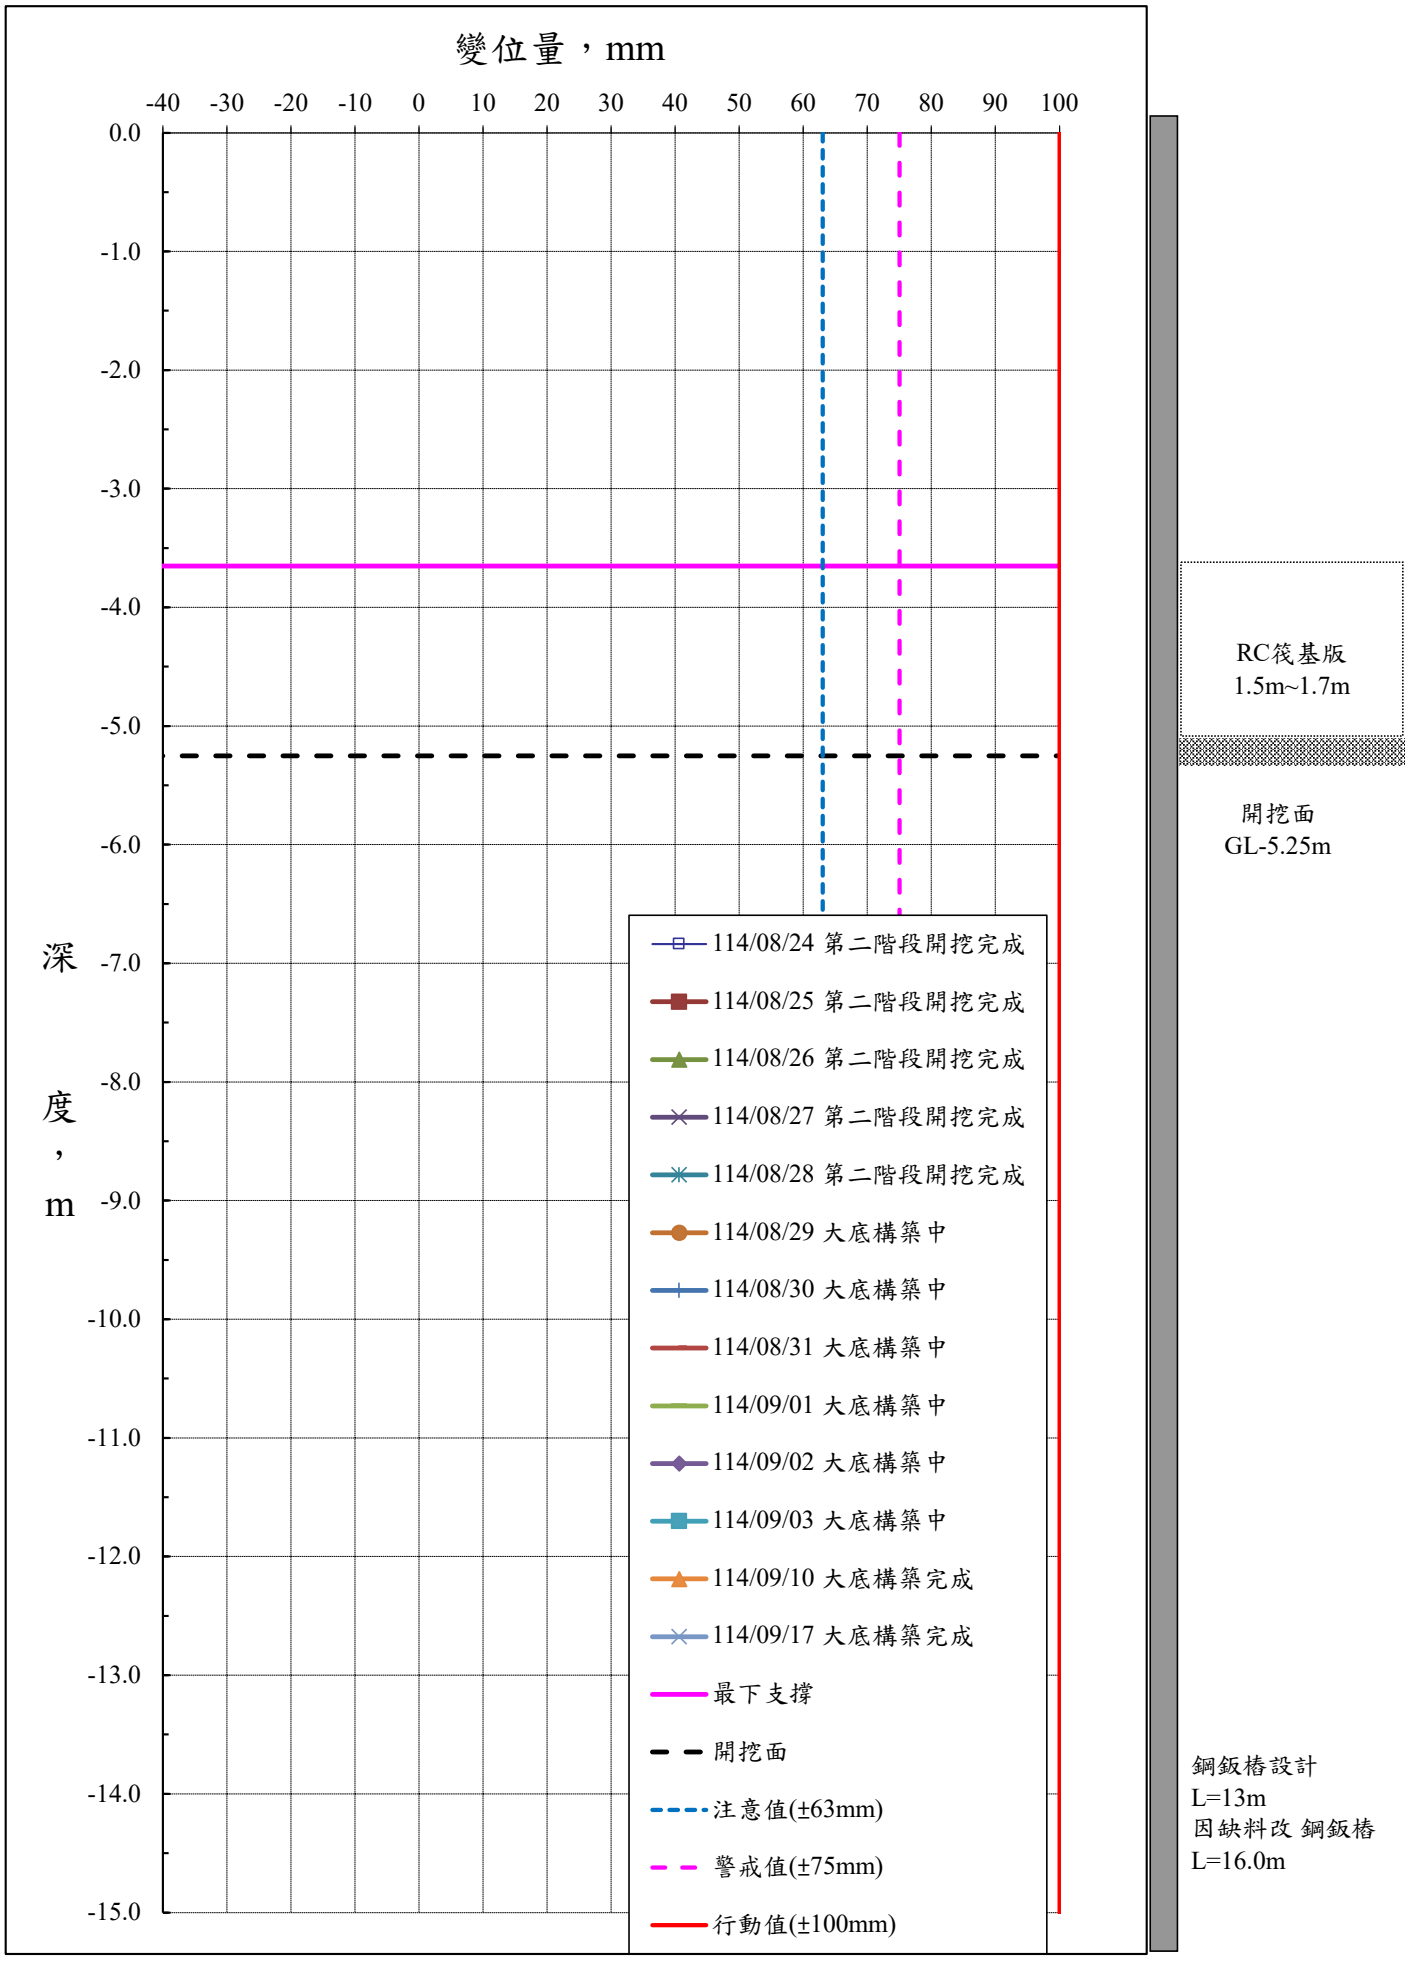

SIS-12 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/08/24	114/08/25	114/08/26	114/08/27	114/08/28	114/08/29	114/08/30	114/08/31	114/09/01	114/09/02	114/09/03	114/09/10	114/09/17
-0.5	81.78	81.18	82.10	81.61	81.37	81.42	82.00	81.61	81.42	81.41	81.19	81.58	81.02
-1.0	73.78	73.12	74.04	73.60	73.43	73.29	73.64	73.33	73.06	73.14	73.02	73.06	73.11
-1.5	67.30	66.68	67.59	67.11	66.94	66.85	67.15	66.87	66.61	66.68	66.57	66.61	66.88
-2.0	60.16	59.56	60.42	60.02	59.84	59.74	60.11	59.80	59.54	59.60	59.47	59.56	60.02
-2.5	50.73	50.15	50.99	50.61	50.41	50.35	50.71	50.40	50.13	50.20	50.06	50.16	50.92
-3.0	38.56	38.02	38.83	38.43	38.27	38.18	38.60	38.24	37.93	38.02	37.88	38.05	38.84
-3.5	26.36	25.89	26.58	26.25	26.06	26.08	26.43	26.09	25.76	25.86	25.72	25.90	26.69
-4.0	21.23	20.81	21.46	21.13	20.95	20.99	21.25	20.98	20.68	20.79	20.70	20.82	21.91
-4.5	16.60	16.23	16.82	16.53	16.37	16.39	16.67	16.39	16.10	16.20	16.10	16.24	17.37
-5.0	12.26	11.95	12.45	12.18	12.05	12.08	12.34	12.08	11.80	11.89	11.79	11.95	13.12
-5.5	9.18	8.92	9.34	9.10	9.02	9.00	9.23	8.99	8.73	8.83	8.75	8.88	10.12
-6.0	7.53	7.32	7.66	7.47	7.44	7.35	7.57	7.34	7.11	7.20	7.14	7.24	8.46
-6.5	7.08	6.89	7.18	7.02	7.00	6.91	7.07	6.89	6.69	6.77	6.71	6.76	7.96
-7.0	6.49	6.35	6.55	6.46	6.48	6.33	6.50	6.32	6.14	6.20	6.16	6.20	7.30
-7.5	5.28	5.17	5.30	5.28	5.31	5.14	5.28	5.13	4.95	5.02	4.98	4.98	5.97
-8.0	4.19	4.10	4.20	4.20	4.24	4.06	4.18	4.04	3.89	3.95	3.93	3.91	4.83
-8.5	3.96	3.87	3.97	3.93	3.96	3.84	3.95	3.83	3.72	3.76	3.73	3.75	4.64
-9.0	3.66	3.56	3.68	3.60	3.64	3.52	3.63	3.52	3.42	3.46	3.45	3.48	4.29
-9.5	3.02	2.95	3.04	2.97	3.03	2.89	3.02	2.90	2.80	2.83	2.80	2.85	3.52
-10.0	2.04	1.97	2.04	2.01	2.08	1.90	2.05	1.94	1.85	1.87	1.81	1.85	2.37
-10.5	1.00	0.96	0.98	0.96	1.08	0.84	0.96	0.87	0.80	0.82	0.77	0.77	1.17
-11.0	0.57	0.55	0.54	0.55	0.65	0.45	0.54	0.46	0.40	0.42	0.40	0.39	0.72
-11.5	1.17	1.15	1.17	1.16	1.26	1.05	1.18	1.10	1.06	1.07	1.06	1.08	1.37
-12.0	1.91	1.89	1.93	1.91	2.01	1.79	1.92	1.85	1.84	1.84	1.83	1.84	2.13
-12.5	1.87	1.87	1.90	1.89	1.98	1.78	1.91	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	2.10
-13.0	1.08	1.08	1.12	1.10	1.12	1.06	1.13	1.09	1.07	1.08	1.08	1.11	1.26
-13.5	0.75	0.76	0.77	0.78	0.81	0.73	0.81	0.77	0.76	0.77	0.78	0.81	0.91
-14.0	0.55	0.53	0.56	0.56	0.56	0.53	0.59	0.56	0.56	0.56	0.58	0.61	0.64
-14.5	0.36	0.34	0.37	0.34	0.37	0.31	0.37	0.34	0.35	0.36	0.38	0.41	0.42
-15.0	0.20	0.19	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.17	0.22

SIS-12 土中傾度管變位量歷時曲線圖

