台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測系統工作
(114/06/23)

監造單位：中鹿營造股份有限公司 設計室
承攬廠商：中鹿營造股份有限公司
協力廠商：加基工程有限公司

中華民國 114 年 06 月 24 日

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

			頁次
		安全監測結果說明	I
圖	1	安全監測系統配置圖	1
表	1	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	2
表	2	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	3
表	3	各沉陷觀測點之高程與累積沉陷量	4
圖	2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	5
圖	3	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	6
圖	4	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	7
圖	5	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	8
圖	6	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	9
圖	7	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	10
圖	8	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係	11
表	4	TI-1 鄰房傾斜計量測記錄	12
表	5	TI-2 鄰房傾斜計量測記錄	13
表	6	TI-3 鄰房傾斜計量測記錄	14
表	7	TI-4 鄰房傾斜計量測記錄	15
表	8	TI-5 鄰房傾斜計量測記錄	16
表	9	水位觀測井量測紀錄	17
表	10	SIS-1 傾斜管量測紀錄	18
圖	9	各施工階段的SIS-1傾斜管變位與深度之關係	19
表	11	SIS-2 傾斜管量測紀錄	20
圖	10	各施工階段的SIS-2傾斜管變位與深度之關係	21
表	12	SIS-3 傾斜管量測紀錄	22
圖	11	各施工階段的SIS-3傾斜管變位與深度之關係	23
表	13	SIS-4 傾斜管量測紀錄	24
圖	12	各施工階段的SIS-4傾斜管變位與深度之關係	25
表	14	SIS-5 傾斜管量測紀錄	26
圖	13	各施工階段的SIS-5傾斜管變位與深度之關係	27

中鹿營造股份有限公司

台灣日東電工高雄第4工廠新建工程

安全監測工作

目錄

表 15 SIS-6 傾斜管量測紀錄 ---------- 28
圖 14 各施工階段的SIS-6傾斜管變位與深度之關係 ---------- 29
表 16 SIS-7 傾斜管量測紀錄 ---------- 30
圖 15 各施工階段的SIS-7傾斜管變位與深度之關係 ---------- 31
表 17 SIS-8 傾斜管量測紀錄 ---------- 32
圖 16 各施工階段的SIS-8傾斜管變位與深度之關係 ---------- 33
表 18 SIS-9 傾斜管量測紀錄 ---------- 34
圖 17 各施工階段的SIS-9傾斜管變位與深度之關係 ---------- 35
表 19 SIS-10 傾斜管量測紀錄 ---------- 36
圖 18 各施工階段的SIS-10傾斜管變位與深度之關係 ---------- 37
表 20 SIS-11 傾斜管量測紀錄 ---------- 41
圖 19 各施工階段的SIS-11傾斜管變位與深度之關係 ---------- 42


安全監測工作說明-114 年 06 月 23 日報告

一、綜合分析說明：

1. 沉陷觀測釘在 114/06/23 量測時微量增加，測值已超過「行動值」，因沉陷觀測釘(S14~S26)有重車行駛、鄰近其他工地抽水及工地抽水導致測值微量變化，沉陷觀測釘(S61~S70）有微量變化，可能是開挖及工地抽水導致測值有微量變化。鄰房傾斜計在 114/06/23 量測時無明顯變化，測值未超過「警戒值」。
2. 水位觀測井在觀測期間 114/06/23 量測時微量增加，測值已超過「警戒值」，研判因鄰近其他工地抽水及工地抽水所導致水位變化過大。
3. 土中傾斜管在 114/06/23 量測時有微量變化，土中傾斜管(SIS-4~ SIS-8)測值有微量變化已超過「行動值」，研判因下雨及開挖導致傾斜管變形。

AFM-A007

1

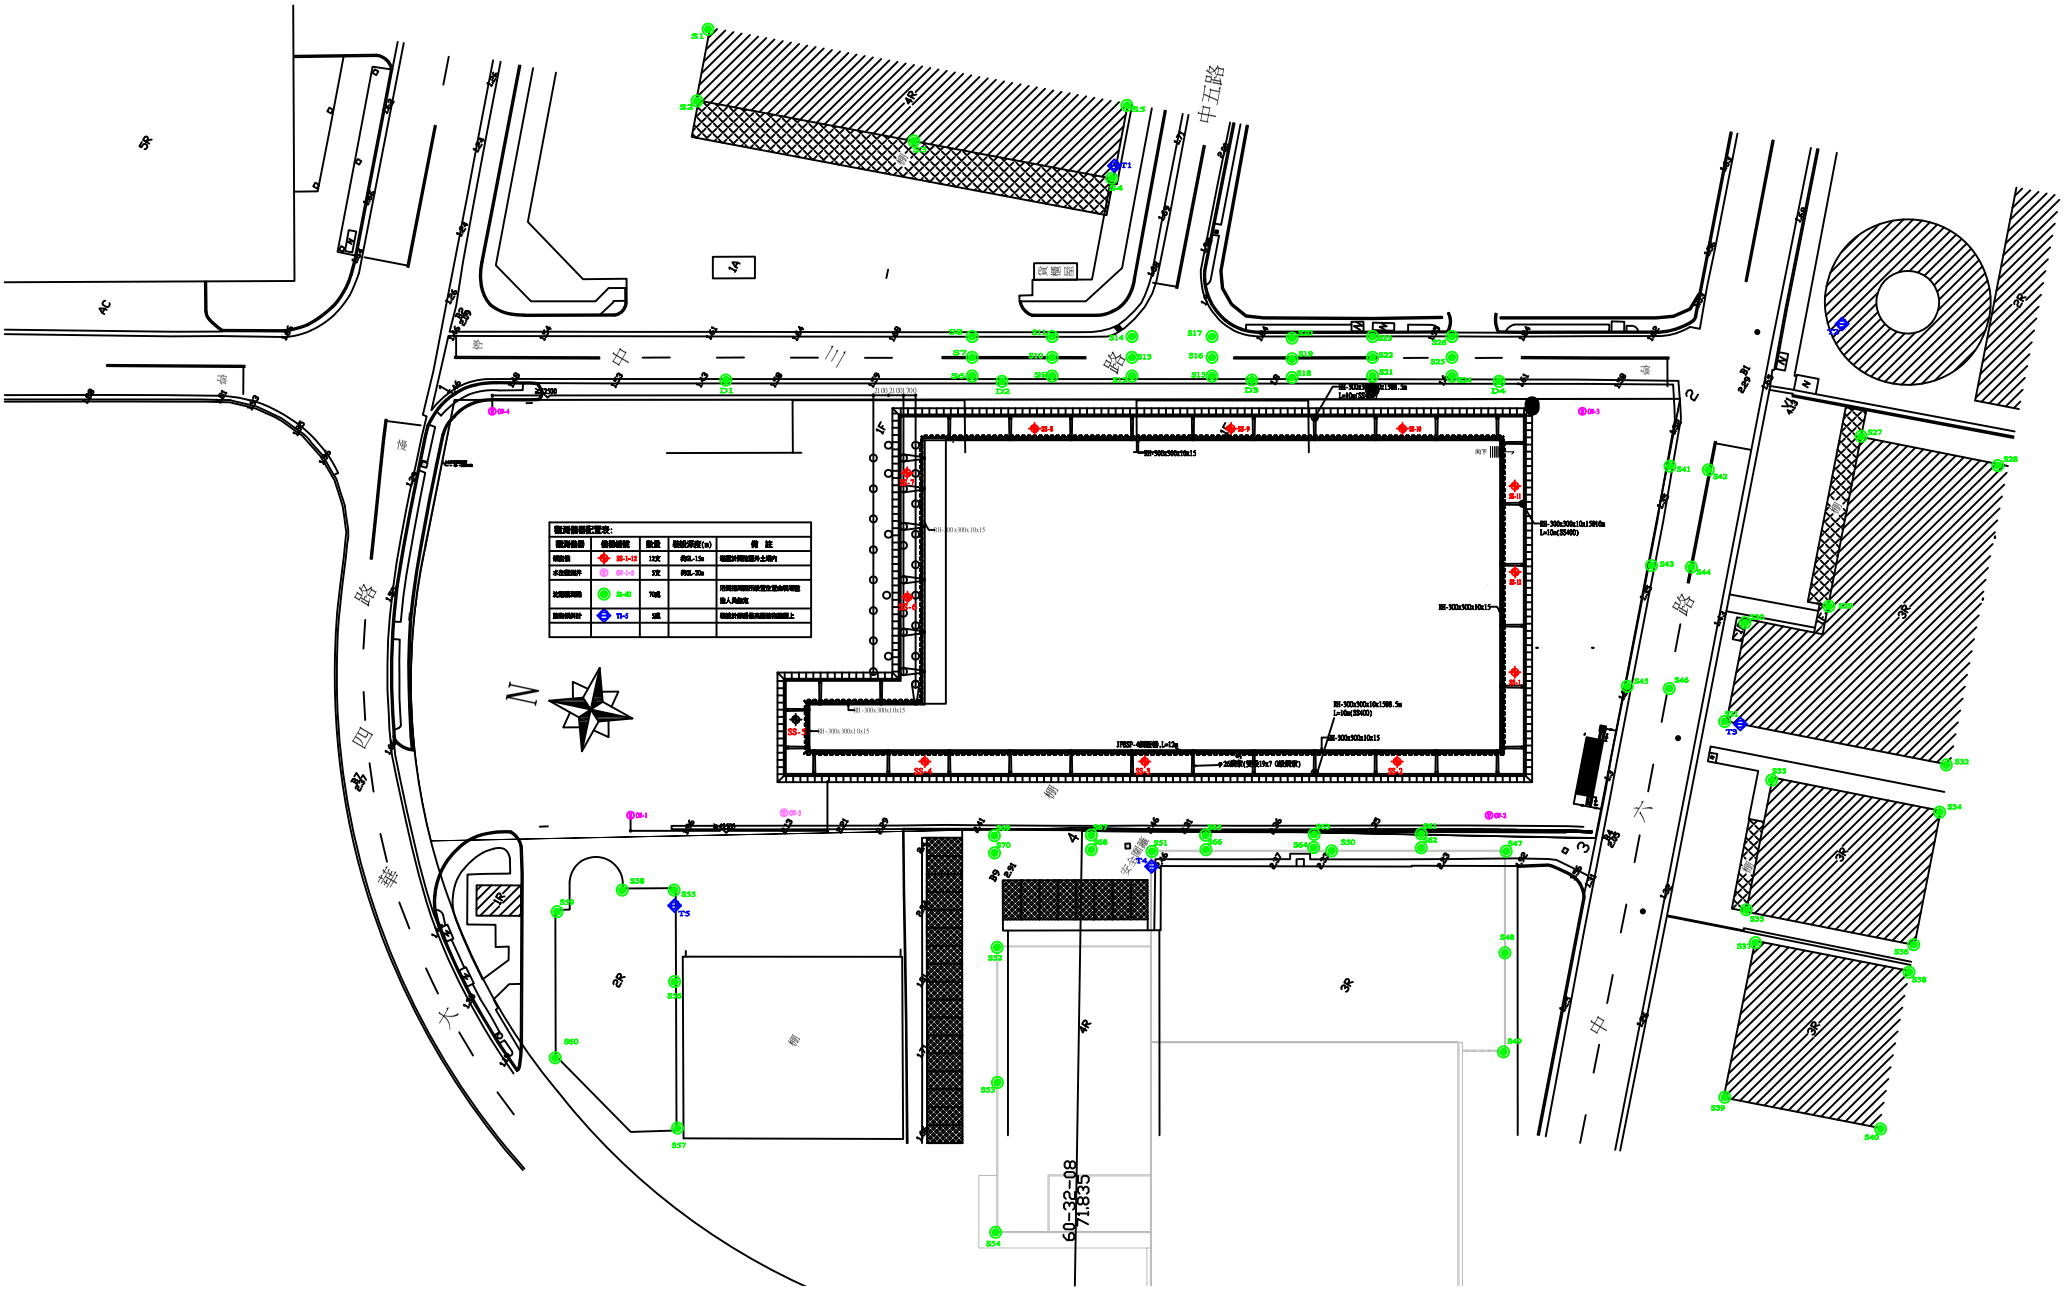

加基工程有限公司
Geodesik Engineering Co.,Lt

圖 1 安全監測系統配置圖

加基工程有限公司

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 33 ℃
監測日期： 114 年 06月23日　　濕度： 65 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S1	114.02.05	120.43	120.21	-0.20	-0.22	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S2	114.02.05	122.99	122.50	-	-0.49	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S3	114.02.05	123.47	122.67	-0.91	-0.80	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S4	114.02.05	126.06	124.65	-1.40	-1.41	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S5	114.02.05	123.80	122.55	-1.27	-1.25	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S6	114.02.05	31.36	-	-4.81	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S7	114.02.05	35.60	-	-4.25	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S8	114.02.05	32.97	29.30	-3.60	-3.67	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S9	114.02.05	30.86	25.50	-5.22	-5.36	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S10	114.02.05	36.93	32.79	-4.07	-4.14	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S11	114.02.05	38.31	34.93	-3.40	-3.38	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S12	114.02.05	27.24	22.94	-4.31	-4.30	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S13	114.02.05	30.82	27.41	-3.61	-3.41	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S14	114.02.05	32.89	29.85	-3.08	-3.04	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S15	114.02.05	19.37	15.60	-3.83	-3.77	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S16	114.02.05	26.24	22.73	-3.52	-3.51	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S17	114.02.05	28.83	25.90	-3.00	-2.93	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S18	114.02.05	18.50	14.38	-4.04	-4.12	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S19	114.02.05	25.13	21.26	-3.79	-3.87	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S20	114.02.05	26.14	22.89	-3.14	-3.25	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S21	114.02.05	18.06	14.21	-3.75	-3.85	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S22	114.02.05	22.80	19.06	-3.64	-3.74	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S23	114.02.05	23.44	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S24	114.02.13	18.85	13.77	-4.97	-5.08	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S25	114.02.05	26.99	23.26	-3.65	-3.73	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S26	114.02.05	30.27	26.93	-3.21	-3.34	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S27	114.02.05	60.35	59.59	-0.51	-0.76	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S28	114.02.05	118.63	118.18	-0.18	-0.45	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S29	114.02.05	80.33	79.50	-0.57	-0.83	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S30	114.02.05	73.26	72.47	-0.57	-0.79	3.0/4.0	GL：1.0000m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 33 ℃
監測日期： 114 年 06月23日　　濕度： 65 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m


儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S31	114.02.05	52.84	51.86	-0.73	-0.98	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S32	114.02.05	49.21	48.95	-0.03	-0.26	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S33	114.02.05	46.69	46.36	-0.09	-0.33	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S34	114.02.05	49.37	49.17	0.02	-0.20	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S35	114.02.05	49.55	49.43	0.14	-0.12	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S36	114.02.05	49.93	49.81	0.15	-0.12	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S37	114.02.05	241.74	241.76	0.15	0.02	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S38	114.02.05	248.36	248.31	0.23	-0.05	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S39	114.02.05	237.60	237.63	0.31	0.03	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S40	114.02.05	239.48	239.56	0.37	0.08	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S41	114.02.05	7.62	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S42	114.02.05	22.95	21.47	-1.25	-1.48	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S43	114.02.05	5.22	-	-0.69	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S44	114.02.05	20.00	18.83	-0.98	-1.17	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S45	114.02.05	3.41	-	-	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
S46	114.02.05	20.02	18.89	-0.90	-1.13	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S47	114.02.05	132.71	132.40	-0.06	-0.31	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S48	114.02.05	83.77	83.65	0.16	-0.12	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S49	114.02.05	135.35	135.33	0.27	-0.02	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S50	114.02.05	104.44	104.26	0.10	-0.18	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S51	114.02.05	115.32	115.02	-0.01	-0.30	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S52	114.02.05	109.36	108.15	-0.76	-1.21	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S53	114.02.05	104.23	103.41	-0.48	-0.82	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S54	114.02.05	104.19	103.67	-0.12	-0.52	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S55	114.02.05	64.38	63.51	-0.19	-0.87	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S56	114.02.05	153.44	152.96	0.13	-0.48	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S57	114.02.05	121.20	120.93	0.34	-0.27	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S58	114.02.05	94.94	94.11	-0.11	-0.83	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S59	114.02.05	69.34	68.68	0.05	-0.66	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S60	114.02.05	61.36	61.05	0.43	-0.31	3.0/4.0	GL：1.0000m	

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--沉陷觀測釘


工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 33 ℃
監測日期： 114 年 06月23日　　濕度： 65 %
觀測儀器： 沉陷觀測釘　　測讀儀器編號： Leica 250
計算公式： 量測高程-初始高程=沉陷量　　參考水準點編號： GL：1.0000m

儀器編號	裝設日期	初始高程 (cm)	量測高程 (cm)	前期沉陷量 (cm)	沉陷量 (cm)	警戒值/ 行動值(cm)	參考基準點編號	備註
S61	114.05.02	78.98	77.77	-0.84	-1.21	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S62	114.05.02	89.43	88.29	-0.78	-1.14	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S63	114.05.02	94.40	92.89	-1.27	-1.51	3.0/4.1	GL：1.0000m	
S64	114.05.02	97.38	96.17	-0.90	-1.21	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S65	114.05.02	89.29	87.68	-1.28	-1.61	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S66	114.05.02	92.12	90.74	-1.12	-1.38	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S67	114.05.02	91.31	89.14	-1.86	-2.17	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S68	114.05.02	93.19	91.26	-1.62	-1.93	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S69	114.05.02	82.99	80.49	-2.16	-2.50	3.0/4.0	GL：1.0000m	
S70	114.05.02	84.97	82.68	-1.94	-2.29	3.0/4.0	GL：1.0000m	
D1	114.05.16	22.89	22.55	-0.39	-0.34	3.0/4.0	GL：1.0000m	
D2	114.05.16	26.81	-	-1.35	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋
D3	114.05.16	15.43	14.44	-0.92	-0.99	3.0/4.0	GL：1.0000m	
D4	114.05.16	18.84	-	-1.41	-	3.0/4.0	GL：1.0000m	車輛阻擋


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

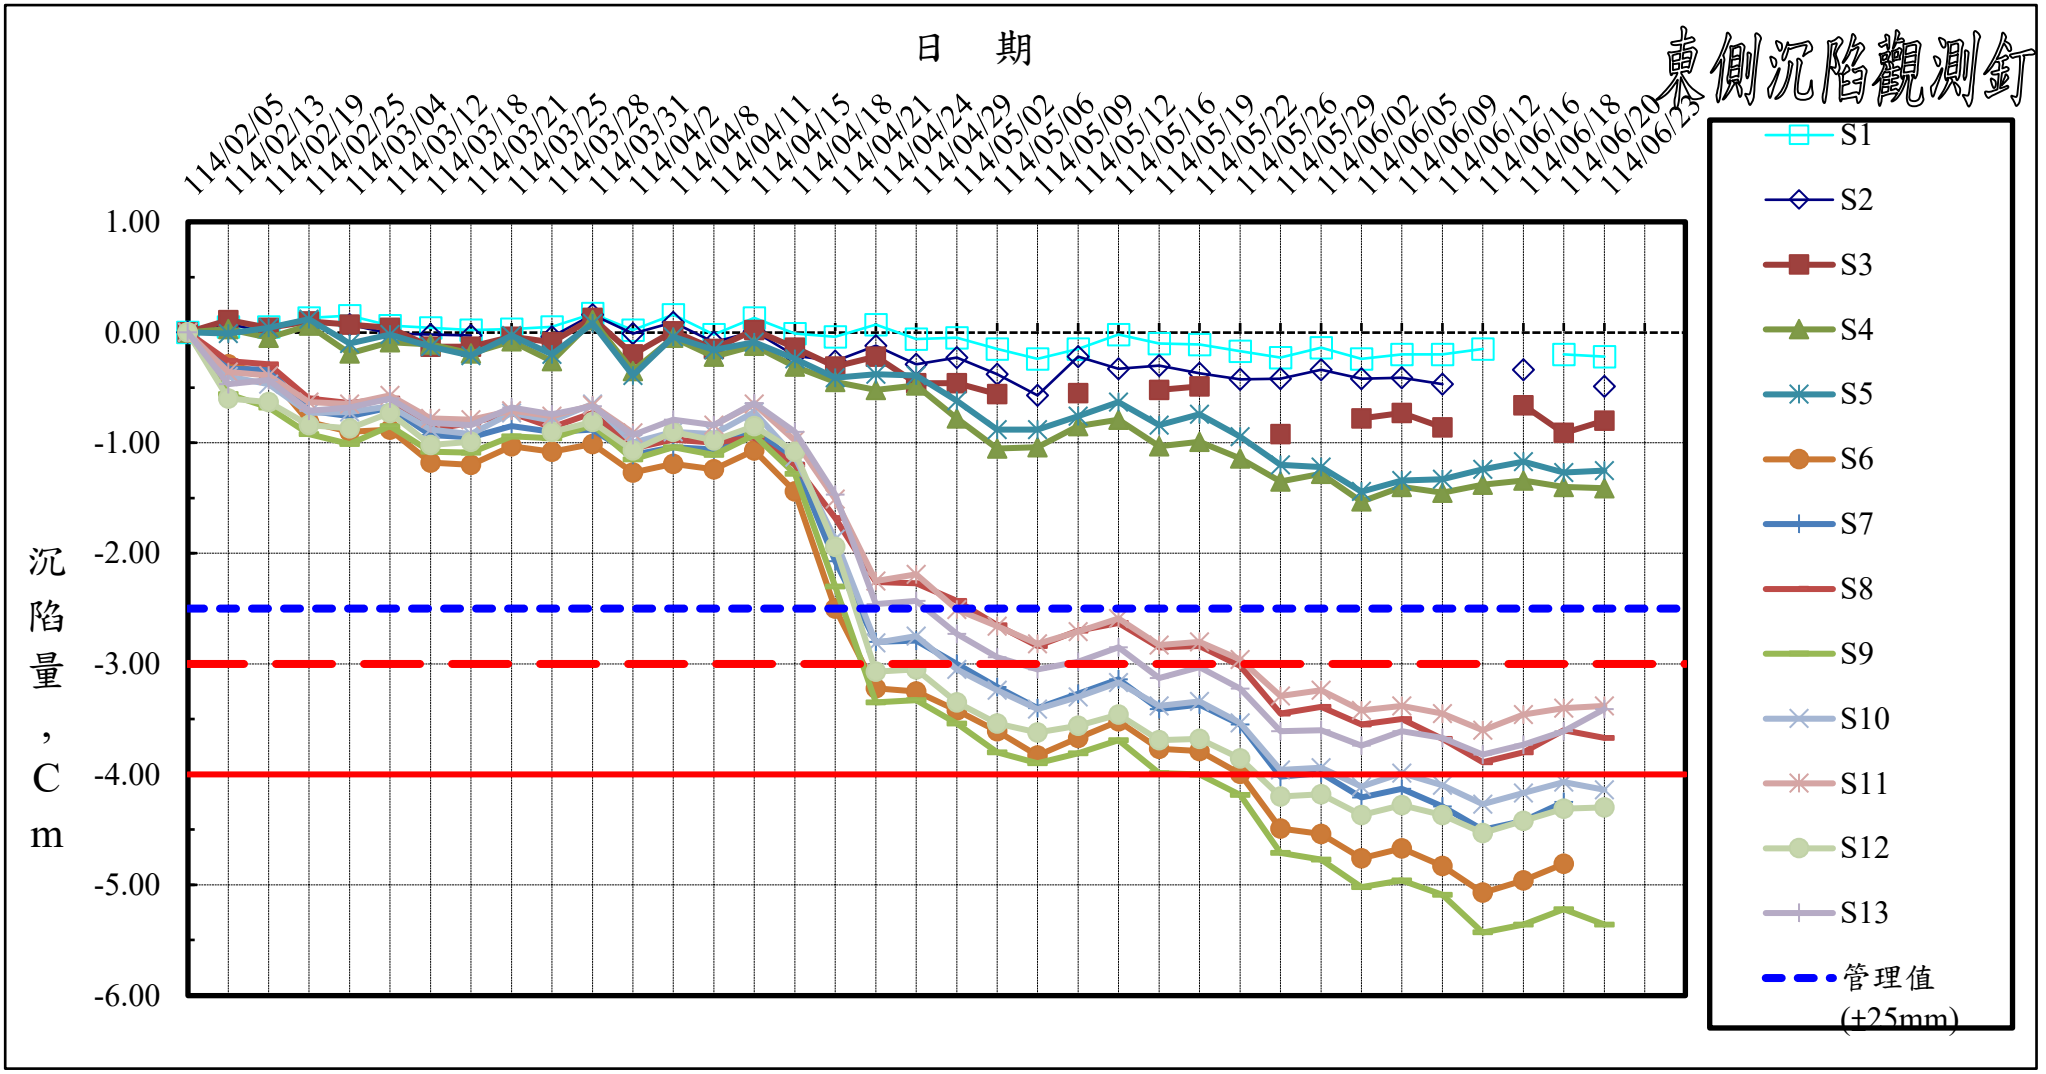


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

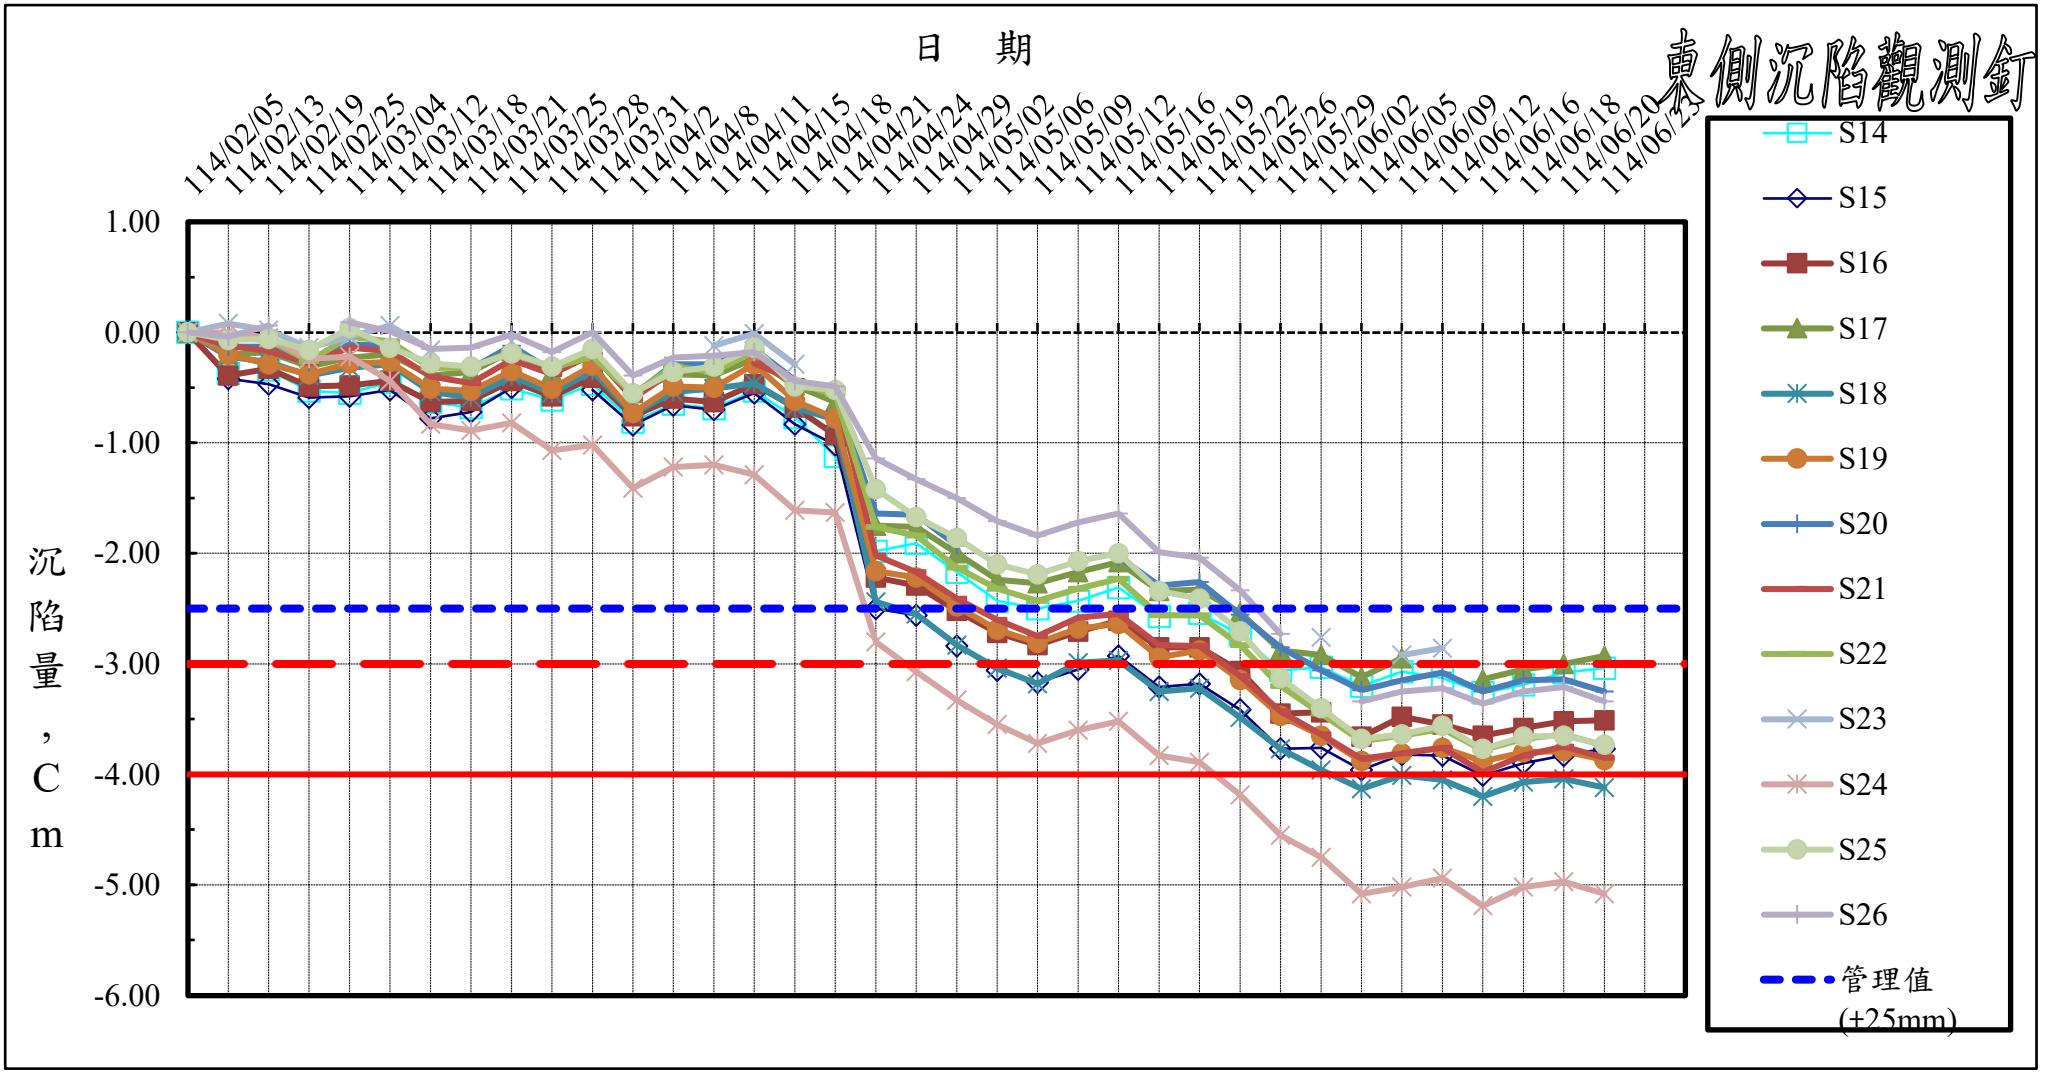


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

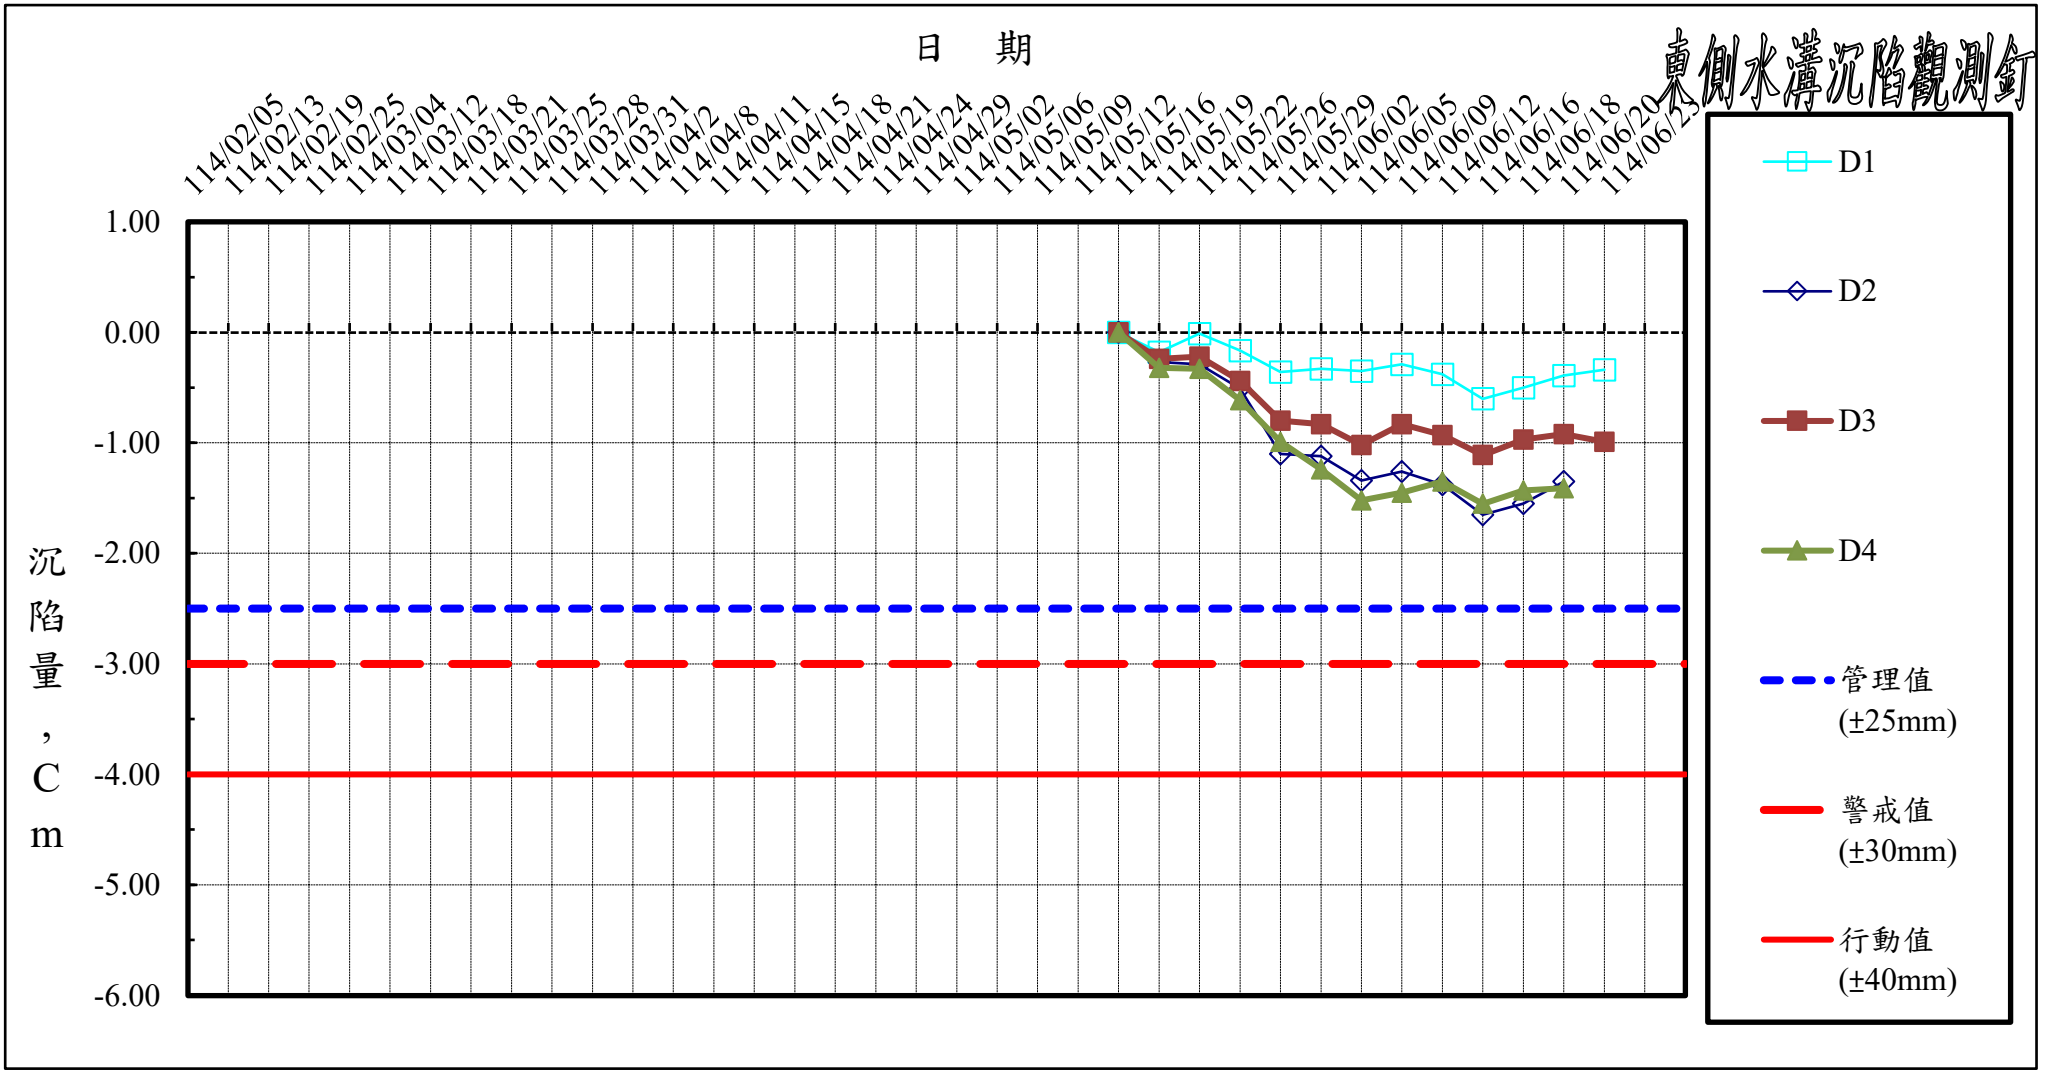


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

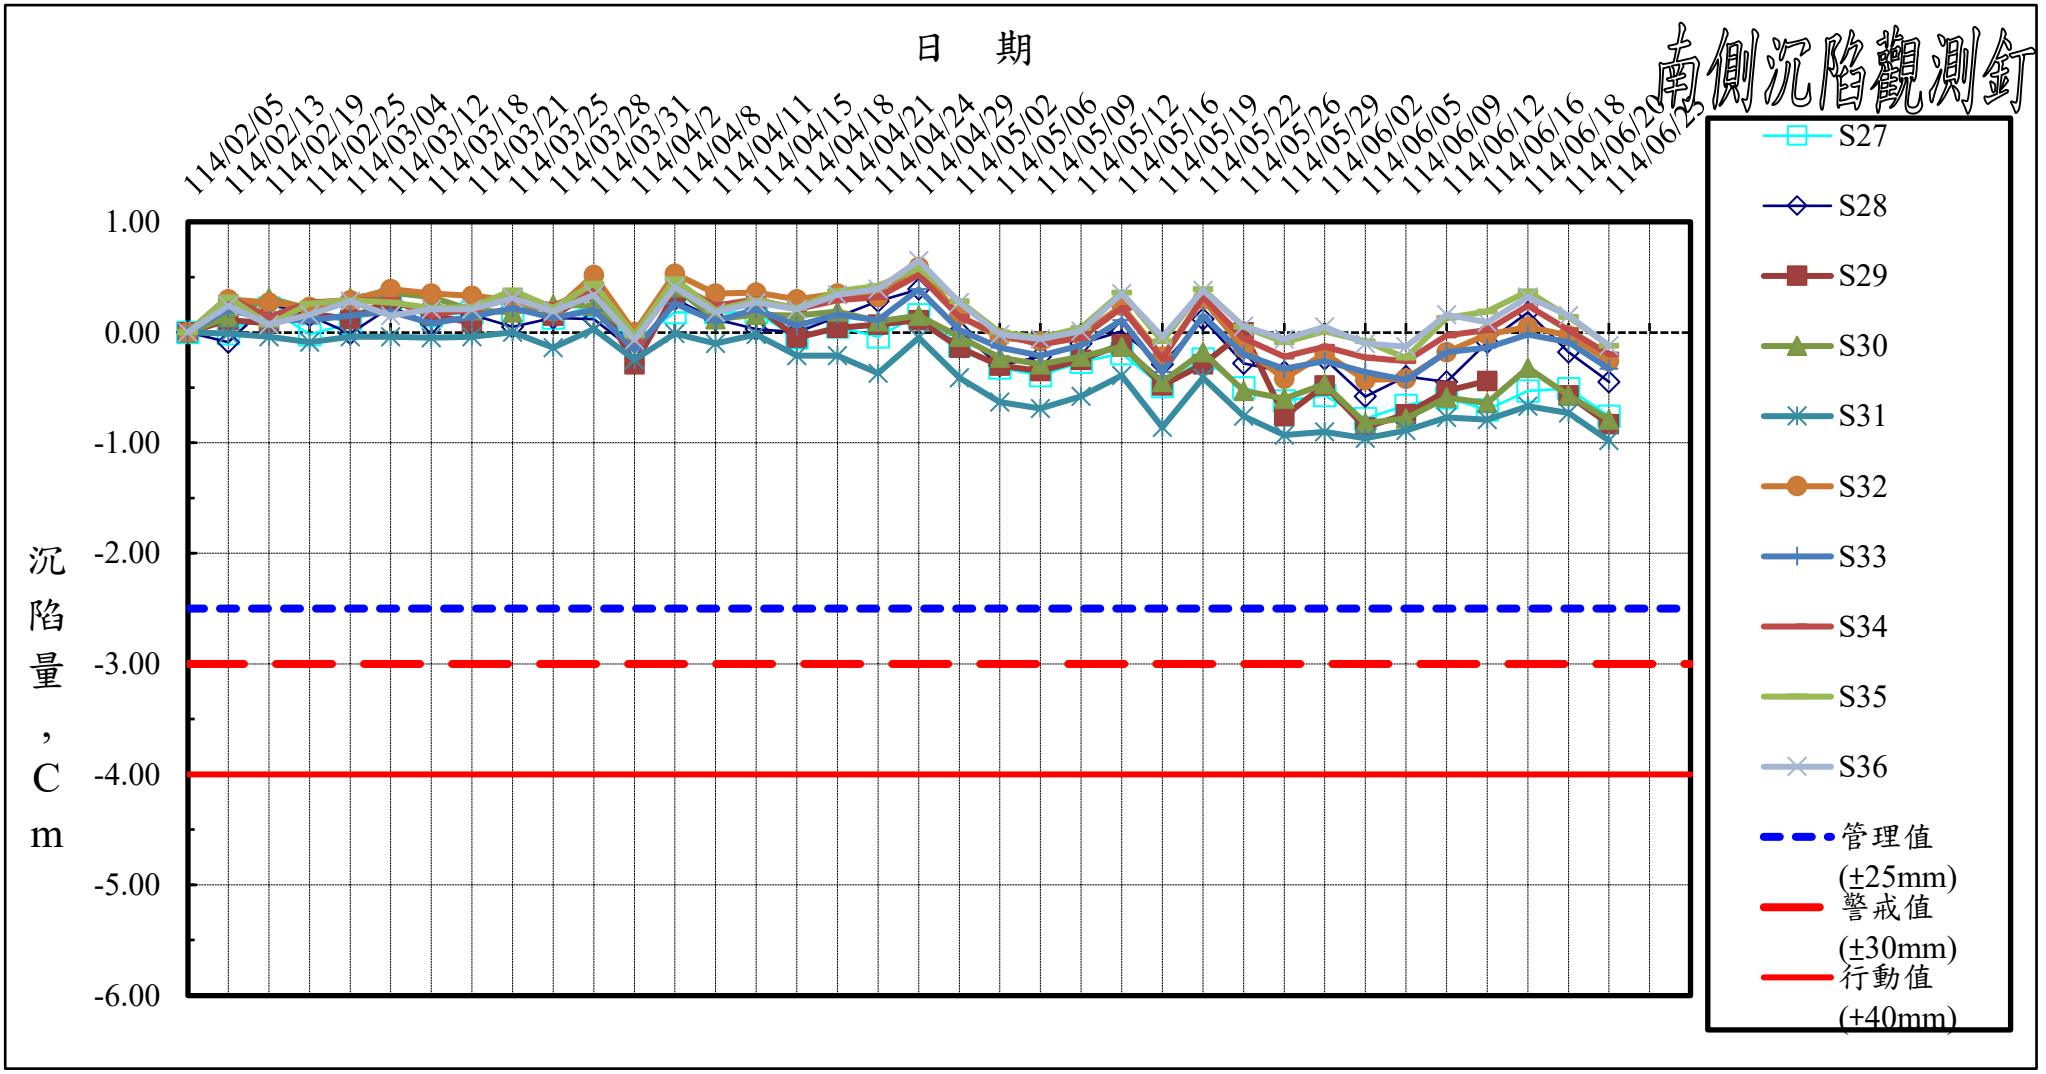


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

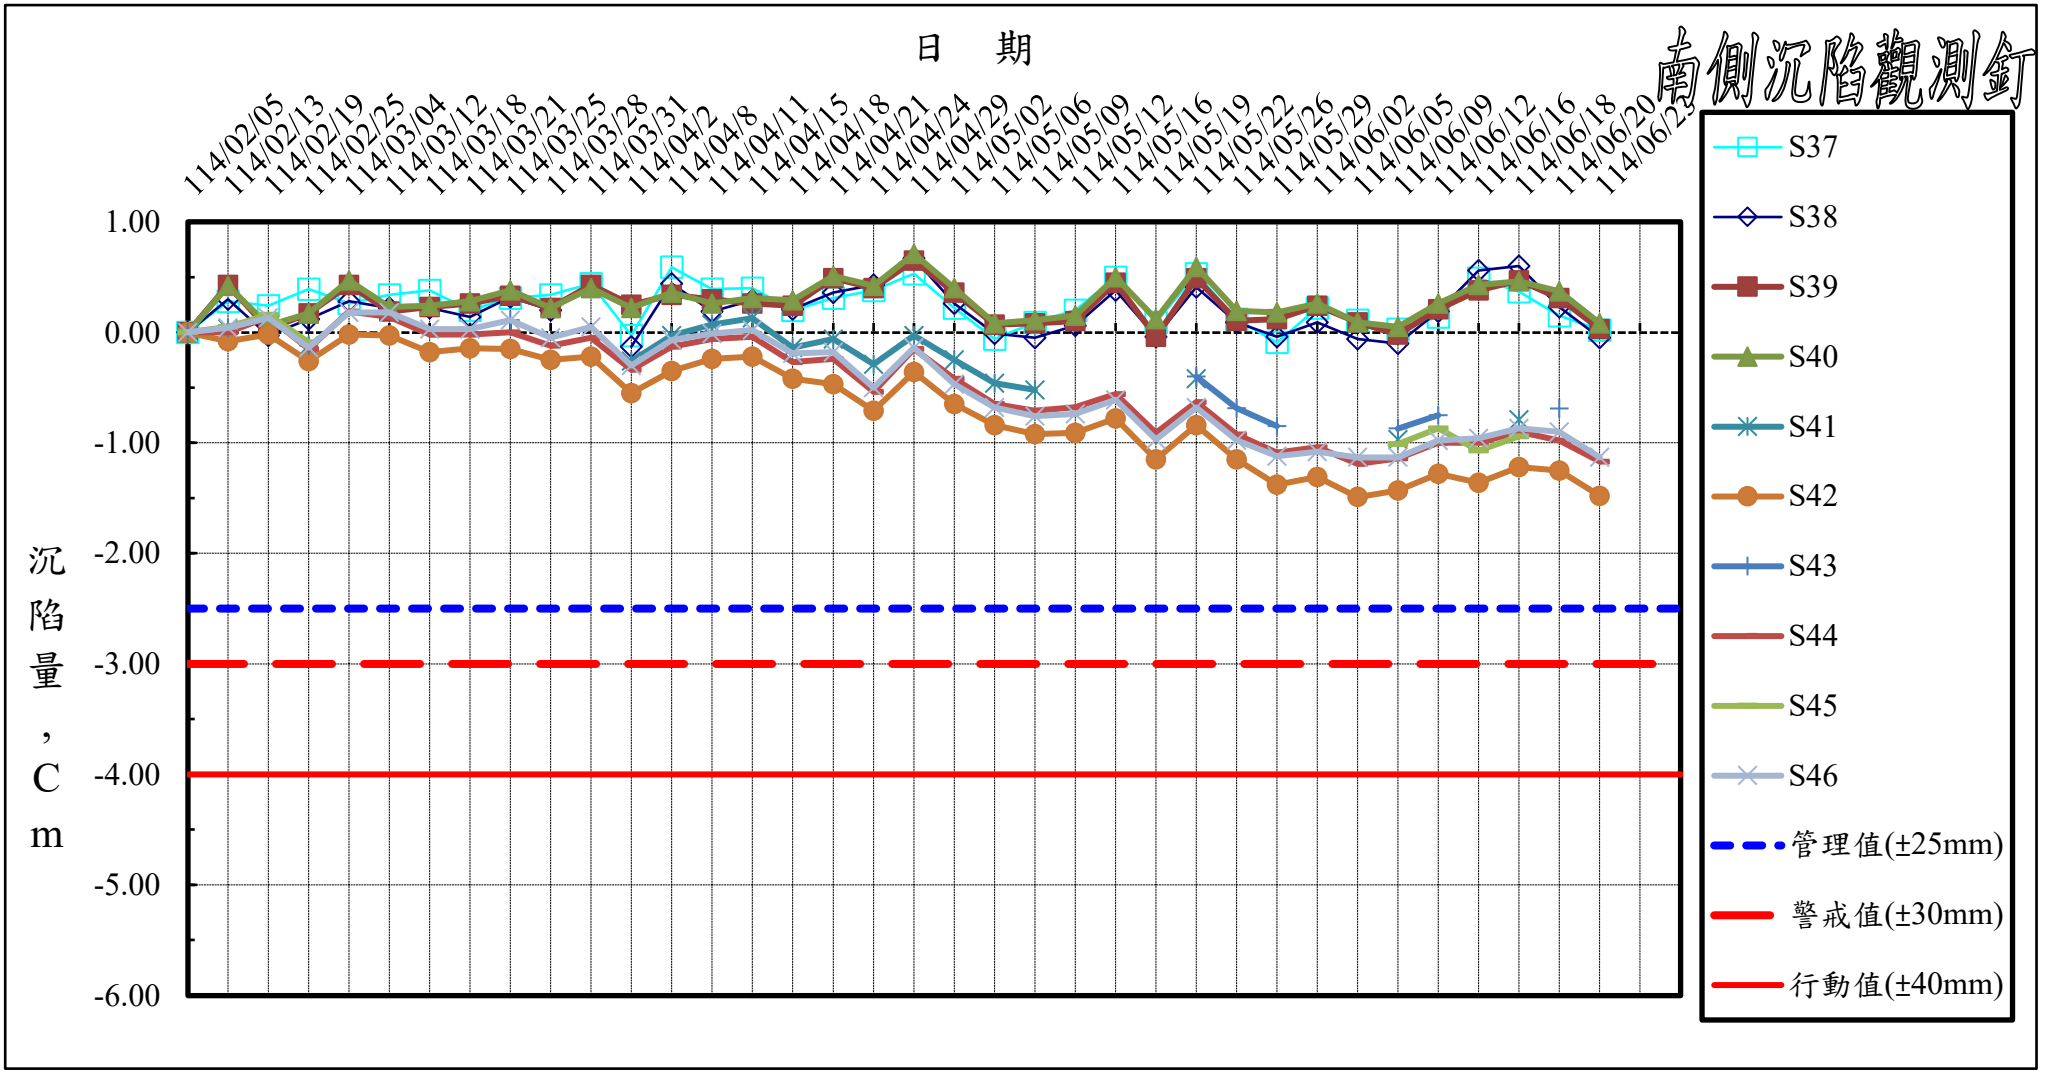

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

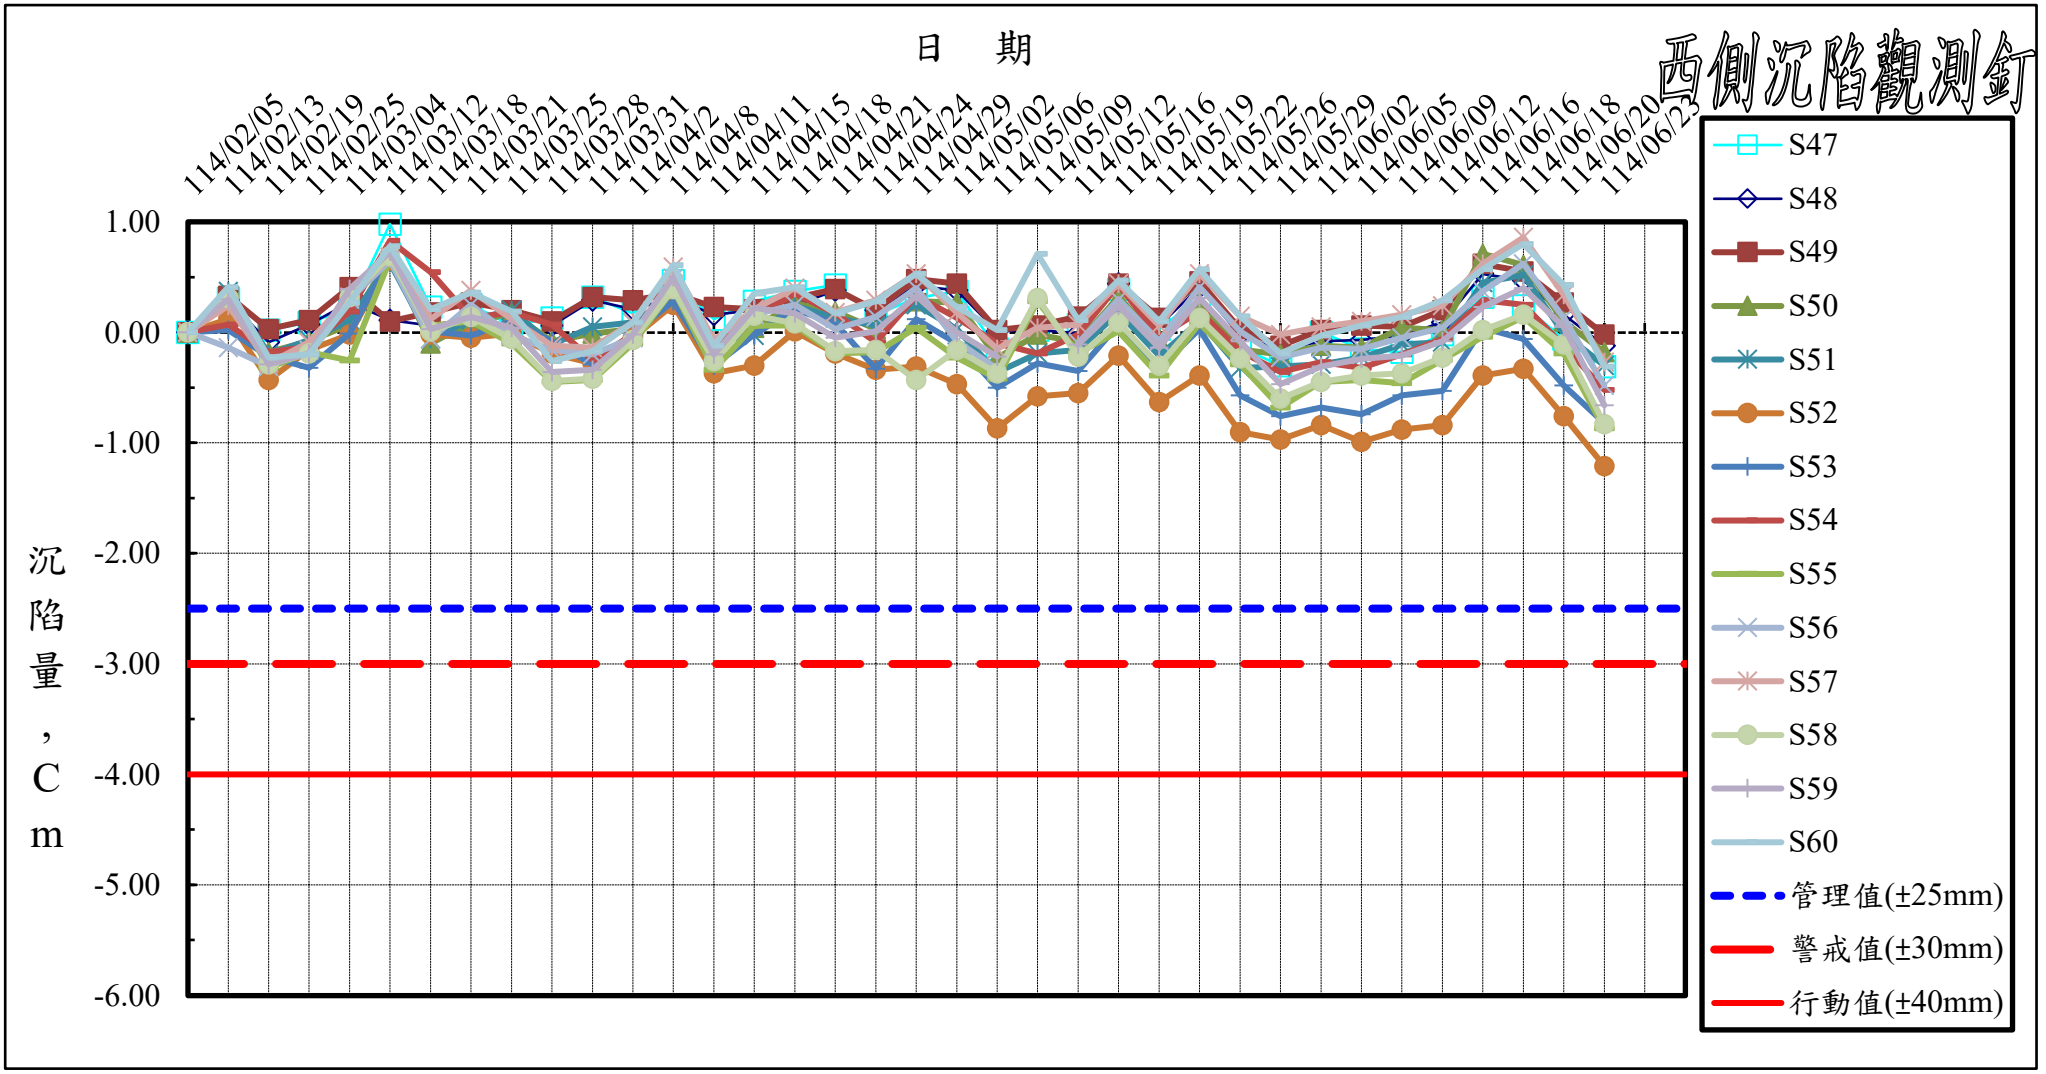

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
沉陷觀測釘歷時曲線圖

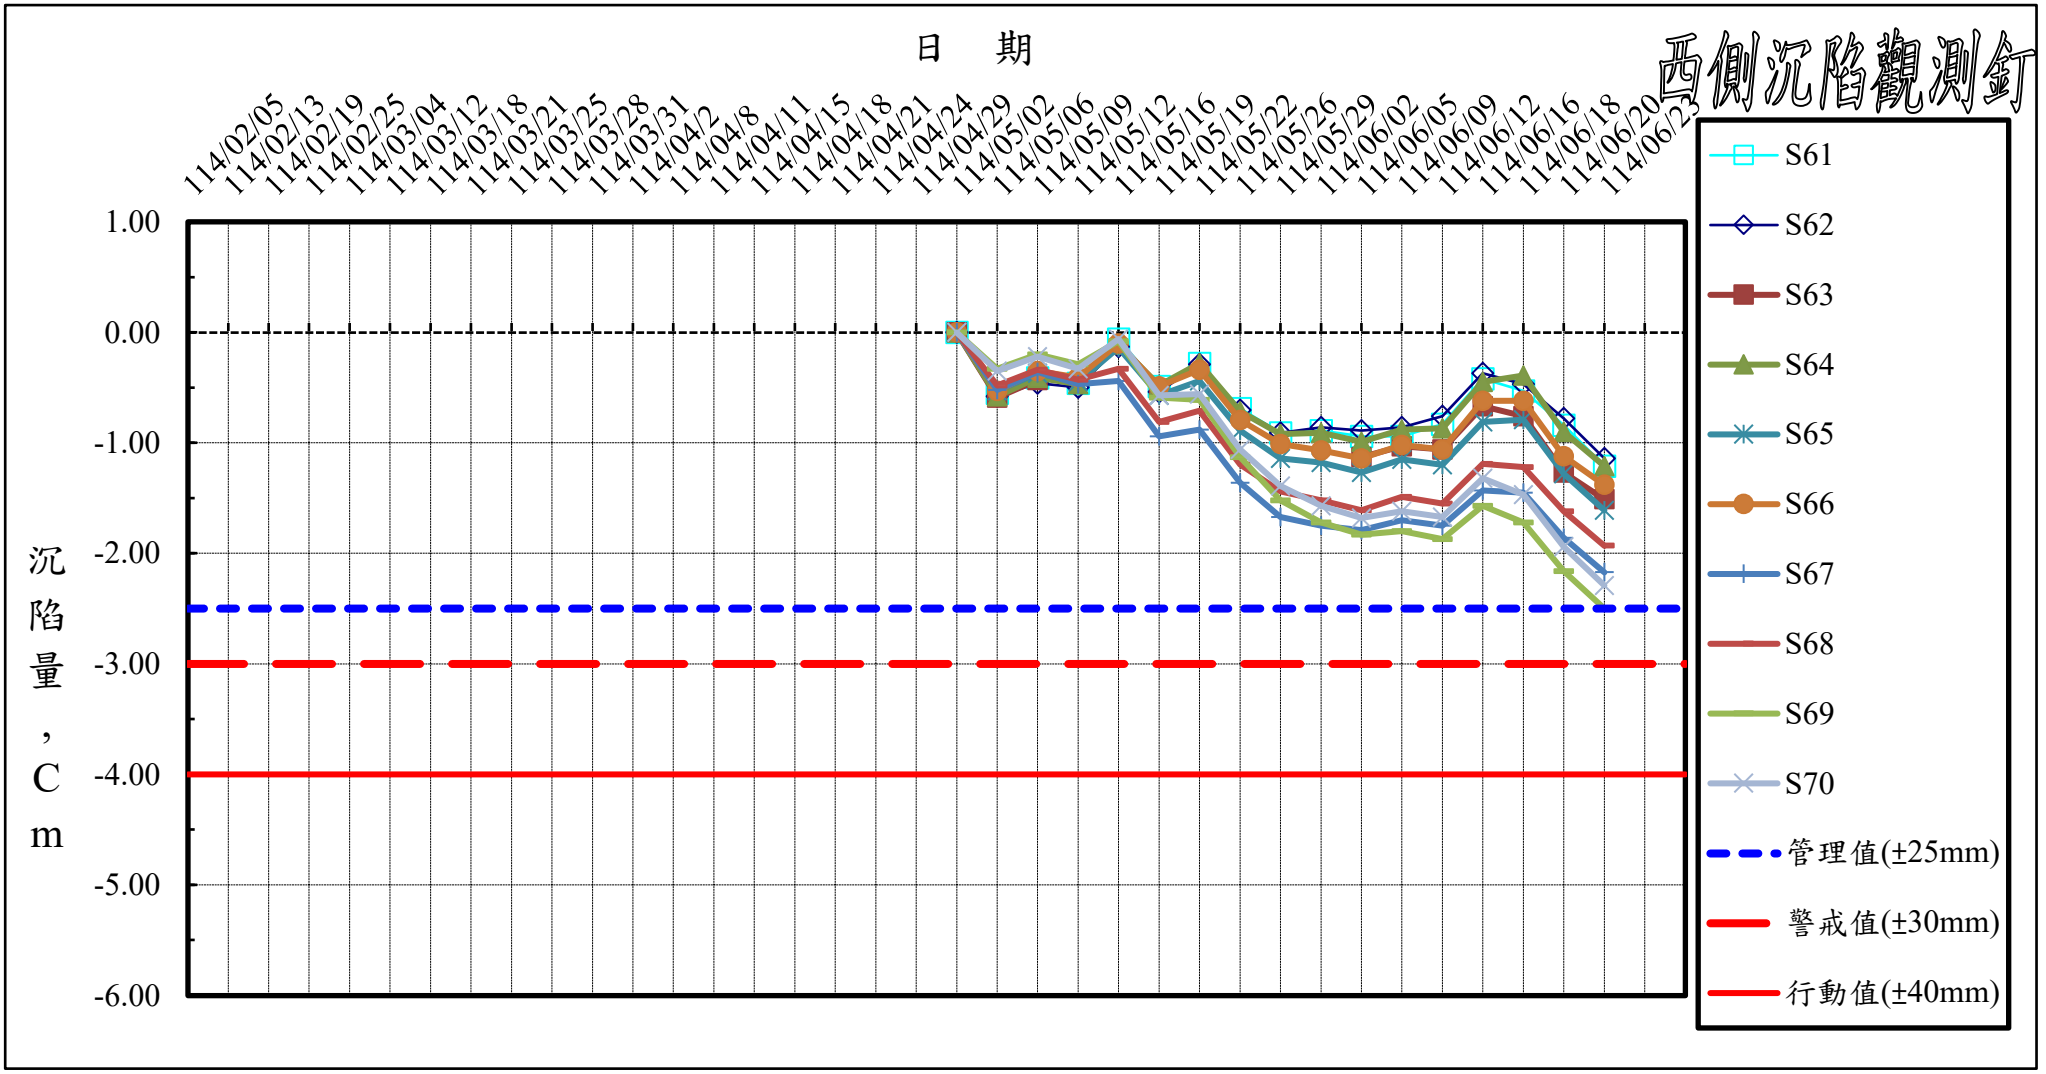


中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-1鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 06月 23日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-1)

天氣： 晴
溫度： 33 ℃
濕度： 65 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	338	-667.0	初始值		69	-65	134.0	初始值	
114/5/22	10:00	-286	363	-649.0	74.3	1/2778	110	-32	142.0	33.0	*註
114/5/26	10:00	-287	366	-653.0	57.8	1/3571	110	-31	141.0	28.9	*註
114/5/29	10:00	-316	333	-649.0	74.3	1/2778	82	-68	150.0	66.0	1/3125
114/6/2	10:00	-321	329	-650.0	70.1	1/2941	77	-73	150.0	66.0	1/3125
114/6/5	10:00	-287	368	-655.0	49.5	1/4167	107	-28	135.0	4.1	*註
114/6/9	10:00	-296	360	-656.0	45.4	1/4545	100	-36	136.0	8.3	*註
114/6/12	10:00	-291	361	-652.0	61.9	1/3333	104	-36	140.0	24.8	*註
114/6/16	10:00	-294	359	-653.0	57.8	1/3571	102	-41	143.0	37.1	*註
114/6/18	10:00	-293	359	-652.0	61.9	1/3333	102	-38	140.0	24.8	*註
114/6/20	10:00	-316	337	-653.0	57.8	1/3571	87	-66	153.0	78.4	1/2632
114/6/23	10:00	-317	335	-652.0	61.9	1/3333	83	-70	153.0	78.4	1/2632

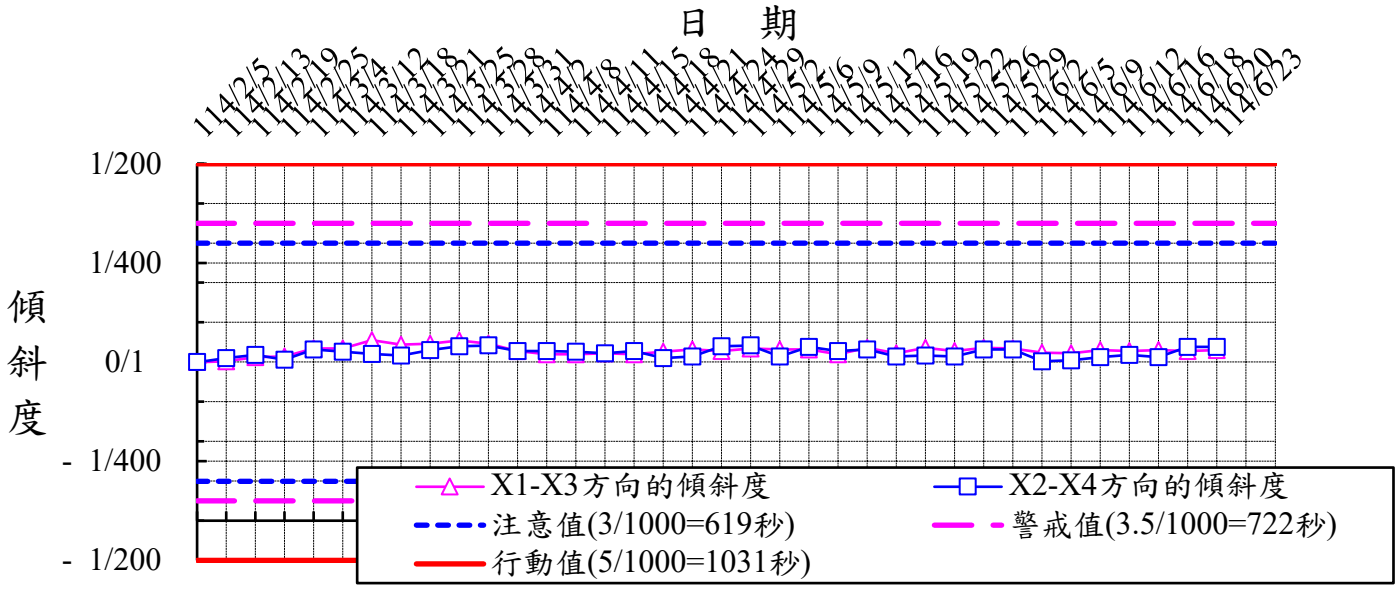

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




【結構物】
【開挖側】

中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-2鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 06月 23日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-2)

天氣： 晴
溫度： 33 ℃
濕度： 65 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	61	-52	113.0	初始值		185	-181	366.0	初始值	
114/5/22	10:00	99	-22	121.0	33.0	*註	200	-127	327.0	-160.9	1/-1282
114/5/26	10:00	100	-19	119.0	24.8	*註	200	-123	323.0	-177.4	1/-1163
114/5/29	10:00	70	-52	122.0	37.1	*註	167	-152	319.0	-193.9	1/-1064
114/6/2	10:00	65	-55	120.0	28.9	*註	161	-160	321.0	-185.6	1/-1111
114/6/5	10:00	98	-17	115.0	8.3	*註	200	-122	322.0	-181.5	1/-1136
114/6/9	10:00	91	-27	118.0	20.6	*註	192	-132	324.0	-173.3	1/-1190
114/6/12	10:00	96	-22	118.0	20.6	*註	195	-127	322.0	-181.5	1/-1136
114/6/16	10:00	92	-24	116.0	12.4	*註	191	-129	320.0	-189.8	1/-1087
114/6/18	10:00	93	-26	119.0	24.8	*註	191	-129	320.0	-189.8	1/-1087
114/6/20	10:00	73	-48	121.0	33.0	*註	171	-150	321.0	-185.6	1/-1111
114/6/23	10:00	71	-51	122.0	37.1	*註	163	-151	314.0	-214.5	1/-962

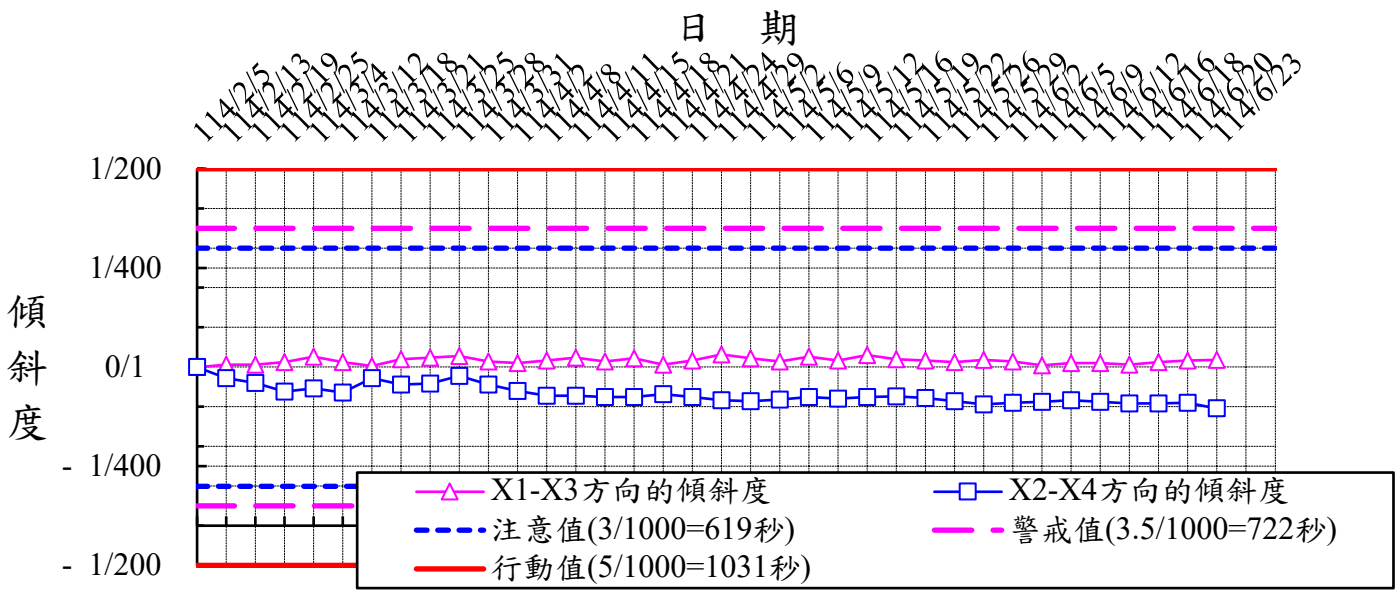

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-3鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 06月 23日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-3)

天氣： 晴
溫度： 33 ℃
濕度： 65 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	-329	336	-665.0	初始值		23	-19	42.0	初始值	
114/5/22	10:00	-292	368	-660.0	20.6	*註	49	23	26.0	-66.0	1/-3125
114/5/26	10:00	-289	370	-659.0	24.8	*註	52	25	27.0	-61.9	1/-3333
114/5/29	10:00	-319	335	-654.0	45.4	1/4545	26	-12	38.0	-16.5	*註
114/6/2	10:00	-321	329	-650.0	61.9	1/3333	21	-17	38.0	-16.5	*註
114/6/5	10:00	-283	364	-647.0	74.3	1/2778	53	24	29.0	-53.6	1/-3846
114/6/9	10:00	-293	360	-653.0	49.5	1/4167	45	16	29.0	-53.6	1/-3846
114/6/12	10:00	-293	363	-656.0	37.1	*註	46	21	25.0	-70.1	1/-2941
114/6/16	10:00	-294	361	-655.0	41.3	1/5000	45	19	26.0	-66.0	1/-3125
114/6/18	10:00	-295	360	-655.0	41.3	1/5000	45	17	28.0	-57.8	1/-3571
114/6/20	10:00	-317	340	-657.0	33.0	*註	28	-7	35.0	-28.9	*註
114/6/23	10:00	-319	339	-658.0	28.9	*註	28	-10	38.0	-16.5	*註

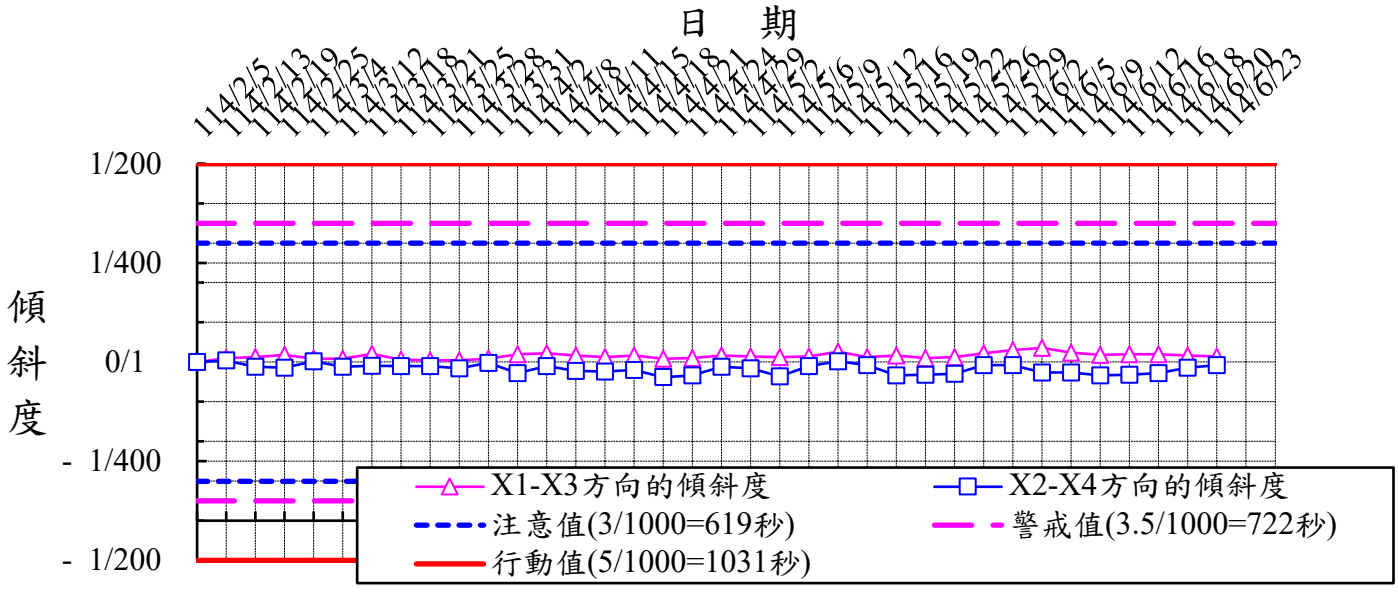

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-4鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 06月 23日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-4)

天氣： 晴
溫度： 33 ℃
濕度： 65 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	106	-98	204.0	初始值		-41	50	-91.0	初始值	
114/5/22	10:00	140	-69	209.0	20.6	*註	10	67	-57.0	140.3	1/1471
114/5/26	10:00	146	-65	211.0	28.9	*註	8	71	-63.0	115.5	1/1786
114/5/29	10:00	112	-96	208.0	16.5	*註	-25	42	-67.0	99.0	1/2083
114/6/2	10:00	109	-101	210.0	24.8	*註	-31	39	-70.0	86.6	1/2381
114/6/5	10:00	148	-65	213.0	37.1	*註	8	74	-66.0	103.1	1/2000
114/6/9	10:00	138	-73	211.0	28.9	*註	1	64	-63.0	115.5	1/1786
114/6/12	10:00	141	-71	212.0	33.0	*註	2	67	-65.0	107.3	1/1923
114/6/16	10:00	141	-72	213.0	37.1	*註	2	66	-64.0	111.4	1/1852
114/6/18	10:00	138	-74	212.0	33.0	*註	0	64	-64.0	111.4	1/1852
114/6/20	10:00	117	-96	213.0	37.1	*註	-22	45	-67.0	99.0	1/2083
114/6/23	10:00	113	-96	209.0	20.6	*註	-25	44	-69.0	90.8	1/2273

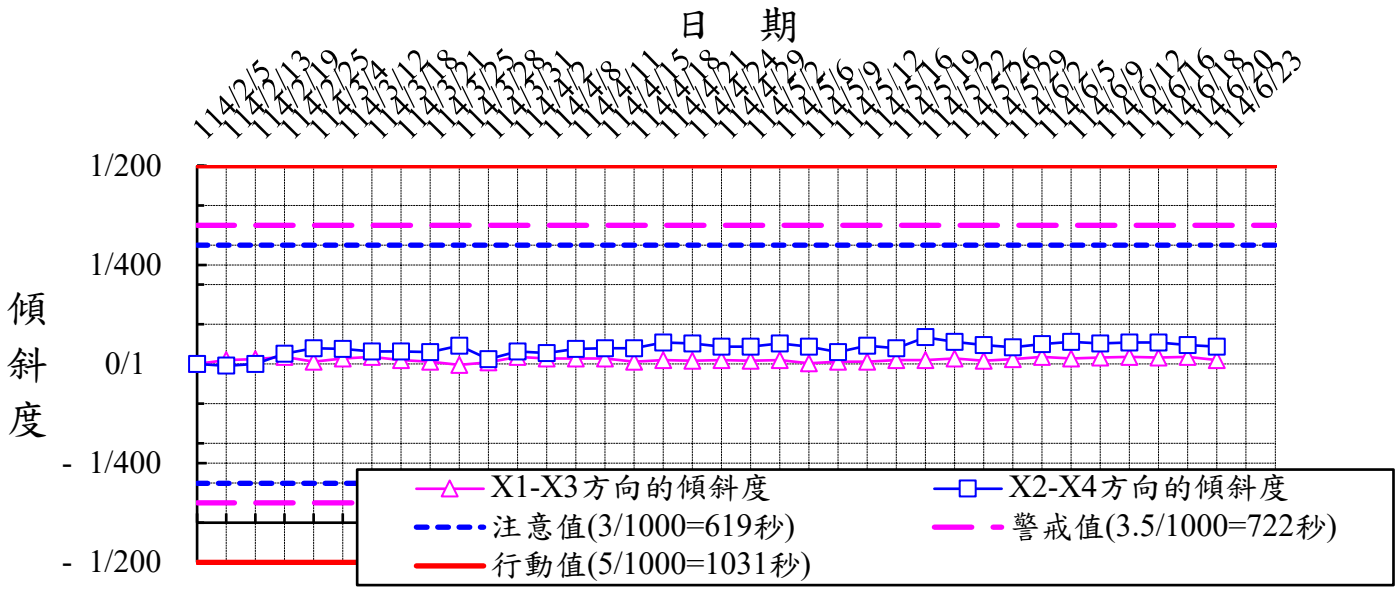

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000




中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--TI-5鄰房傾斜計量測記錄

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
承包廠商： 中鹿營造股份有限公司
監測日期： 114 年 06月 23日
觀測儀器： 鄰房傾斜計(TI-5)

天氣： 晴
溫度： 33 ℃
濕度： 65 %
測讀儀器編號： GEOSTAR / 6600D
儀器序號： 4316


日期	時間	X1 值	X3 值	(X1-X3)/2	傾斜角θ秒	傾斜度	X2 值	X4 值	(X2-X4)/2	傾斜角θ秒	傾斜度
114/2/5	15:00	73	-65	138.0	初始值		-47	55	-102.0	初始值	
114/5/22	10:00	97	-23	120.0	-74.3	1/-2778	-8	79	-87.0	61.9	1/3333
114/5/26	10:00	100	-20	120.0	-74.3	1/-2778	-5	84	-89.0	53.6	1/3846
114/5/29	10:00	69	-53	122.0	-66.0	1/-3125	-38	53	-91.0	45.4	1/4545
114/6/2	10:00	67	-58	125.0	-53.6	1/-3846	-44	52	-96.0	24.8	*註
114/6/5	10:00	102	-21	123.0	-61.9	1/-3333	-4	84	-88.0	57.8	1/3571
114/6/9	10:00	86	-23	109.0	-119.6	1/-1724	-11	75	-86.0	66.0	1/3125
114/6/12	10:00	96	-25	121.0	-70.1	1/-2941	-10	80	-90.0	49.5	1/4167
114/6/16	10:00	91	-24	115.0	-94.9	1/-2174	-10	75	-85.0	70.1	1/2941
114/6/18	10:00	92	-26	118.0	-82.5	1/-2500	-11	75	-86.0	66.0	1/3125
114/6/20	10:00	65	-43	108.0	-123.8	1/-1667	-43	56	-99.0	12.4	*註
114/6/23	10:00	64	-47	111.0	-111.4	1/-1852	-37	54	-91.0	45.4	1/4545

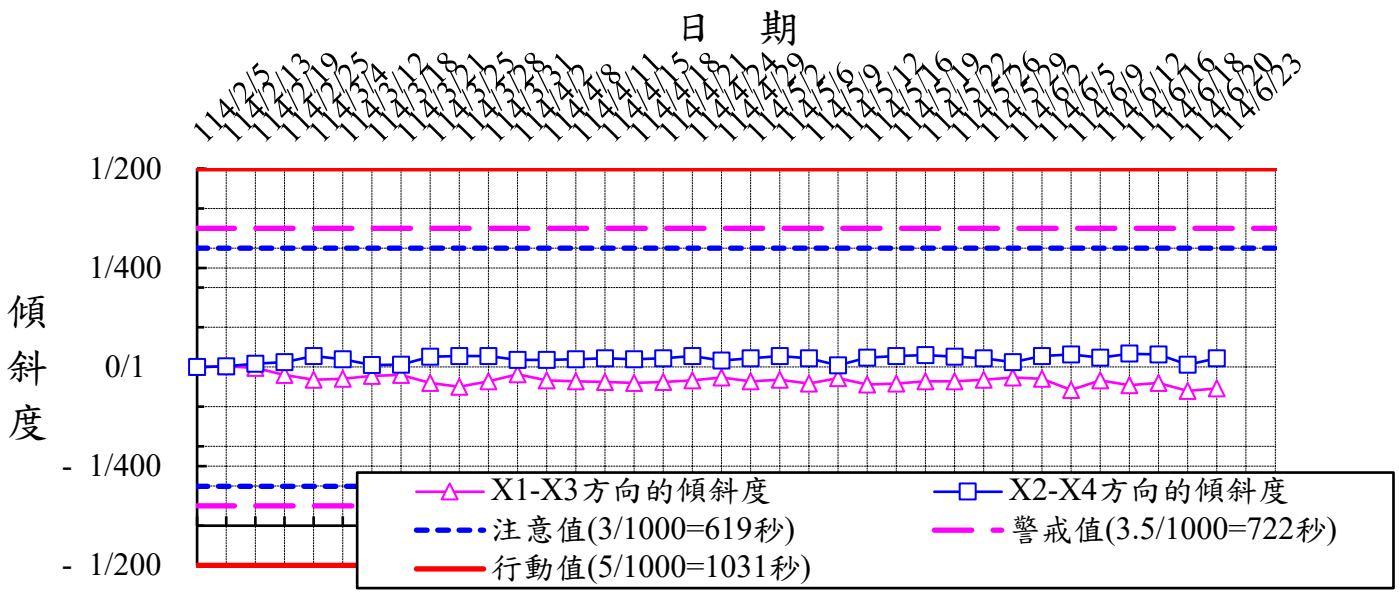

說明： 1.傾斜度方向圖示

2.傾斜度=TAN(θ)，θ為傾斜角度

註：表示量測傾斜度未超過±1/5000



中鹿營造股份有限公司
台灣日東電工高雄第4工廠新建工程
大地監測報表--水位觀測計

工程名稱： 台灣日東電工高雄第4工廠新建工程　　天氣： 晴


承包廠商： 中鹿營造股份有限公司　　溫度： 33 ℃

監測日期： 114 年 06月 23日　　濕度： 65 %

觀測儀器： 水位觀測計　　儀器型式及編號： RST Model 3001

參考水準點編號： GL:1.0000m


編號		OW1	OW2	OW3	OW4	OW5	備註
埋設日期		114/1/21	114/1/20	114/1/22	114/1/21	114/1/20	水位觀測計高程以
埋設深度，m		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	GL:1.0000m
觀測計管口高程，m		0.4310	0.3804	0.2334	0.2640	0.6687	為基準
日期	時間	地下水位面深度，GL-m					
114/2/5	15:10	-1.92	-1.90	-1.51	-2.02	-1.93	初值
114/5/16	10:10	-2.93	-3.29	-4.11	-3.19	-2.78	第一階段開挖完成
114/5/19	10:10	-2.72	-3.19	-4.05	-3.07	-2.61	第一階段開挖完成
114/5/22	10:10	-3.56	-4.36	-5.43	-3.92	-3.80	第一階段開挖完成
114/5/26	10:10	-3.60	-4.22	-5.37	-3.91	-3.73	第一階段開挖完成
114/5/29	10:10	-4.10	-4.56	-5.69	-4.45	-4.40	第二階段開挖中
114/6/2	10:10	-3.83	-4.24	-5.53	-4.29	-4.03	第二階段開挖中
114/6/5	10:10	-3.84	-4.34	-5.57	-4.37	-4.14	第二階段開挖中
114/6/9	10:10	-3.93	-4.20	-5.40	-4.24	-3.99	第二階段開挖中
114/6/12	10:10	-3.52	-3.79	-4.71	-4.04	-3.93	第二階段開挖中
114/6/16	10:10	-3.87	-3.72	-4.47	阻擋	-3.88	第二階段開挖中
114/6/18	10:10	阻擋	-4.27	-5.09	阻擋	-4.74	第二階段開挖中
114/6/20	10:10	阻擋	-4.36	-5.27	阻擋	阻擋	第二階段開挖中
114/6/23	10:10	阻擋	-4.19	-5.07	阻擋	阻擋	第二階段開挖中

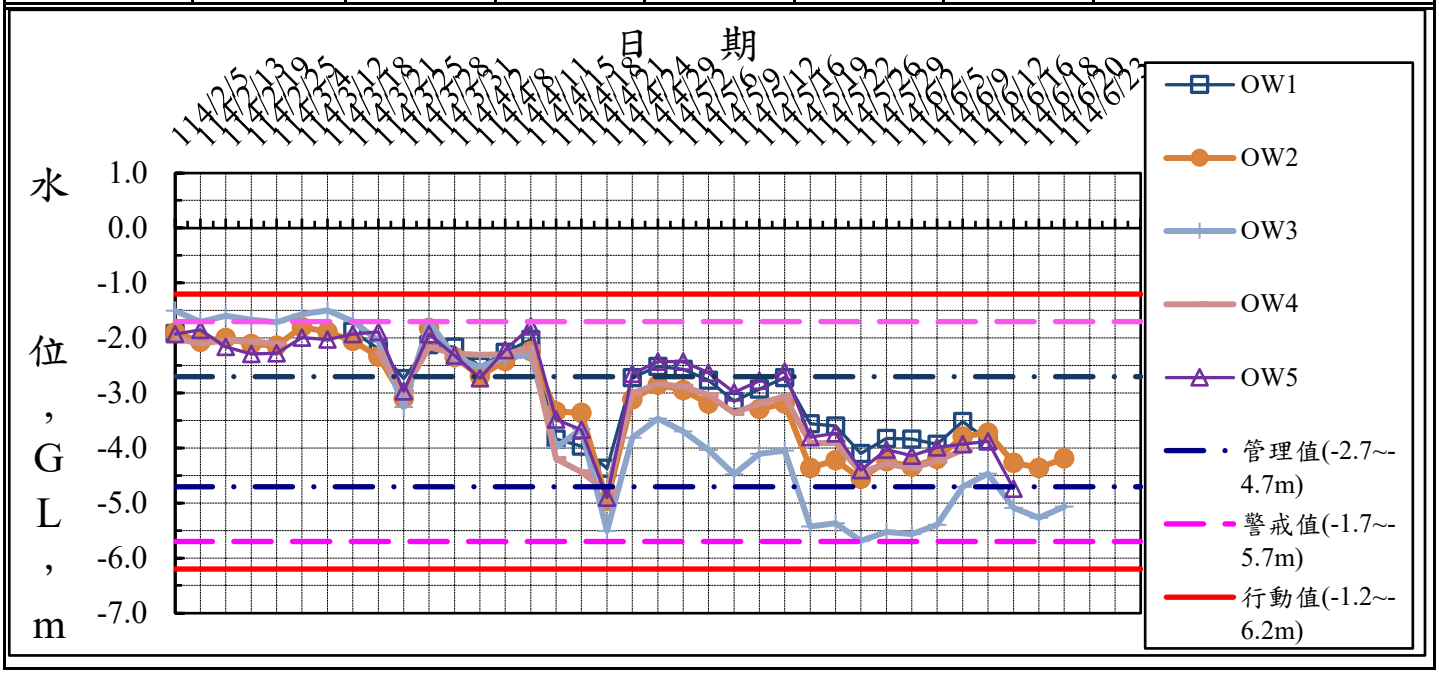

SIS-1 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	0.27	因土車出入開挖區道路重新鋪設導致無法量	-0.44	-0.09	0.02	-0.29	-0.34	-0.01	0.50	-0.08	因土方阻擋導致無法量測	3.72
-1.0	0.00	1.11		0.43	0.77	0.89	0.60	0.67	1.08	1.33	1.24		1.46
-1.5	0.00	1.24		0.78	1.01	1.41	1.15	1.26	1.48	1.84	1.80		2.10
-2.0	0.00	1.40		1.17	1.28	1.88	1.67	1.79	1.89	2.38	2.38		3.00
-2.5	0.00	1.35		1.26	1.30	1.97	1.79	1.87	2.00	2.51	2.51		3.58
-3.0	0.00	1.27		1.26	1.27	1.89	1.73	1.80	1.98	2.47	2.42		2.94
-3.5	0.00	1.24		1.30	1.27	1.89	1.75	1.82	1.99	2.47	2.40		2.46
-4.0	0.00	1.21		1.38	1.29	1.93	1.84	1.89	2.04	2.54	2.47		2.44
-4.5	0.00	1.12		1.38	1.25	1.93	1.83	1.87	1.99	2.54	2.45		2.29
-5.0	0.00	1.04		1.37	1.20	1.87	1.81	1.85	1.82	2.47	2.39		2.02
-5.5	0.00	1.00		1.36	1.18	1.84	1.80	1.83	1.81	2.43	2.36		1.99
-6.0	0.00	0.96		1.35	1.15	1.77	1.77	1.78	1.75	2.37	2.30		1.83
-6.5	0.00	0.94		1.34	1.14	1.73	1.76	1.75	1.70	2.31	2.25		1.74
-7.0	0.00	0.90		1.30	1.10	1.69	1.77	1.74	1.69	2.28	2.22		1.73
-7.5	0.00	0.84		1.21	1.02	1.56	1.69	1.63	1.56	2.12	2.09		1.63
-8.0	0.00	0.76		1.09	0.93	1.38	1.52	1.46	1.40	1.90	1.90		1.41
-8.5	0.00	0.72		1.07	0.89	1.27	1.44	1.37	1.38	1.76	1.77		1.50
-9.0	0.00	0.63		1.09	0.86	1.37	1.44	1.41	1.40	1.77	1.77		1.50
-9.5	0.00	0.55		1.05	0.80	1.37	1.40	1.39	1.36	1.73	1.73		1.41
-10.0	0.00	0.53		1.01	0.77	1.33	1.37	1.36	1.34	1.67	1.69		1.40
-10.5	0.00	0.53		0.99	0.76	1.31	1.40	1.37	1.38	1.66	1.70		1.49
-11.0	0.00	0.47		0.90	0.69	1.23	1.26	1.26	1.23	1.54	1.56		1.30
-11.5	0.00	0.43		0.75	0.59	1.00	1.06	1.03	1.02	1.28	1.32		1.08
-12.0	0.00	0.43		0.59	0.51	0.77	0.94	0.84	0.88	1.04	1.11		0.96
-12.5	0.00	0.42		0.48	0.45	0.56	0.79	0.65	0.76	0.82	0.90		0.88
-13.0	0.00	0.39		0.40	0.39	0.45	0.66	0.54	0.67	0.66	0.75		0.73
-13.5	0.00	0.34		0.34	0.34	0.44	0.54	0.48	0.51	0.56	0.63		0.56
-14.0	0.00	0.30		0.24	0.27	0.34	0.36	0.35	0.36	0.39	0.44		0.34
-14.5	0.00	0.25		0.14	0.19	0.22	0.21	0.22	0.23	0.24	0.28		0.23
-15.0	0.00	0.00		0.08	0.04	0.12	0.09	0.12	0.12	0.13	0.14		0.06


SIS-1 土中傾度管變位量歷時曲線圖

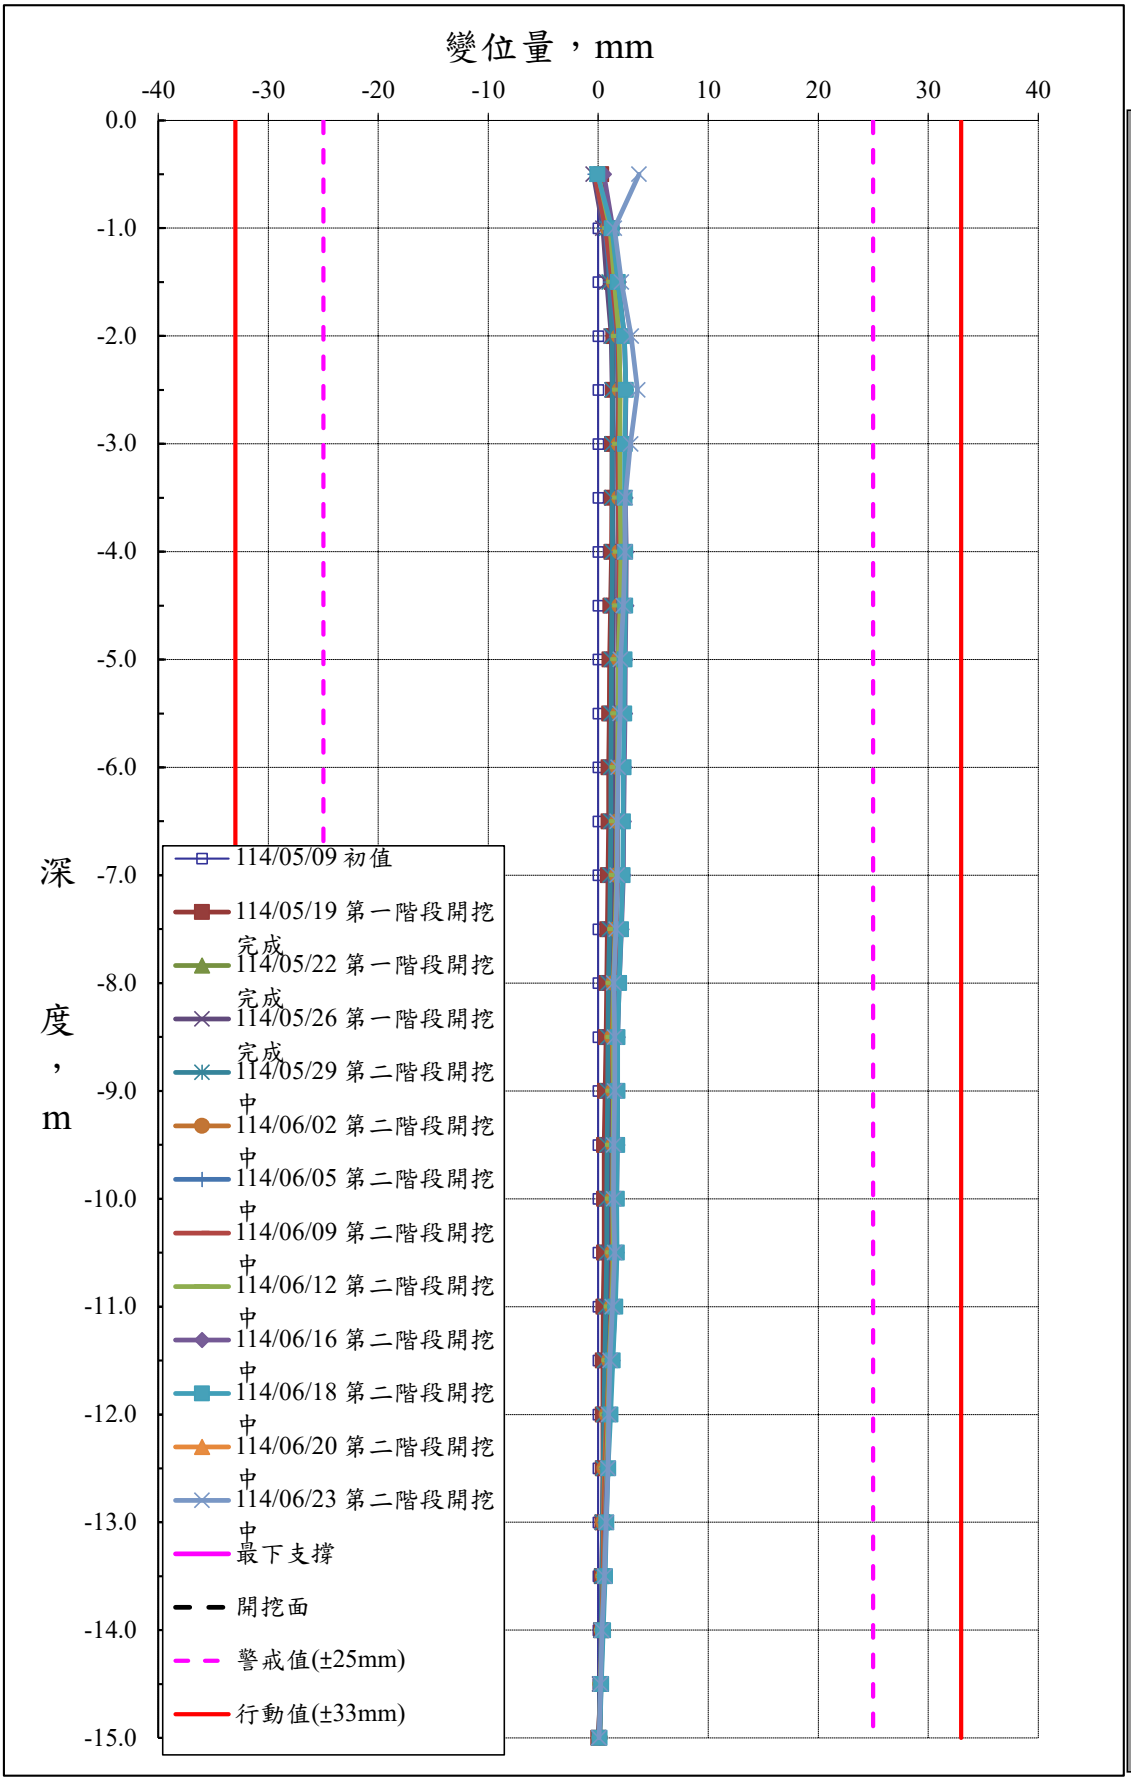

SIS-2 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	0.67	0.38	0.20	0.44	0.61	0.61	0.64	0.17	0.78	0.16	-0.30	0.54
-1.0	0.00	0.76	0.16	0.35	0.55	0.73	0.86	0.91	0.81	1.11	0.54	0.44	1.42
-1.5	0.00	0.75	0.37	0.57	0.66	1.17	1.22	1.33	1.17	1.49	1.07	0.90	1.94
-2.0	0.00	0.81	0.63	0.88	0.85	1.63	1.73	1.87	1.65	2.05	1.70	1.58	2.62
-2.5	0.00	0.81	0.74	1.06	0.94	1.84	1.93	2.12	1.82	2.27	1.93	1.86	2.82
-3.0	0.00	0.76	0.70	1.04	0.90	1.72	1.86	2.03	1.71	2.15	1.81	1.68	2.57
-3.5	0.00	0.71	0.70	1.04	0.87	1.71	1.87	2.03	1.68	2.13	1.80	1.66	2.42
-4.0	0.00	0.68	0.75	1.05	0.86	1.71	1.89	2.04	1.65	2.14	1.82	1.64	2.28
-4.5	0.00	0.61	0.74	1.02	0.81	1.68	1.87	2.00	1.59	2.08	1.81	1.59	2.15
-5.0	0.00	0.50	0.66	0.89	0.70	1.48	1.66	1.76	1.42	1.82	1.59	1.36	1.85
-5.5	0.00	0.48	0.70	0.91	0.70	1.51	1.68	1.77	1.45	1.84	1.60	1.39	1.82
-6.0	0.00	0.34	0.72	0.79	0.56	1.36	1.44	1.53	1.31	1.57	1.39	1.24	1.58
-6.5	0.00	0.32	0.67	0.75	0.53	1.23	1.33	1.40	1.18	1.40	1.23	1.08	1.40
-7.0	0.00	0.30	0.71	0.78	0.54	1.23	1.33	1.39	1.17	1.37	1.24	1.10	1.38
-7.5	0.00	0.18	0.67	0.73	0.46	1.14	1.18	1.20	1.22	1.18	1.06	1.08	1.29
-8.0	0.00	0.26	0.65	0.80	0.53	1.17	1.25	1.30	1.19	1.24	1.12	1.11	1.36
-8.5	0.00	0.25	0.64	0.80	0.53	1.14	1.21	1.26	1.13	1.19	1.08	1.04	1.34
-9.0	0.00	0.25	0.65	0.81	0.53	1.14	1.24	1.28	1.16	1.18	1.10	1.08	1.37
-9.5	0.00	0.23	0.61	0.79	0.51	1.10	1.20	1.22	1.18	1.12	1.07	1.10	1.38
-10.0	0.00	0.22	0.61	0.79	0.50	1.10	1.18	1.21	1.20	1.10	1.09	1.15	1.42
-10.5	0.00	0.33	0.56	0.88	0.60	1.22	1.28	1.37	1.16	1.23	1.18	1.14	1.40
-11.0	0.00	0.30	0.47	0.75	0.52	1.07	1.13	1.20	1.00	1.07	1.01	0.95	1.13
-11.5	0.00	0.16	0.43	0.62	0.39	0.89	0.94	0.95	1.01	0.88	0.87	0.93	1.04
-12.0	0.00	0.06	0.37	0.46	0.26	0.71	0.72	0.71	0.90	0.65	0.66	0.84	0.93
-12.5	0.00	0.01	0.35	0.35	0.18	0.54	0.55	0.52	0.91	0.46	0.50	0.72	0.83
-13.0	0.00	0.02	0.28	0.31	0.16	0.48	0.50	0.45	0.80	0.36	0.45	0.66	0.75
-13.5	0.00	0.04	0.18	0.29	0.16	0.44	0.45	0.45	0.57	0.28	0.41	0.51	0.56
-14.0	0.00	0.08	0.12	0.25	0.16	0.41	0.40	0.42	0.44	0.22	0.37	0.42	0.47
-14.5	0.00	0.08	0.07	0.19	0.13	0.33	0.30	0.34	0.29	0.14	0.29	0.29	0.34
-15.0	0.00	0.04	0.00	0.11	0.07	0.17	0.16	0.18	0.16	0.00	0.14	0.17	0.21


SIS-2 土中傾度管變位量歷時曲線圖

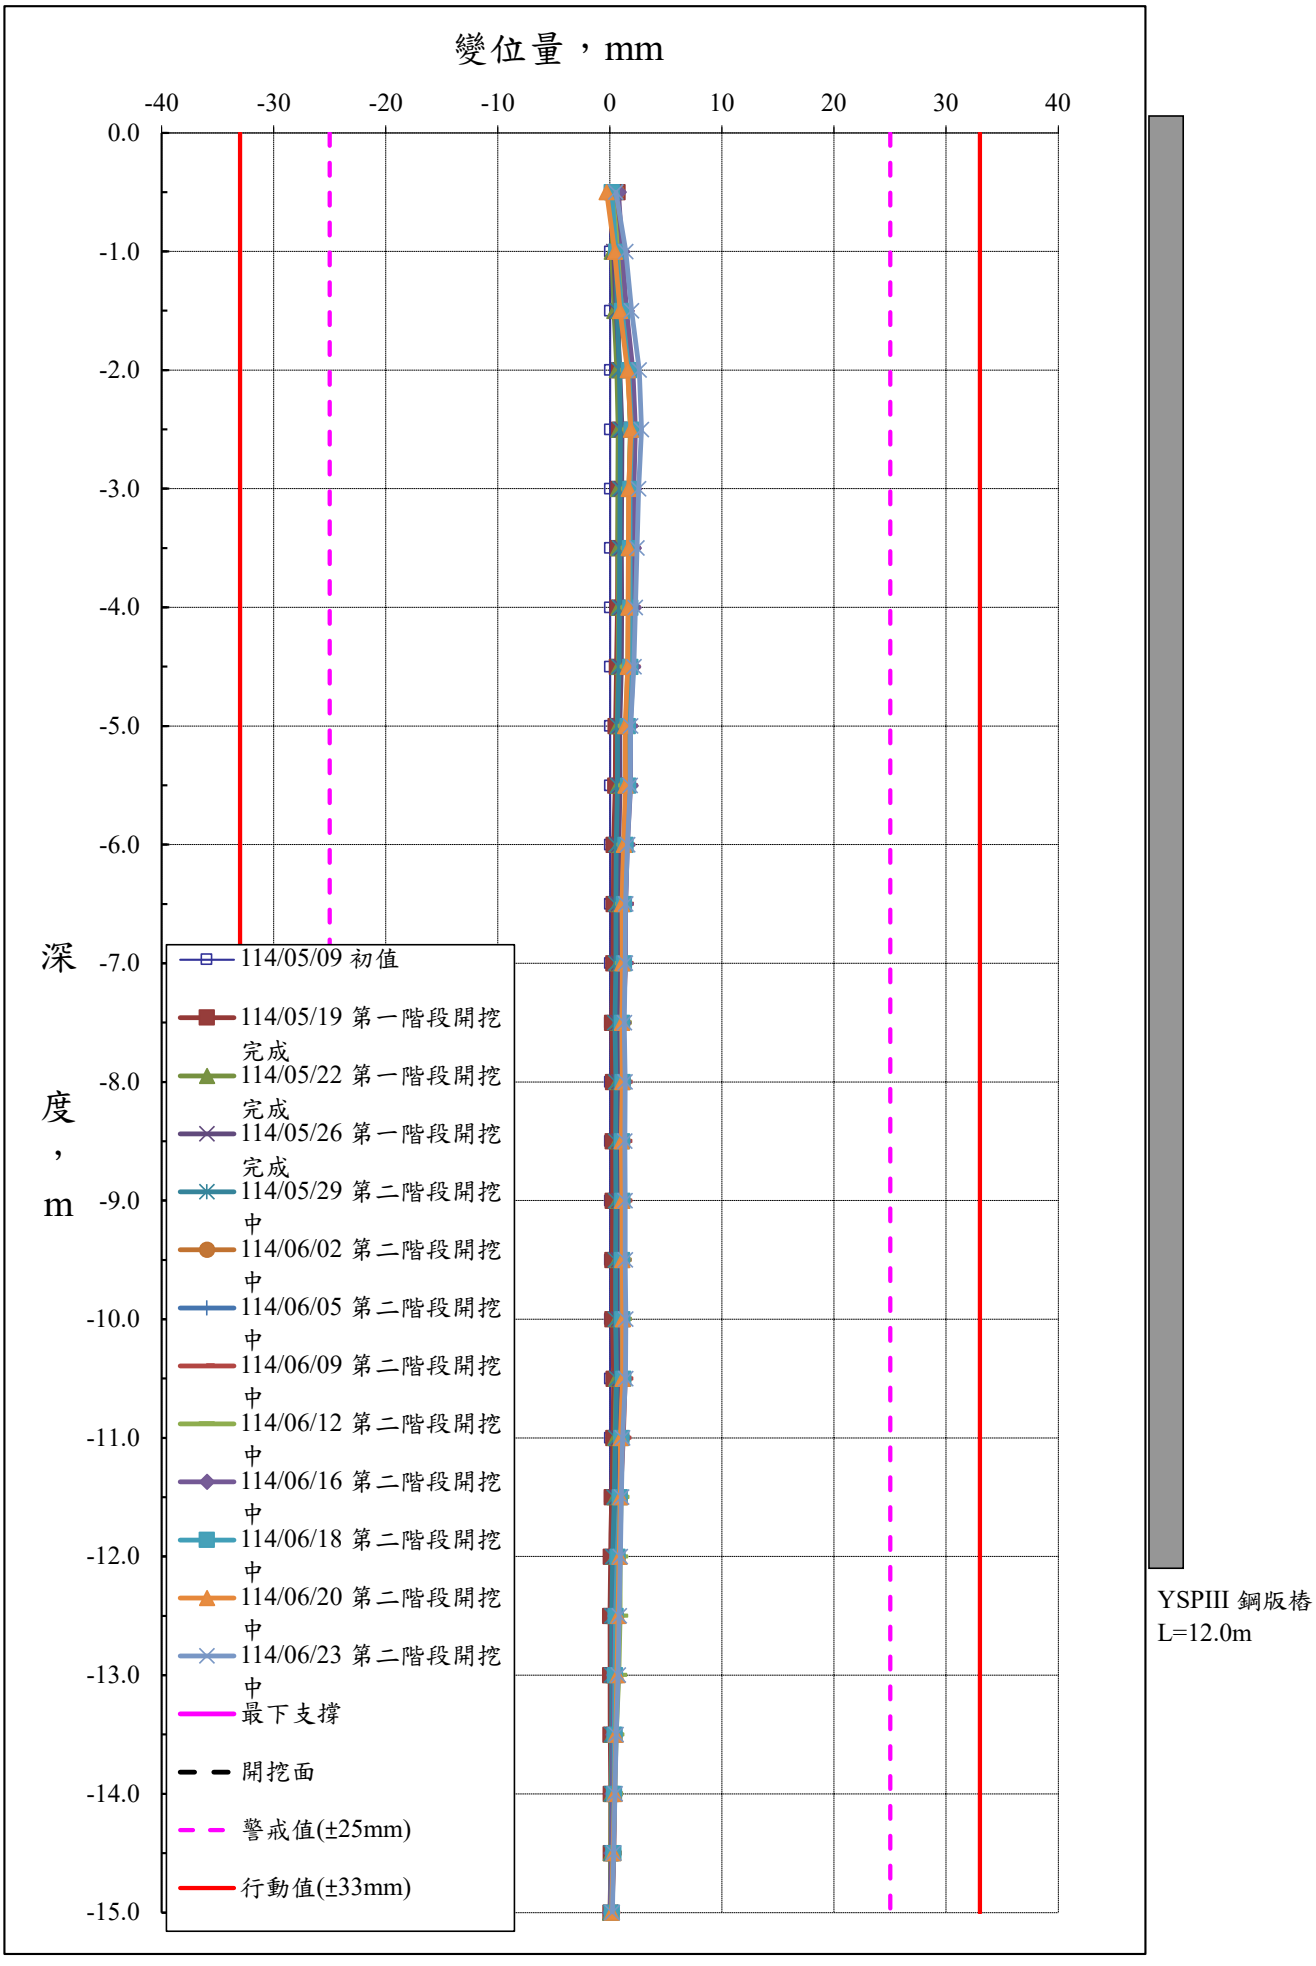

SIS-3 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	-5.05	-5.26	-5.28	-5.17	-5.43	-5.28	-5.25	-4.37	-4.39	-5.45	-4.46	2.49
-1.0	0.00	-2.81	-2.57	-2.49	-2.65	-2.19	-2.13	-2.10	-1.89	-1.21	-2.12	-1.88	4.47
-1.5	0.00	-0.64	0.00	0.18	-0.23	0.88	0.97	1.02	0.59	1.97	1.11	0.73	6.29
-2.0	0.00	0.99	1.93	2.20	1.60	3.20	3.33	3.39	2.46	4.38	3.60	2.68	7.41
-2.5	0.00	2.17	3.20	3.51	2.84	4.57	4.70	4.78	3.33	5.75	4.98	3.53	7.71
-3.0	0.00	1.26	2.23	2.54	1.90	3.44	3.55	3.62	2.16	4.53	3.72	2.25	5.92
-3.5	0.00	1.13	2.14	2.42	1.77	3.32	3.42	3.49	2.14	4.39	3.60	2.24	5.33
-4.0	0.00	0.79	1.82	2.10	1.44	3.02	3.10	3.18	2.04	4.09	3.31	2.17	4.69
-4.5	0.00	0.31	1.35	1.59	0.95	2.54	2.62	2.68	3.22	3.55	2.80	3.32	5.34
-5.0	0.00	0.00	1.02	1.24	0.62	2.19	2.28	2.31	2.97	3.18	2.45	3.07	4.65
-5.5	0.00	-0.47	0.44	0.62	0.07	1.55	1.62	1.65	2.43	2.51	1.78	2.51	3.75
-6.0	0.00	-0.87	-0.03	0.12	-0.37	0.97	1.06	1.05	1.97	1.95	1.23	1.94	3.03
-6.5	0.00	-0.34	0.50	0.66	0.16	1.54	1.66	1.63	2.58	2.52	1.83	2.54	3.58
-7.0	0.00	0.71	1.57	1.76	1.23	2.67	2.80	2.76	3.60	3.64	2.98	3.63	4.54
-7.5	0.00	1.11	1.95	2.14	1.62	3.04	3.14	3.12	3.86	3.96	3.32	3.90	4.66
-8.0	0.00	1.06	1.89	2.07	1.57	3.03	3.09	3.11	3.74	3.87	3.24	3.78	4.26
-8.5	0.00	-0.36	0.42	0.54	0.09	1.39	1.46	1.47	1.99	2.13	1.53	1.97	2.41
-9.0	0.00	0.12	0.90	1.00	0.56	1.82	1.91	1.89	2.46	2.52	1.96	2.48	2.94
-9.5	0.00	2.00	2.84	2.99	2.50	3.87	3.97	3.95	4.56	4.59	4.06	4.66	5.11
-10.0	0.00	3.94	4.85	5.02	4.48	6.02	6.10	6.13	6.61	6.69	6.22	6.78	7.12
-10.5	0.00	3.57	4.45	4.67	4.12	5.78	5.77	5.86	5.98	6.34	5.92	6.31	6.47
-11.0	0.00	2.14	2.91	3.12	2.63	4.19	4.16	4.25	4.36	4.66	4.29	4.65	4.76
-11.5	0.00	1.65	2.38	2.59	2.12	3.67	3.62	3.73	3.81	4.13	3.77	4.12	4.13
-12.0	0.00	1.45	2.07	2.24	1.84	3.26	3.22	3.31	3.34	3.67	3.35	3.61	3.60
-12.5	0.00	1.35	1.88	2.00	1.68	2.96	2.95	3.01	3.11	3.34	3.07	3.30	3.25
-13.0	0.00	1.12	1.54	1.61	1.36	2.50	2.51	2.55	2.64	2.83	2.62	2.80	2.75
-13.5	0.00	0.83	1.14	1.21	1.02	2.00	2.05	2.05	2.18	2.28	2.13	2.30	2.30
-14.0	0.00	0.53	0.73	0.78	0.66	1.54	1.56	1.57	1.66	1.73	1.62	1.77	1.75
-14.5	0.00	0.29	0.40	0.42	0.36	1.13	1.15	1.16	1.24	1.28	1.21	1.32	1.35
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.66	0.66	0.69	0.72	0.69	0.73	0.74


SIS-3 土中傾度管變位量歷時曲線圖

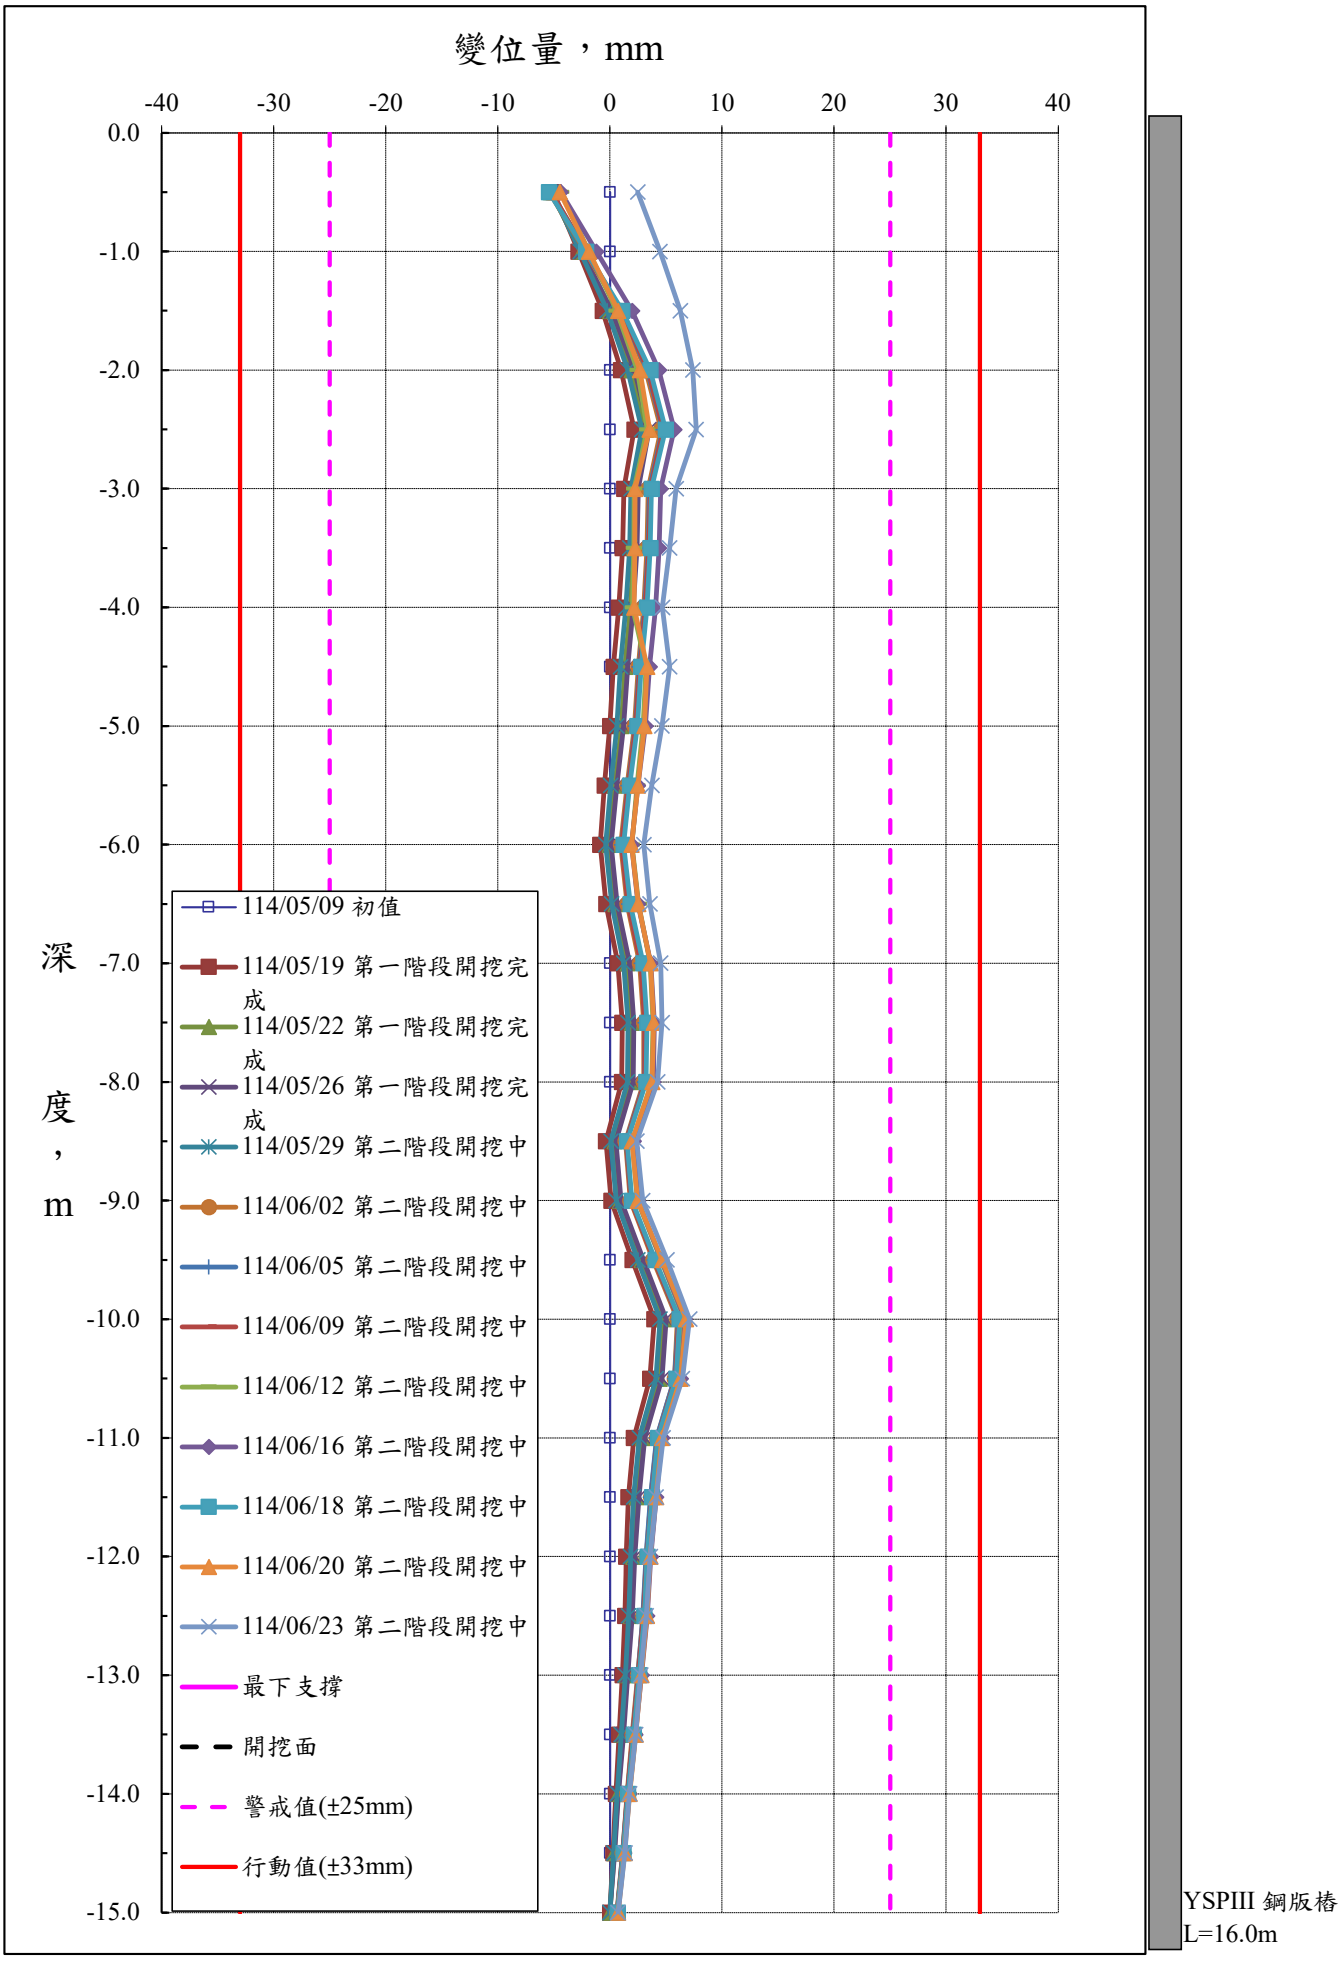

SIS-4 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	-0.55	102.46	150.23	174.11	166.32	160.43	160.65	166.85	162.45	161.45	165.14	164.62
-1.0	0.00	0.24	94.99	140.05	162.58	155.22	149.58	150.13	155.79	151.03	150.33	152.58	152.22
-1.5	0.00	0.32	87.35	128.15	148.56	142.11	137.27	137.98	142.69	138.77	138.17	140.31	139.92
-2.0	0.00	0.31	78.91	115.36	133.58	128.12	124.24	125.03	128.71	125.88	125.28	126.89	126.84
-2.5	0.00	0.37	69.61	101.74	117.80	113.36	110.39	111.22	113.94	112.12	111.55	113.04	113.03
-3.0	0.00	0.36	60.89	89.09	103.19	99.67	97.43	98.32	100.21	99.08	98.60	99.71	99.74
-3.5	0.00	0.34	50.78	76.53	89.40	86.29	84.28	85.15	86.78	85.86	85.33	86.06	86.12
-4.0	0.00	0.26	43.56	66.66	78.22	75.56	73.94	74.72	76.01	75.48	74.93	75.42	75.56
-4.5	0.00	0.18	37.07	57.64	67.93	65.60	64.16	64.87	66.00	65.54	65.03	65.43	65.57
-5.0	0.00	0.18	29.59	47.07	55.81	54.02	52.95	53.66	54.38	54.23	53.79	54.02	54.13
-5.5	0.00	0.21	21.71	35.91	43.02	41.75	41.05	41.74	42.07	42.18	41.80	41.84	41.95
-6.0	0.00	0.19	16.17	27.69	33.45	32.56	32.19	32.75	32.83	33.13	32.78	32.76	32.86
-6.5	0.00	0.14	12.09	20.89	25.29	24.83	24.89	25.32	25.07	25.66	25.39	25.28	25.35
-7.0	0.00	0.15	8.88	15.26	18.45	18.44	18.92	19.30	18.66	19.58	19.43	20.09	20.22
-7.5	0.00	0.17	6.77	11.62	14.05	14.30	15.02	15.36	14.51	15.61	15.54	16.12	16.23
-8.0	0.00	0.16	5.44	9.17	11.04	11.44	12.35	12.58	11.62	12.83	12.83	13.33	13.50
-8.5	0.00	0.15	4.18	6.99	8.40	8.88	9.82	10.06	9.06	10.24	10.27	10.77	10.93
-9.0	0.00	0.15	3.06	5.18	6.23	6.76	7.65	7.94	6.93	8.07	8.08	8.41	8.55
-9.5	0.00	0.17	2.37	4.00	4.81	5.35	6.21	6.51	5.50	6.61	6.64	6.85	6.94
-10.0	0.00	0.17	1.85	3.08	3.69	4.21	5.02	5.31	4.36	5.38	5.40	5.57	5.66
-10.5	0.00	0.14	1.20	2.10	2.55	3.03	3.73	4.07	3.17	4.04	4.08	4.19	4.28
-11.0	0.00	0.17	0.92	1.61	1.96	2.43	3.11	3.46	2.57	3.44	3.51	3.47	3.55
-11.5	0.00	0.10	1.13	1.70	1.98	2.45	3.24	3.44	2.58	3.54	3.65	3.60	3.64
-12.0	0.00	0.04	1.30	1.73	1.94	2.33	3.17	3.20	2.45	3.39	3.49	3.54	3.58
-12.5	0.00	0.14	0.50	0.82	0.98	1.31	1.93	2.11	1.43	2.14	2.23	2.12	2.08
-13.0	0.00	0.07	0.66	0.86	0.96	1.22	1.88	1.90	1.33	2.02	2.08	1.96	2.01
-13.5	0.00	0.06	0.25	0.43	0.52	0.73	1.27	1.37	0.84	1.40	1.48	1.30	1.31
-14.0	0.00	0.04	0.32	0.45	0.51	0.64	1.17	1.17	0.74	1.28	1.33	1.19	1.18
-14.5	0.00	0.02	0.19	0.25	0.27	0.33	0.80	0.78	0.43	0.84	0.89	0.85	0.85
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.37	0.09	0.40	0.43	0.41	0.42


SIS-4 土中傾度管變位量歷時曲線圖

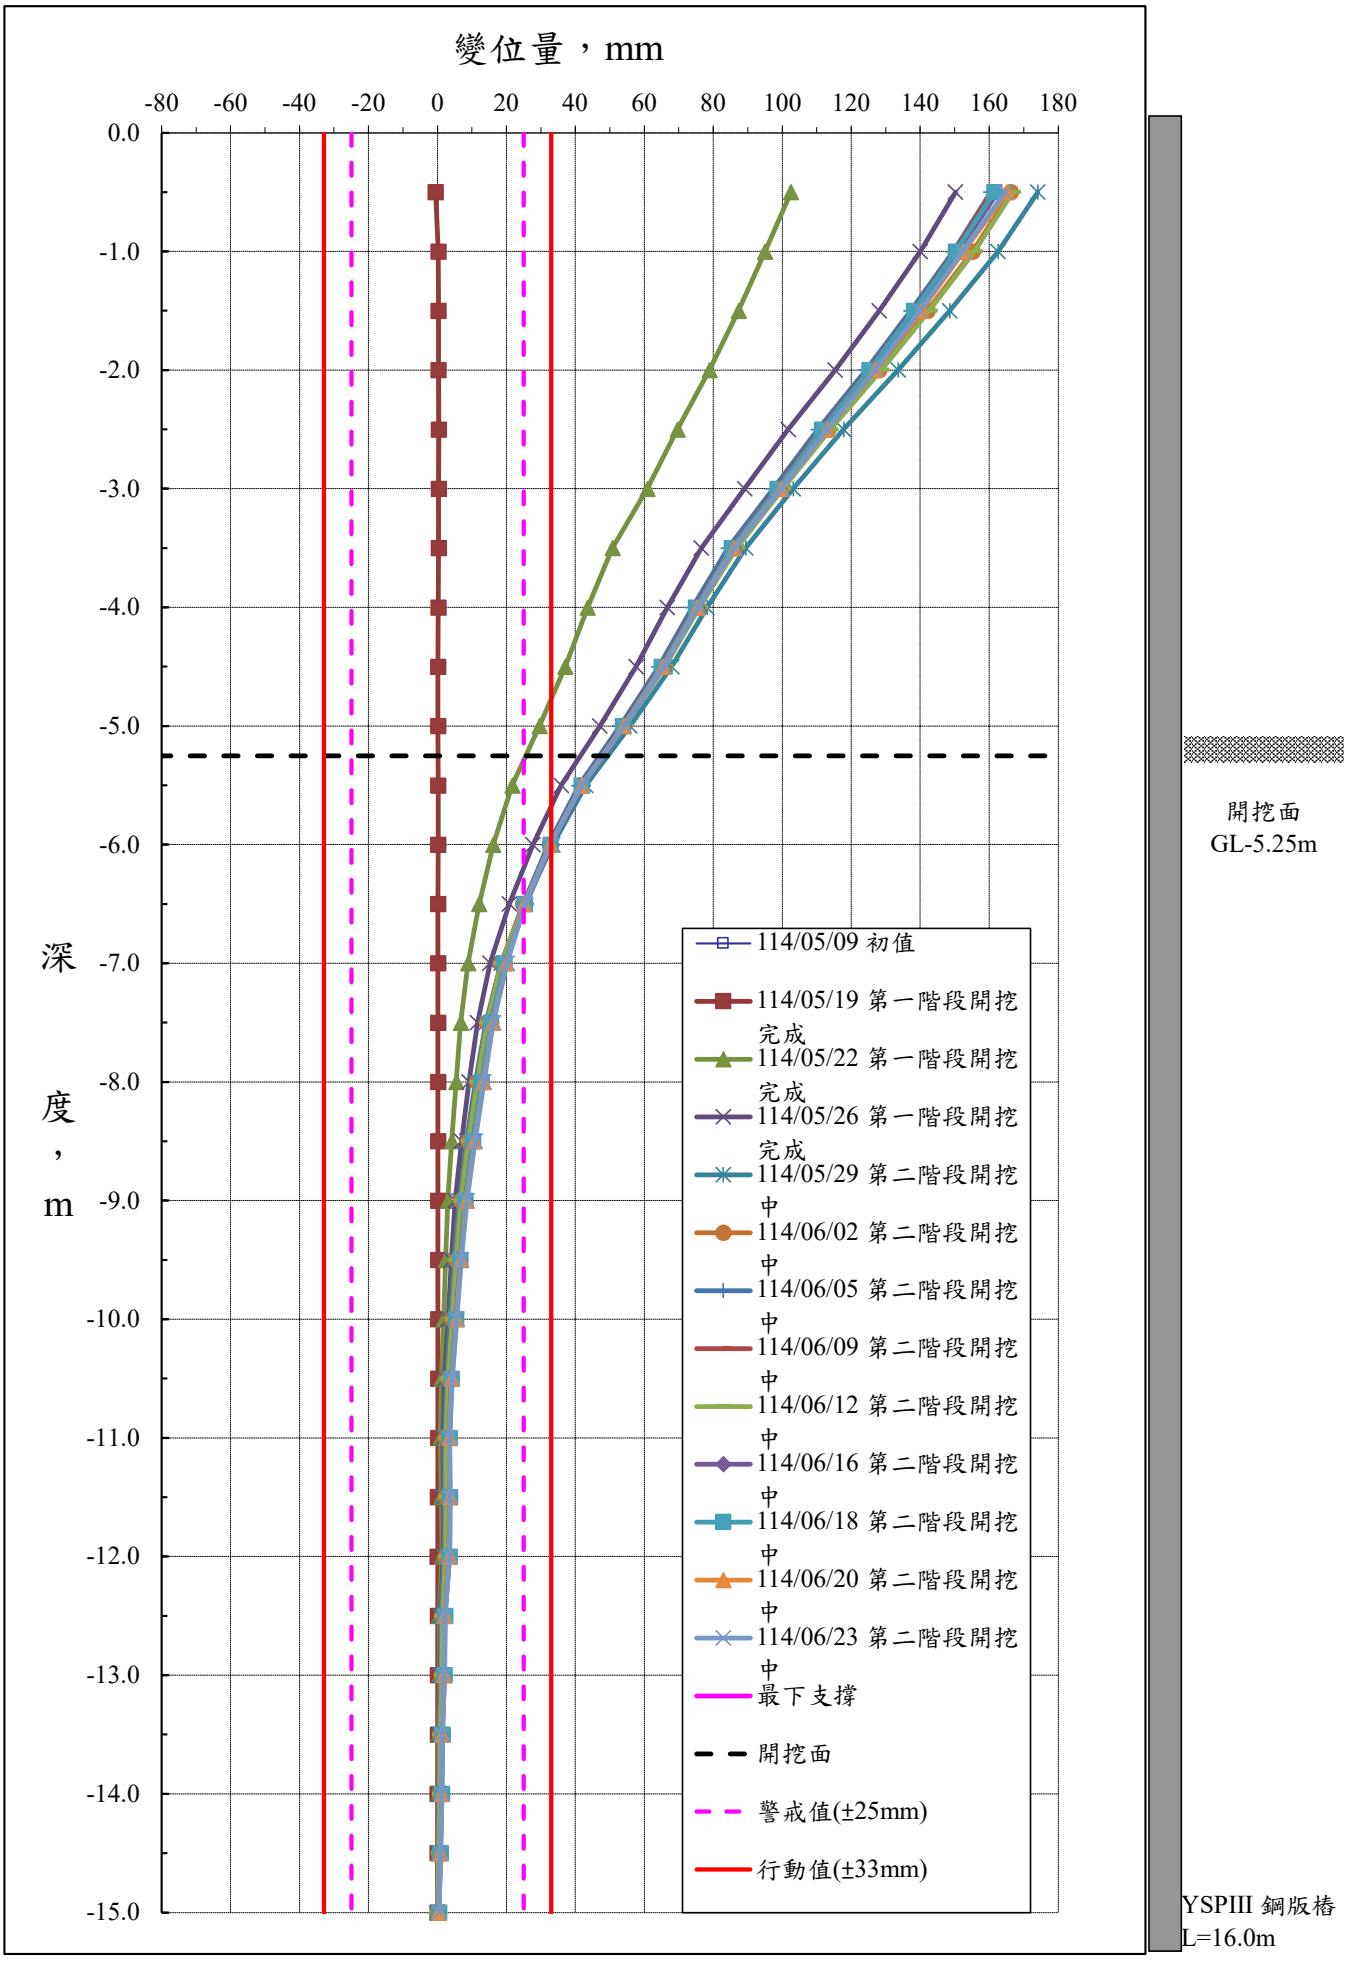

SIS-5 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時損壞無法量測
-1.0													
-1.5													
-2.0													
-2.5													
-3.0													
-3.5													
-4.0													
-4.5													
-5.0													
-5.5													
-6.0													
-6.5													
-7.0													
-7.5													
-8.0													
-8.5													
-9.0													
-9.5													
-10.0													
-10.5													
-11.0													
-11.5													
-12.0													
-12.5													
-13.0													
-13.5													
-14.0													
-14.5													
-15.0													


SIS-5 土中傾度管變位量歷時曲線圖

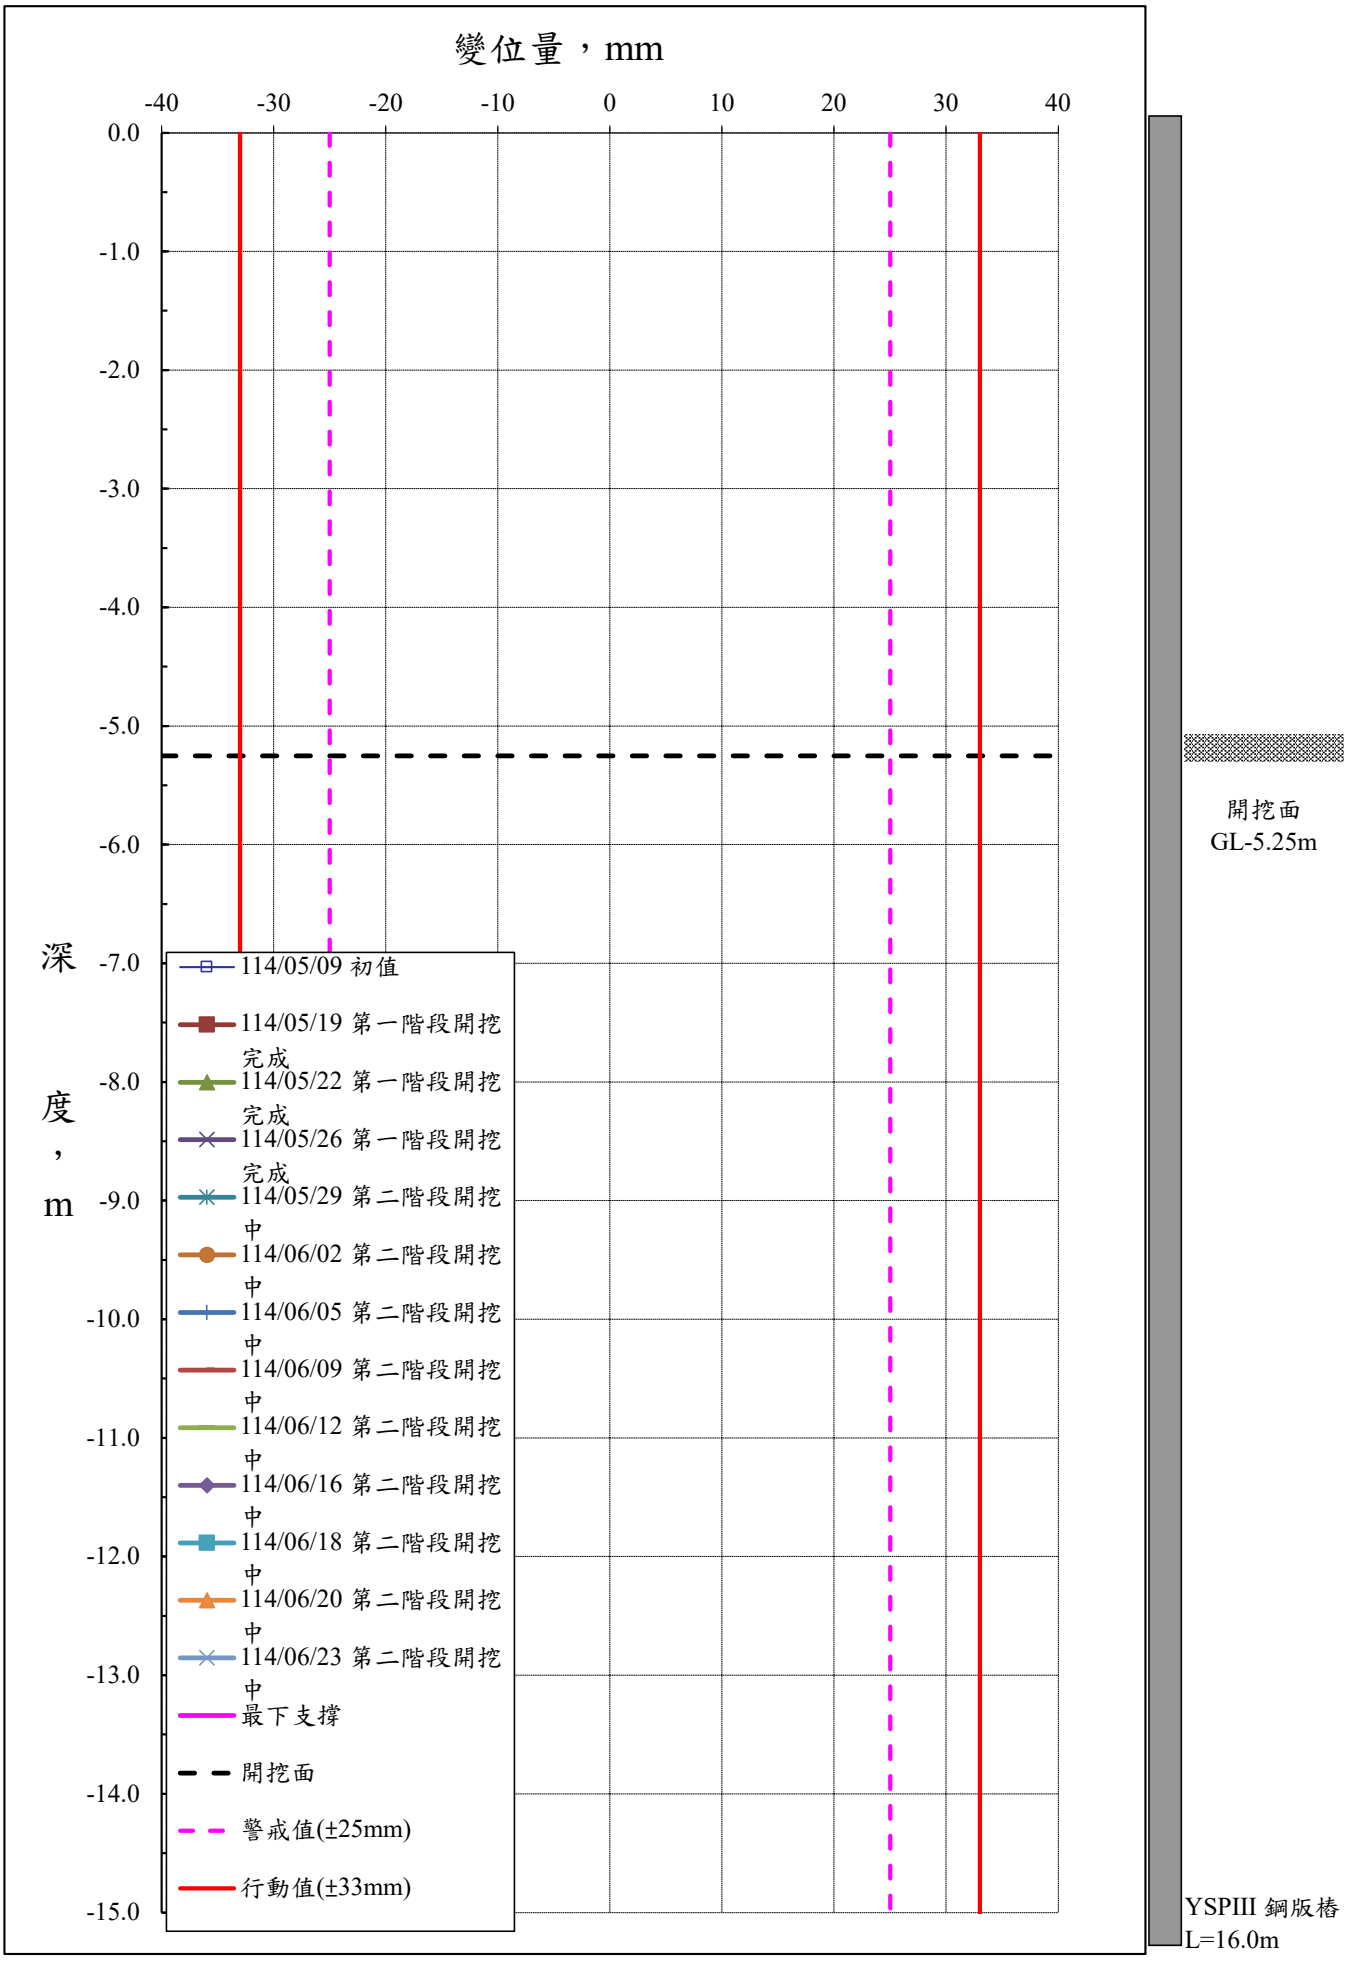

SIS-6 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	-7.16	-2.34	4.34	7.67	6.16	6.34	6.30	6.82	7.11	7.11	7.66	-11.51
-1.0	0.00	-1.02	3.51	13.96	19.19	18.89	21.14	21.19	21.14	23.50	23.34	23.31	23.96
-1.5	0.00	0.65	4.89	16.21	21.88	22.08	24.92	25.11	23.91	28.47	28.28	27.04	27.68
-2.0	0.00	0.40	4.88	14.13	18.75	17.95	20.81	21.17	20.34	24.42	24.11	23.03	23.47
-2.5	0.00	0.46	5.45	14.45	18.95	18.42	20.74	21.03	19.98	23.81	23.50	22.26	22.67
-3.0	0.00	0.59	5.66	13.83	17.92	17.27	19.10	19.42	18.43	21.72	21.44	20.22	20.65
-3.5	0.00	0.47	4.80	11.80	15.30	14.46	15.85	16.20	15.33	18.16	17.91	16.77	17.23
-4.0	0.00	0.43	4.29	10.24	13.22	12.34	13.55	13.93	13.21	15.81	15.42	14.48	14.87
-4.5	0.00	0.44	4.42	10.95	14.22	13.54	14.71	15.11	14.53	16.92	16.69	15.83	16.27
-5.0	0.00	0.32	3.78	9.52	12.38	11.67	12.68	13.04	12.50	14.70	14.49	13.63	14.05
-5.5	0.00	0.25	3.08	7.62	9.89	9.21	9.94	10.27	9.79	11.71	11.54	10.70	11.11
-6.0	0.00	0.23	2.56	6.03	7.76	7.08	7.58	7.88	7.50	9.11	8.96	8.19	8.57
-6.5	0.00	0.21	2.09	4.85	6.23	5.44	5.79	6.05	5.72	7.13	7.00	6.32	6.65
-7.0	0.00	0.16	1.81	4.26	5.48	4.60	4.91	5.14	4.82	6.12	5.99	5.34	5.62
-7.5	0.00	0.10	1.64	3.86	4.96	4.13	4.40	4.63	4.32	5.53	5.43	4.78	5.04
-8.0	0.00	0.08	1.49	3.38	4.32	3.51	3.80	3.98	3.77	4.84	4.73	4.12	4.36
-8.5	0.00	0.07	1.28	2.89	3.70	2.98	3.24	3.40	3.21	4.17	4.09	3.51	3.71
-9.0	0.00	0.03	1.15	2.54	3.23	2.56	2.81	2.95	2.80	3.65	3.58	3.08	3.27
-9.5	0.00	-0.02	1.01	2.24	2.85	2.23	2.47	2.60	2.49	3.24	3.16	2.76	2.92
-10.0	0.00	-0.03	0.94	2.03	2.58	1.96	2.16	2.30	2.25	2.90	2.80	2.49	2.67
-10.5	0.00	-0.13	0.82	1.79	2.28	1.62	1.84	1.95	2.03	2.52	2.40	2.26	2.45
-11.0	0.00	-0.14	0.73	1.61	2.05	1.39	1.58	1.69	1.79	2.20	2.09	2.03	2.25
-11.5	0.00	-0.04	0.60	1.33	1.69	1.31	1.36	1.57	1.44	1.96	1.89	1.68	1.91
-12.0	0.00	-0.09	0.41	1.01	1.31	1.05	1.06	1.29	1.14	1.60	1.57	1.32	1.52
-12.5	0.00	-0.03	0.45	0.90	1.13	0.81	0.99	1.06	1.13	1.38	1.30	1.24	1.43
-13.0	0.00	-0.02	0.22	0.60	0.79	0.68	0.73	0.85	0.77	1.04	1.08	0.86	1.02
-13.5	0.00	0.00	0.18	0.43	0.56	0.51	0.57	0.66	0.59	0.82	0.83	0.68	0.82
-14.0	0.00	0.00	0.09	0.25	0.34	0.33	0.40	0.48	0.42	0.58	0.60	0.52	0.59
-14.5	0.00	-0.01	0.04	0.12	0.16	0.16	0.28	0.30	0.25	0.39	0.39	0.33	0.38
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.14	0.17	0.20	0.19	0.21	0.24


SIS-6 土中傾度管變位量歷時曲線圖

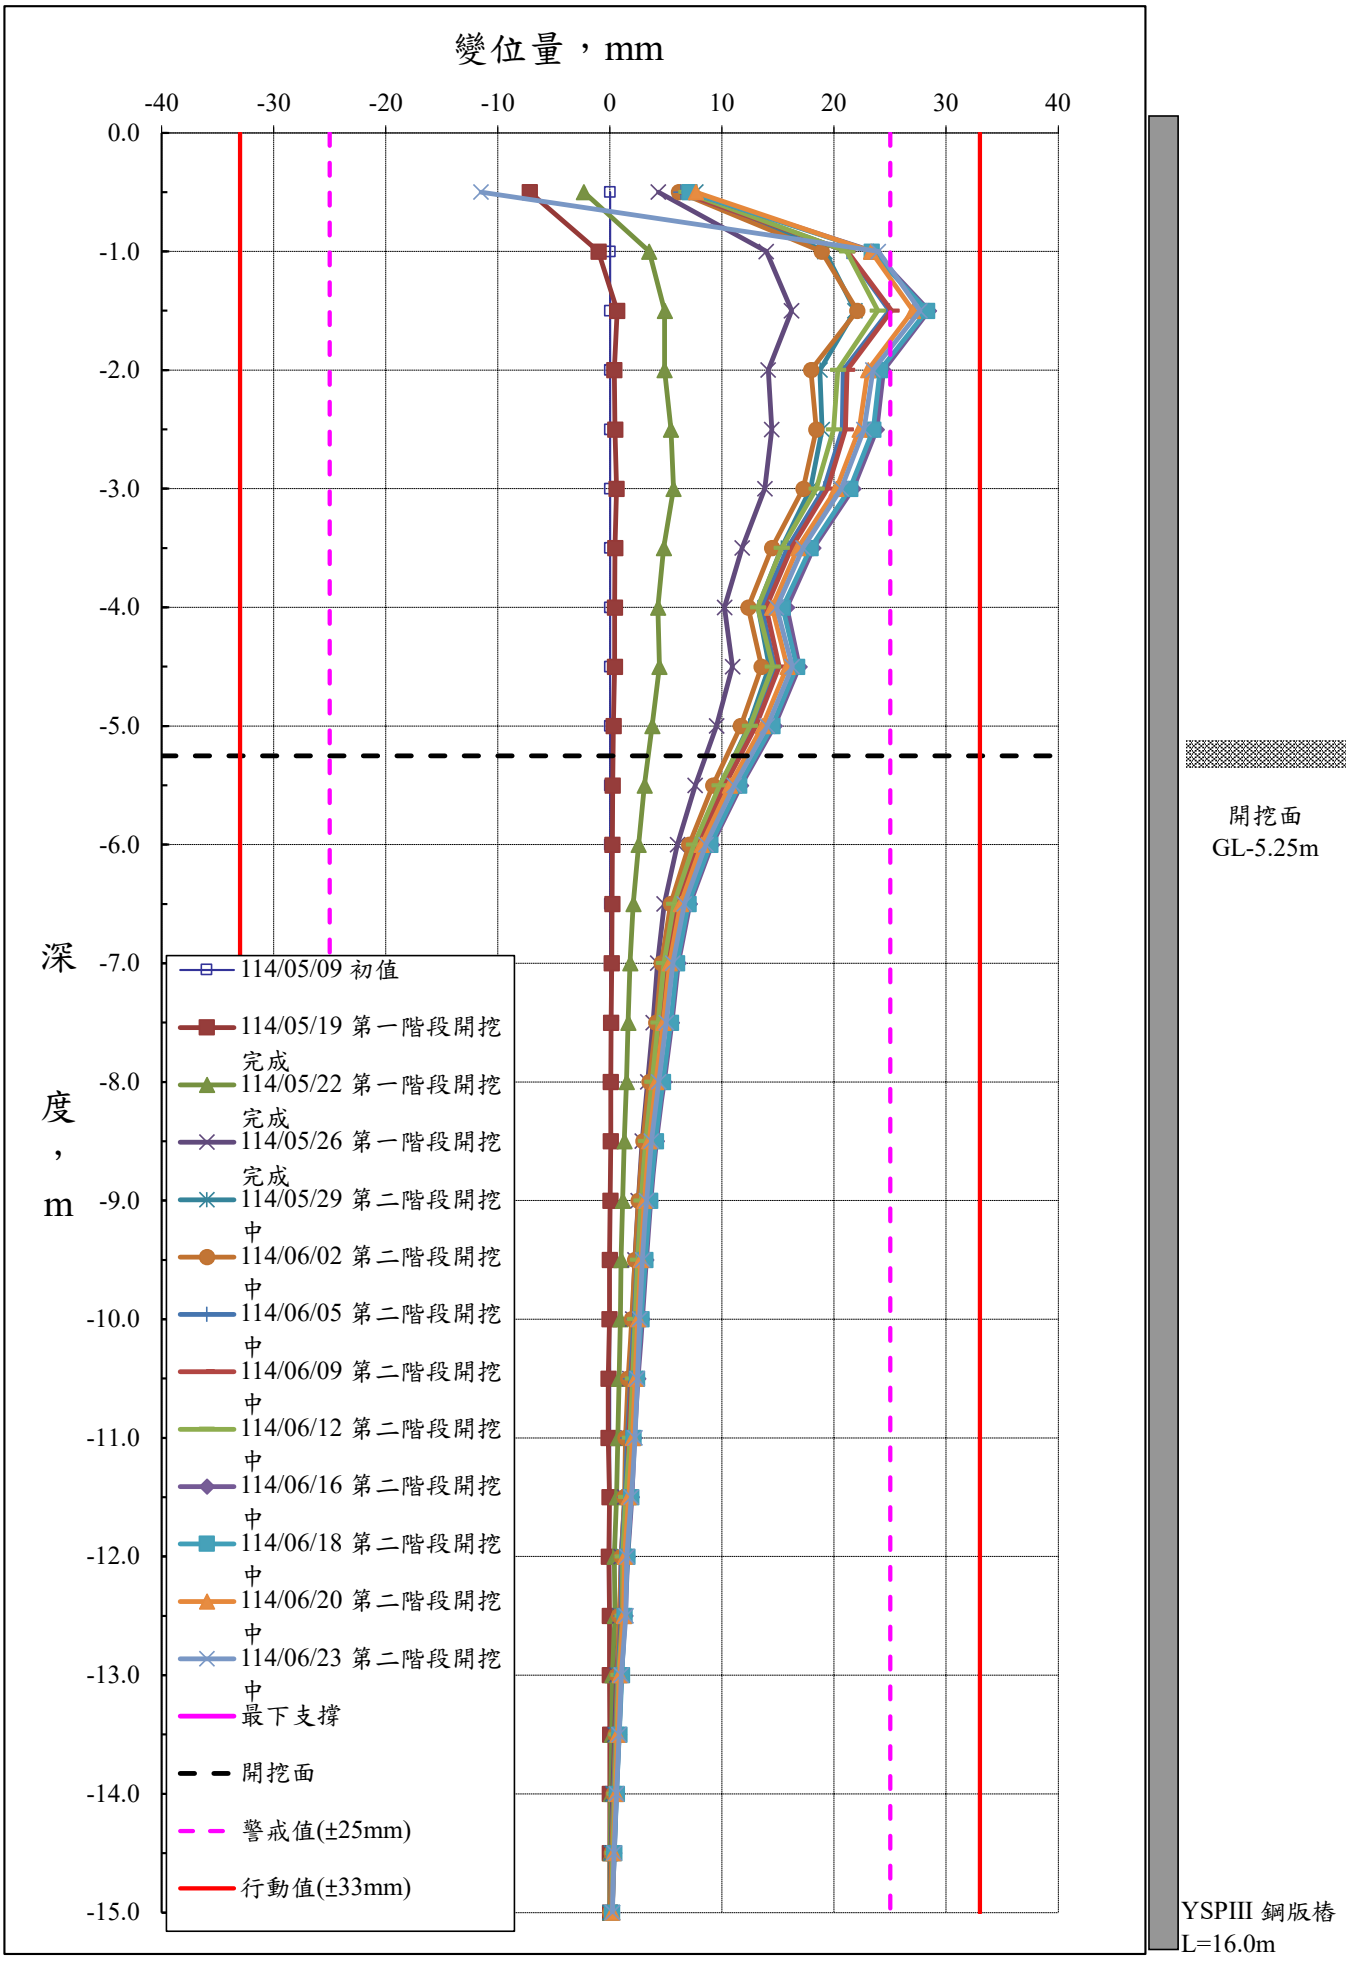

SIS-7 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	-2.64	5.66	8.75	10.30	8.44	8.54	8.40	19.97	7.79	7.97	19.88	20.92
-1.0	0.00	-1.79	9.22	21.09	27.02	25.39	30.61	31.08	33.55	34.31	34.44	36.84	38.05
-1.5	0.00	0.99	10.80	23.27	29.50	29.48	39.20	39.90	39.30	46.31	46.43	45.66	46.87
-2.0	0.00	0.22	10.39	20.71	25.87	24.85	31.98	32.48	33.08	37.40	37.44	37.86	38.68
-2.5	0.00	0.27	11.63	21.52	26.46	25.09	30.29	30.77	31.46	34.97	34.91	35.37	36.23
-3.0	0.00	0.28	11.88	19.73	23.65	22.24	26.78	27.20	27.89	30.94	30.86	31.36	32.16
-3.5	0.00	0.36	13.09	20.78	24.62	23.32	27.25	27.64	28.33	30.93	30.87	31.36	32.14
-4.0	0.00	0.30	12.96	20.25	23.90	23.32	26.57	27.01	27.83	29.91	29.91	30.58	31.35
-4.5	0.00	0.21	11.57	17.52	20.49	20.00	22.64	23.00	23.63	25.32	25.33	25.88	26.62
-5.0	0.00	0.17	10.32	15.12	17.52	16.87	18.76	19.12	19.74	20.94	20.95	21.47	22.17
-5.5	0.00	0.15	8.89	12.68	14.58	13.72	15.04	15.29	15.94	16.68	16.67	17.27	17.91
-6.0	0.00	0.10	7.27	10.28	11.78	10.89	11.87	12.06	12.66	13.16	13.14	13.73	14.29
-6.5	0.00	0.07	5.49	7.72	8.84	7.86	8.35	8.50	8.98	9.19	9.14	9.67	10.13
-7.0	0.00	0.07	4.20	5.87	6.71	5.58	5.73	5.83	6.22	6.28	6.18	6.67	7.05
-7.5	0.00	0.05	3.60	5.13	5.90	4.67	4.81	4.89	5.30	5.31	5.23	5.66	6.00
-8.0	0.00	0.05	2.91	4.26	4.93	3.62	3.71	3.74	4.18	4.08	4.00	4.45	4.72
-8.5	0.00	0.04	2.35	3.57	4.18	2.84	2.91	2.91	3.38	3.22	3.11	3.54	3.84
-9.0	0.00	0.05	1.91	2.94	3.45	2.19	2.22	2.21	2.53	2.45	2.35	2.65	2.93
-9.5	0.00	0.08	1.56	2.46	2.90	1.76	1.73	1.75	1.99	1.91	1.83	2.05	2.31
-10.0	0.00	0.11	1.44	2.24	2.64	1.50	1.48	1.51	1.74	1.70	1.63	1.81	2.07
-10.5	0.00	0.10	1.29	2.00	2.36	1.30	1.29	1.32	1.56	1.53	1.46	1.64	1.86
-11.0	0.00	0.09	1.15	1.82	2.16	1.17	1.17	1.21	1.41	1.43	1.36	1.50	1.70
-11.5	0.00	0.04	1.01	1.54	1.80	0.99	1.07	1.07	1.31	1.27	1.22	1.46	1.55
-12.0	0.00	-0.05	1.07	1.50	1.72	0.86	1.04	0.94	1.54	1.29	1.14	1.64	1.74
-12.5	0.00	-0.02	0.73	1.11	1.30	0.58	0.68	0.64	0.97	0.85	0.71	1.06	1.15
-13.0	0.00	0.02	0.39	0.72	0.88	0.38	0.37	0.40	0.46	0.42	0.40	0.57	0.59
-13.5	0.00	0.00	0.21	0.46	0.58	0.22	0.19	0.25	0.26	0.19	0.20	0.37	0.35
-14.0	0.00	0.00	0.08	0.28	0.38	0.14	0.10	0.18	0.14	0.10	0.11	0.28	0.21
-14.5	0.00	0.01	-0.06	0.07	0.13	0.02	-0.03	0.05	-0.13	-0.05	-0.01	0.08	-0.06
-15.0	0.00	0.00	0.05	0.10	0.13	0.00	0.05	0.07	0.02	0.07	0.08	0.05	0.07


SIS-7 土中傾度管變位量歷時曲線圖

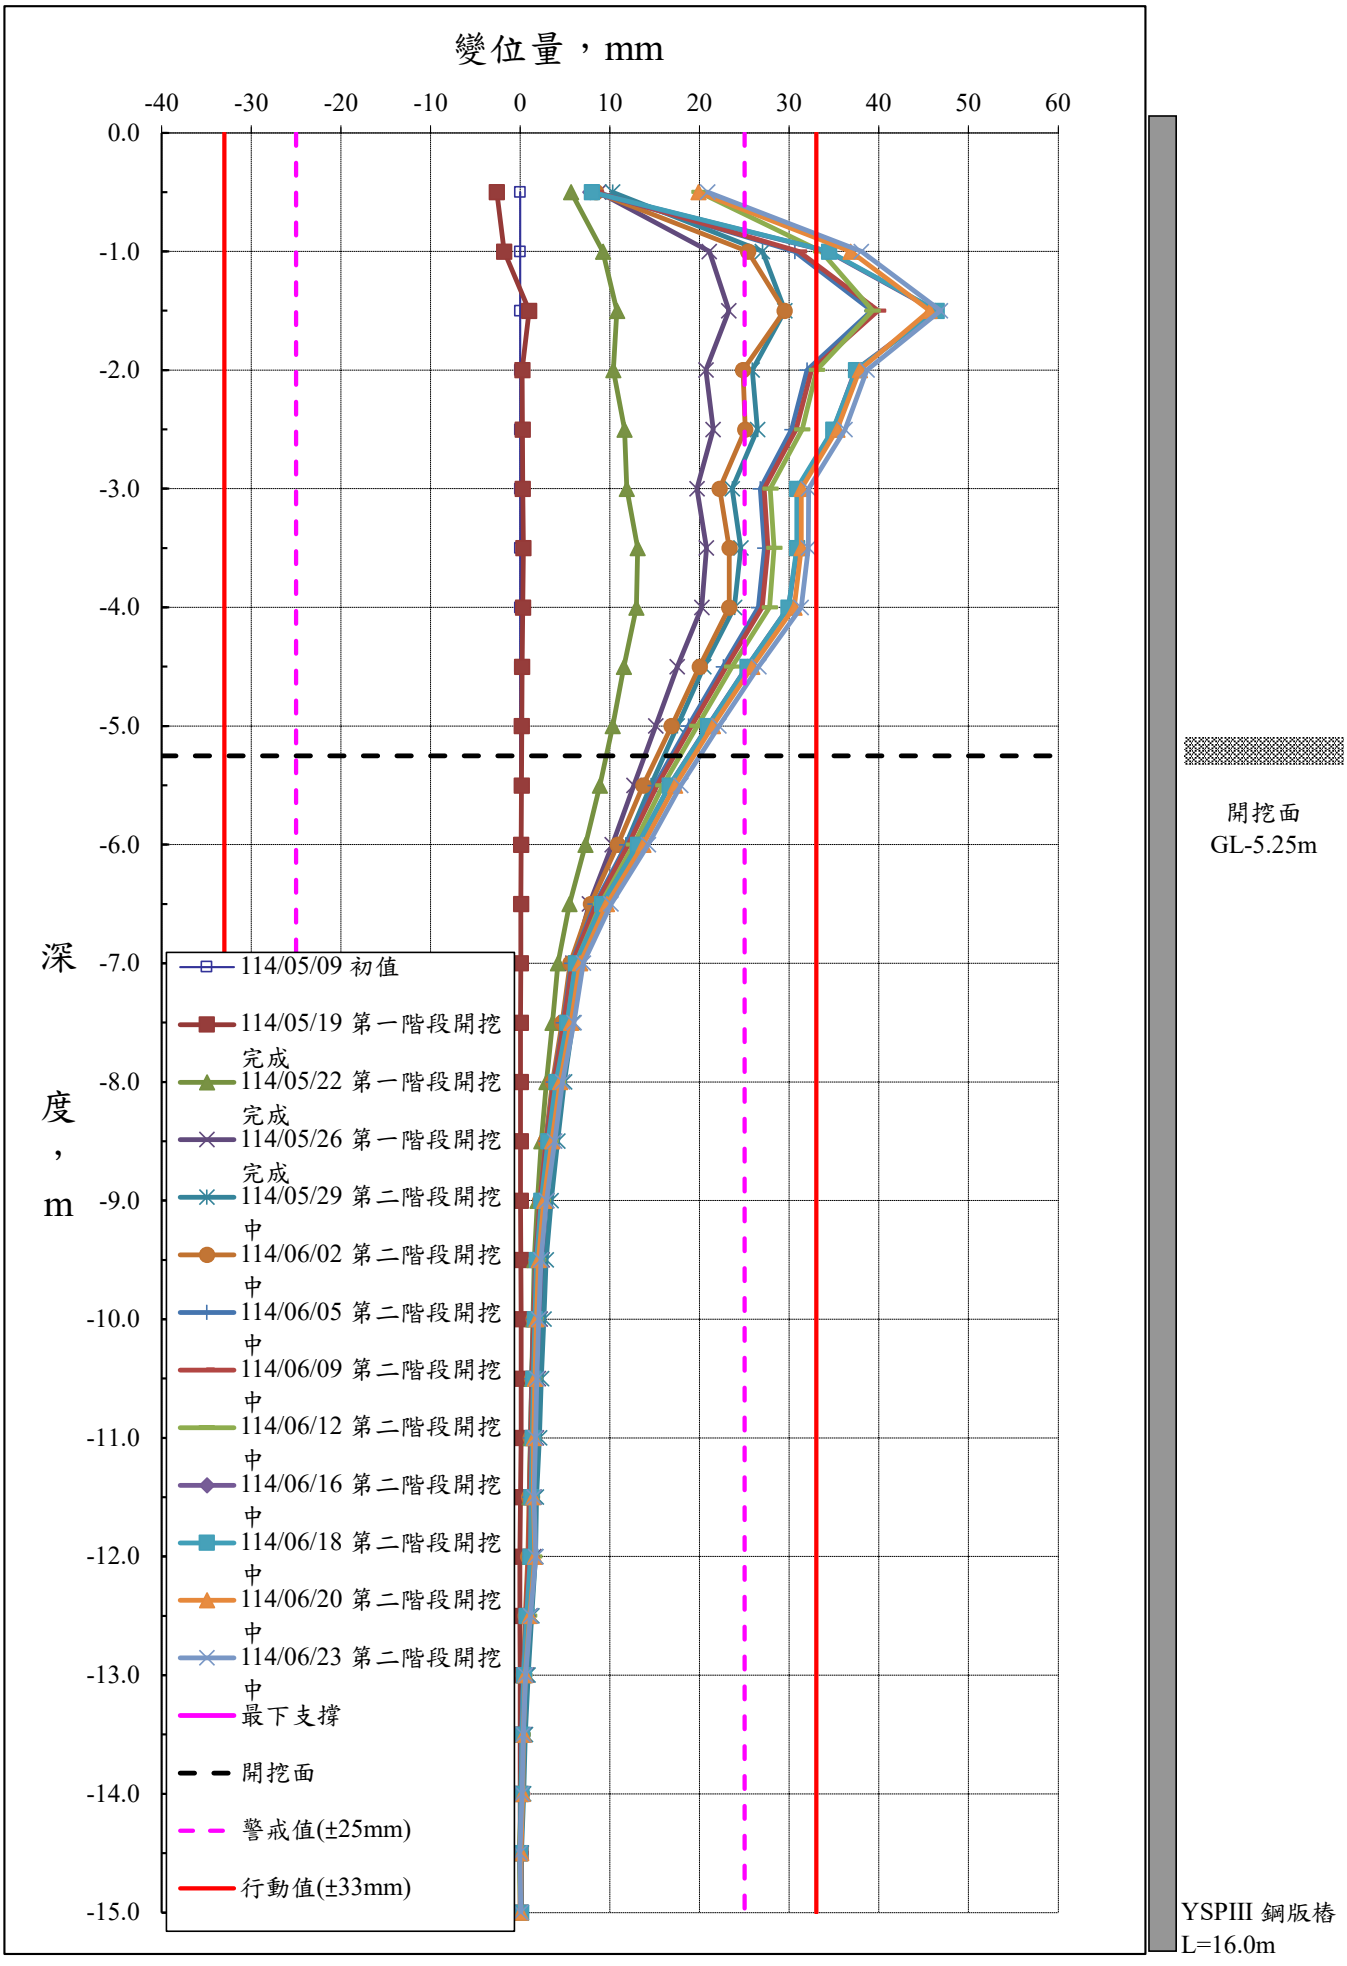

SIS-8 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	1.21	1.75	25.13	36.82	33.33	33.94	34.15	36.73	39.35	39.93	42.25	43.09
-1.0	0.00	-0.06	1.64	25.57	37.53	33.96	34.13	34.39	36.96	39.48	39.98	41.78	42.50
-1.5	0.00	0.03	1.87	23.68	34.58	31.42	31.48	31.68	34.08	36.43	36.92	38.91	39.18
-2.0	0.00	0.03	1.93	21.61	31.44	28.63	28.55	28.68	31.11	32.80	33.36	35.26	35.36
-2.5	0.00	0.22	2.12	18.57	26.80	24.60	24.62	24.76	26.99	28.32	28.97	30.79	30.80
-3.0	0.00	0.07	1.67	15.06	21.76	19.93	19.80	19.94	22.20	22.79	23.04	25.20	25.23
-3.5	0.00	-0.03	1.59	12.61	18.11	16.59	16.36	16.48	18.61	18.66	18.92	21.03	21.03
-4.0	0.00	-0.06	1.43	10.41	14.90	13.61	13.29	13.35	15.28	15.07	15.32	17.29	17.26
-4.5	0.00	-0.10	1.23	8.12	11.57	10.51	10.13	10.13	11.92	11.44	11.68	13.52	13.46
-5.0	0.00	-0.11	1.14	6.30	8.88	8.06	7.74	7.68	9.35	8.67	8.89	10.60	10.52
-5.5	0.00	-0.11	1.02	4.63	6.44	5.77	5.47	5.33	6.92	6.04	6.24	7.82	7.73
-6.0	0.00	-0.10	0.87	3.28	4.49	3.86	3.47	3.31	4.83	3.74	3.90	5.46	5.33
-6.5	0.00	-0.13	0.75	2.67	3.62	3.07	2.78	2.53	4.06	2.89	3.07	4.57	4.39
-7.0	0.00	-0.14	0.67	2.20	2.96	2.42	2.12	1.84	3.34	2.13	2.30	3.74	3.56
-7.5	0.00	-0.13	0.66	2.02	2.70	2.20	1.90	1.64	3.03	1.84	2.04	3.40	3.21
-8.0	0.00	-0.10	0.66	1.87	2.47	2.00	1.74	1.49	2.82	1.65	1.85	3.19	2.94
-8.5	0.00	-0.07	0.68	1.71	2.23	1.80	1.56	1.33	2.54	1.46	1.64	2.91	2.65
-9.0	0.00	-0.06	0.68	1.63	2.10	1.69	1.51	1.28	2.44	1.41	1.58	2.78	2.53
-9.5	0.00	-0.05	0.67	1.56	2.00	1.62	1.46	1.25	2.35	1.40	1.54	2.70	2.46
-10.0	0.00	-0.03	0.68	1.54	1.96	1.63	1.53	1.34	2.37	1.49	1.62	2.71	2.46
-10.5	0.00	-0.01	0.64	1.39	1.76	1.46	1.43	1.24	2.20	1.38	1.50	2.58	2.27
-11.0	0.00	0.00	0.60	1.27	1.60	1.33	1.30	1.14	2.03	1.24	1.36	2.34	2.05
-11.5	0.00	0.00	0.53	1.14	1.45	1.20	1.20	1.05	1.91	1.14	1.27	2.19	1.93
-12.0	0.00	-0.01	0.44	1.02	1.31	1.07	1.13	0.94	1.76	1.06	1.17	2.00	1.79
-12.5	0.00	-0.02	0.38	0.93	1.20	1.00	1.12	0.91	1.72	1.07	1.16	1.96	1.80
-13.0	0.00	-0.01	0.35	0.76	0.96	0.81	0.85	0.78	1.27	0.79	0.91	1.45	1.40
-13.5	0.00	0.01	0.22	0.52	0.68	0.52	0.49	0.50	0.78	0.41	0.54	0.92	0.91
-14.0	0.00	0.01	0.16	0.41	0.53	0.41	0.43	0.42	0.65	0.37	0.49	0.77	0.76
-14.5	0.00	0.01	0.09	0.27	0.37	0.27	0.32	0.29	0.46	0.28	0.37	0.54	0.53
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.13	0.20	0.10	0.17	0.13	0.24	0.16	0.19	0.29	0.31


SIS-8 土中傾度管變位量歷時曲線圖

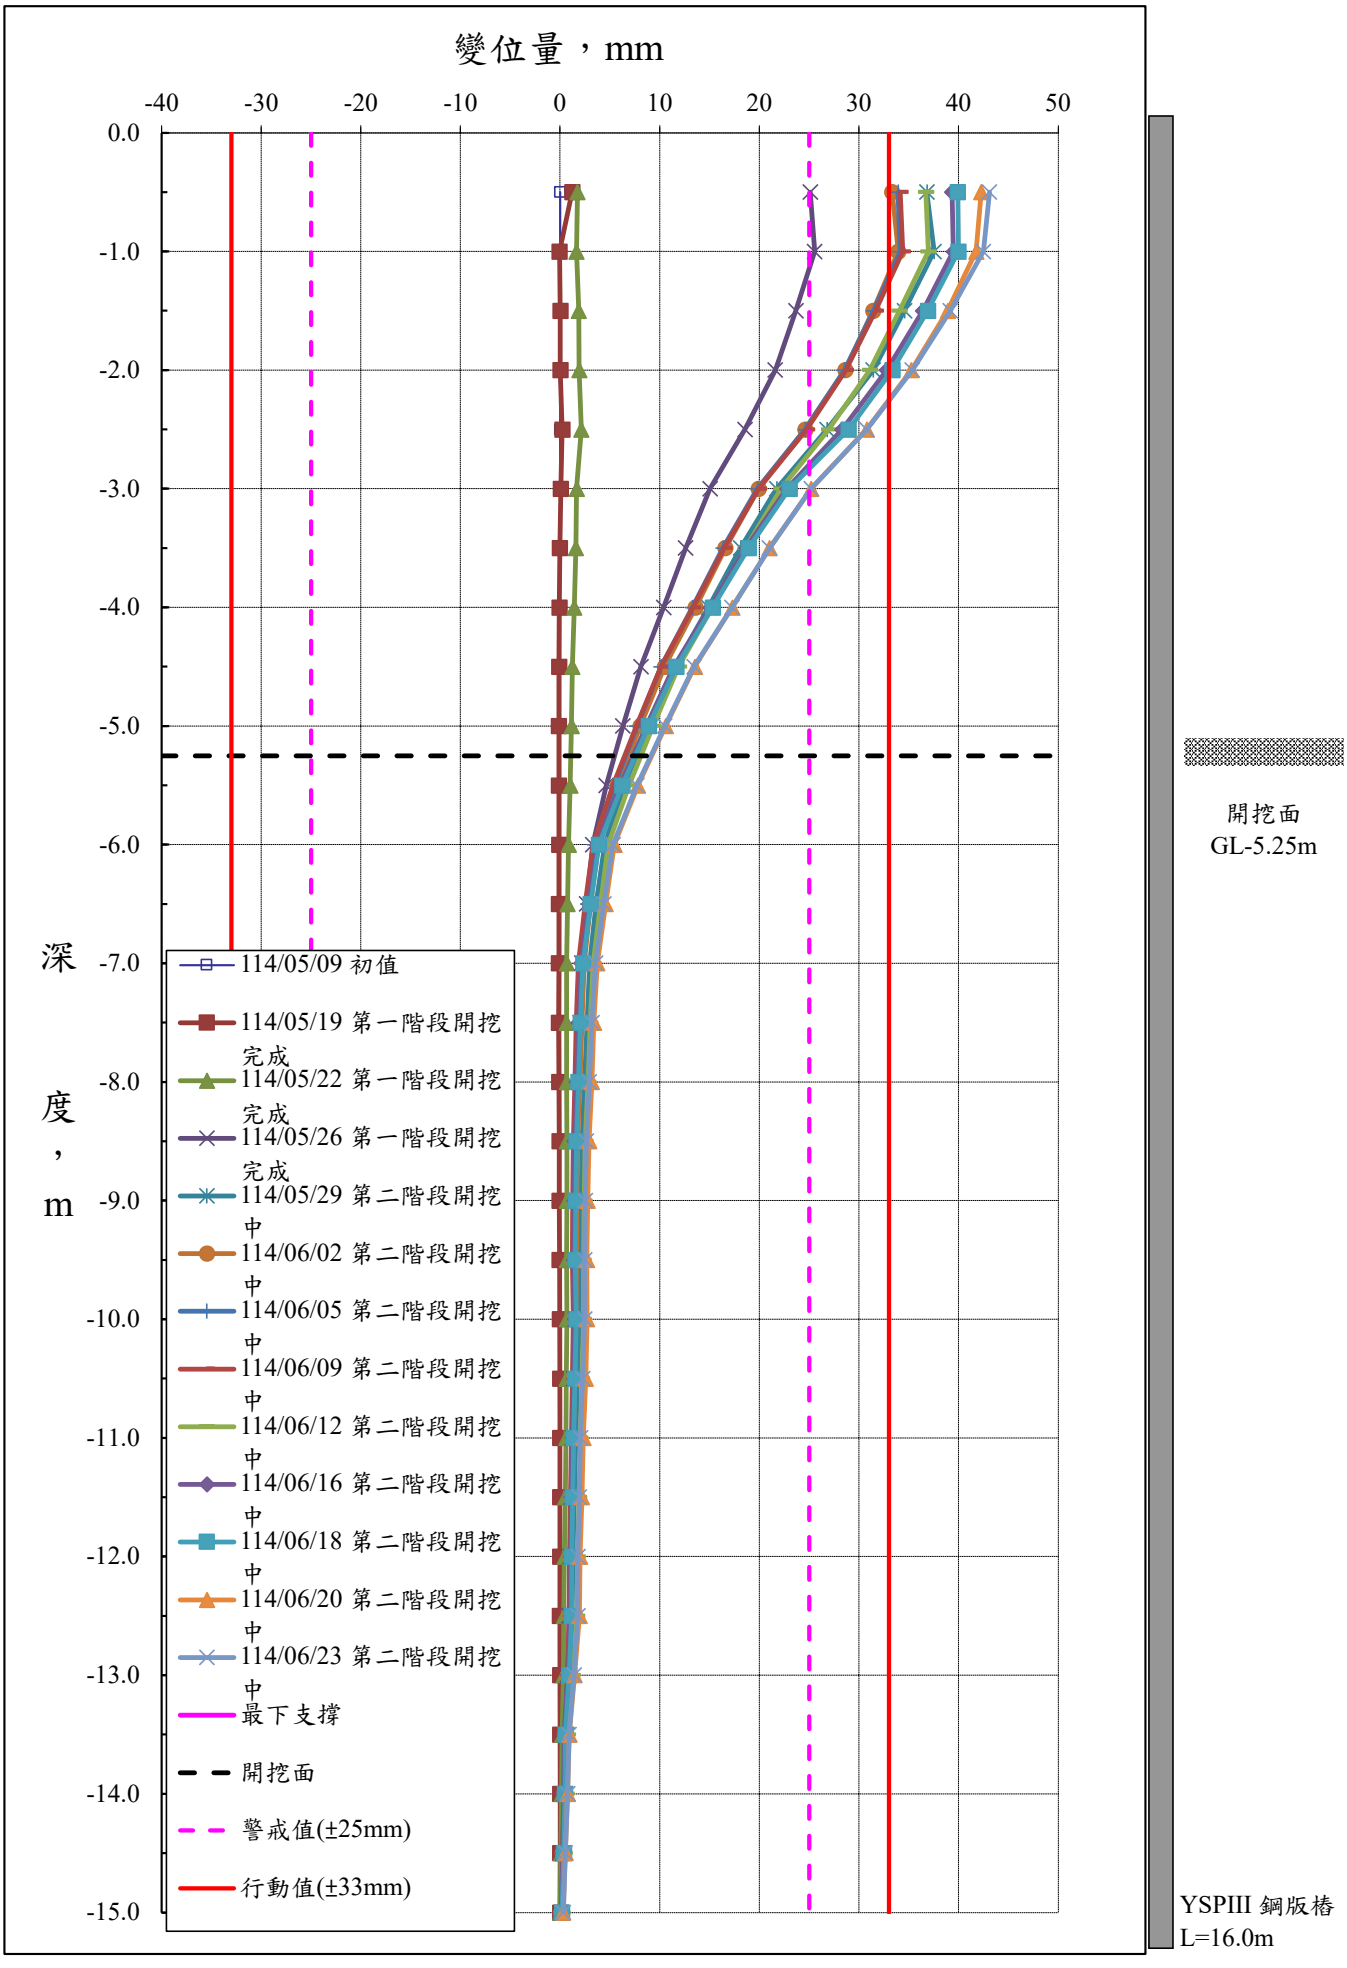

SIS-9 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	-0.78	-1.37	-1.08	-0.78	-3.04	-2.96	-2.70	-1.97	-1.92	-2.55	-1.86	-0.02
-1.0	0.00	0.11	-0.10	-0.05	0.00	-1.25	-1.24	-0.95	-0.66	-0.26	-0.72	-0.52	1.57
-1.5	0.00	0.15	0.18	0.29	0.41	-0.57	-0.57	-0.26	-0.15	0.35	0.07	0.02	2.12
-2.0	0.00	0.19	0.45	0.60	0.75	0.08	0.13	0.47	0.90	1.08	0.84	1.01	3.00
-2.5	0.00	0.31	0.73	1.00	1.27	0.68	0.73	1.12	1.55	1.74	1.52	1.68	3.41
-3.0	0.00	0.25	0.70	0.96	1.22	0.49	0.50	0.84	1.29	1.52	1.29	1.33	2.79
-3.5	0.00	0.15	0.63	0.85	1.07	0.32	0.33	0.65	1.06	1.32	1.08	1.09	2.32
-4.0	0.00	0.08	0.58	0.75	0.92	0.21	0.22	0.52	0.84	1.18	0.93	0.85	1.87
-4.5	0.00	0.02	0.48	0.61	0.74	0.09	0.10	0.38	0.64	1.01	0.78	0.63	1.44
-5.0	0.00	0.01	0.41	0.54	0.66	0.04	0.07	0.32	0.46	0.95	0.71	0.46	1.08
-5.5	0.00	-0.05	0.27	0.37	0.47	-0.09	-0.06	0.15	0.25	0.76	0.51	0.22	0.68
-6.0	0.00	-0.06	0.32	0.32	0.32	-0.08	-0.02	0.18	0.23	0.79	0.53	0.20	0.71
-6.5	0.00	-0.07	0.33	0.31	0.30	-0.04	0.04	0.21	0.25	0.79	0.56	0.26	0.68
-7.0	0.00	-0.09	0.31	0.29	0.28	-0.05	0.06	0.20	0.26	0.76	0.55	0.29	0.67
-7.5	0.00	-0.09	0.33	0.32	0.32	0.05	0.16	0.31	0.35	0.82	0.63	0.37	0.74
-8.0	0.00	-0.10	0.34	0.32	0.31	0.06	0.16	0.31	0.34	0.80	0.60	0.43	0.66
-8.5	0.00	-0.10	0.31	0.28	0.26	0.01	0.12	0.24	0.24	0.70	0.52	0.27	0.43
-9.0	0.00	-0.10	0.33	0.30	0.27	0.05	0.18	0.29	0.30	0.71	0.55	0.43	0.54
-9.5	0.00	-0.08	0.43	0.41	0.39	0.25	0.40	0.52	0.52	0.89	0.78	0.69	0.80
-10.0	0.00	-0.07	0.47	0.45	0.43	0.32	0.47	0.59	0.61	0.93	0.85	0.79	0.89
-10.5	0.00	-0.07	0.50	0.48	0.45	0.38	0.53	0.65	0.67	0.95	0.89	0.85	0.95
-11.0	0.00	-0.03	0.54	0.58	0.62	0.54	0.70	0.83	0.85	1.09	1.06	1.02	1.13
-11.5	0.00	0.02	0.45	0.57	0.68	0.48	0.61	0.76	0.69	0.94	0.94	0.83	0.88
-12.0	0.00	-0.03	0.36	0.50	0.63	0.46	0.59	0.75	0.65	0.88	0.88	0.84	0.84
-12.5	0.00	-0.02	0.32	0.48	0.65	0.48	0.59	0.76	0.62	0.85	0.85	0.79	0.79
-13.0	0.00	-0.01	0.27	0.45	0.62	0.41	0.54	0.69	0.54	0.76	0.76	0.71	0.73
-13.5	0.00	0.02	0.22	0.41	0.59	0.37	0.50	0.64	0.45	0.67	0.66	0.63	0.65
-14.0	0.00	0.05	0.16	0.36	0.55	0.30	0.44	0.57	0.33	0.59	0.57	0.48	0.47
-14.5	0.00	0.01	0.05	0.21	0.37	0.13	0.23	0.34	0.12	0.33	0.33	0.21	0.23
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23	0.00	0.12	0.18	0.05	0.18	0.17	0.06	0.08


SIS-9 土中傾度管變位量歷時曲線圖

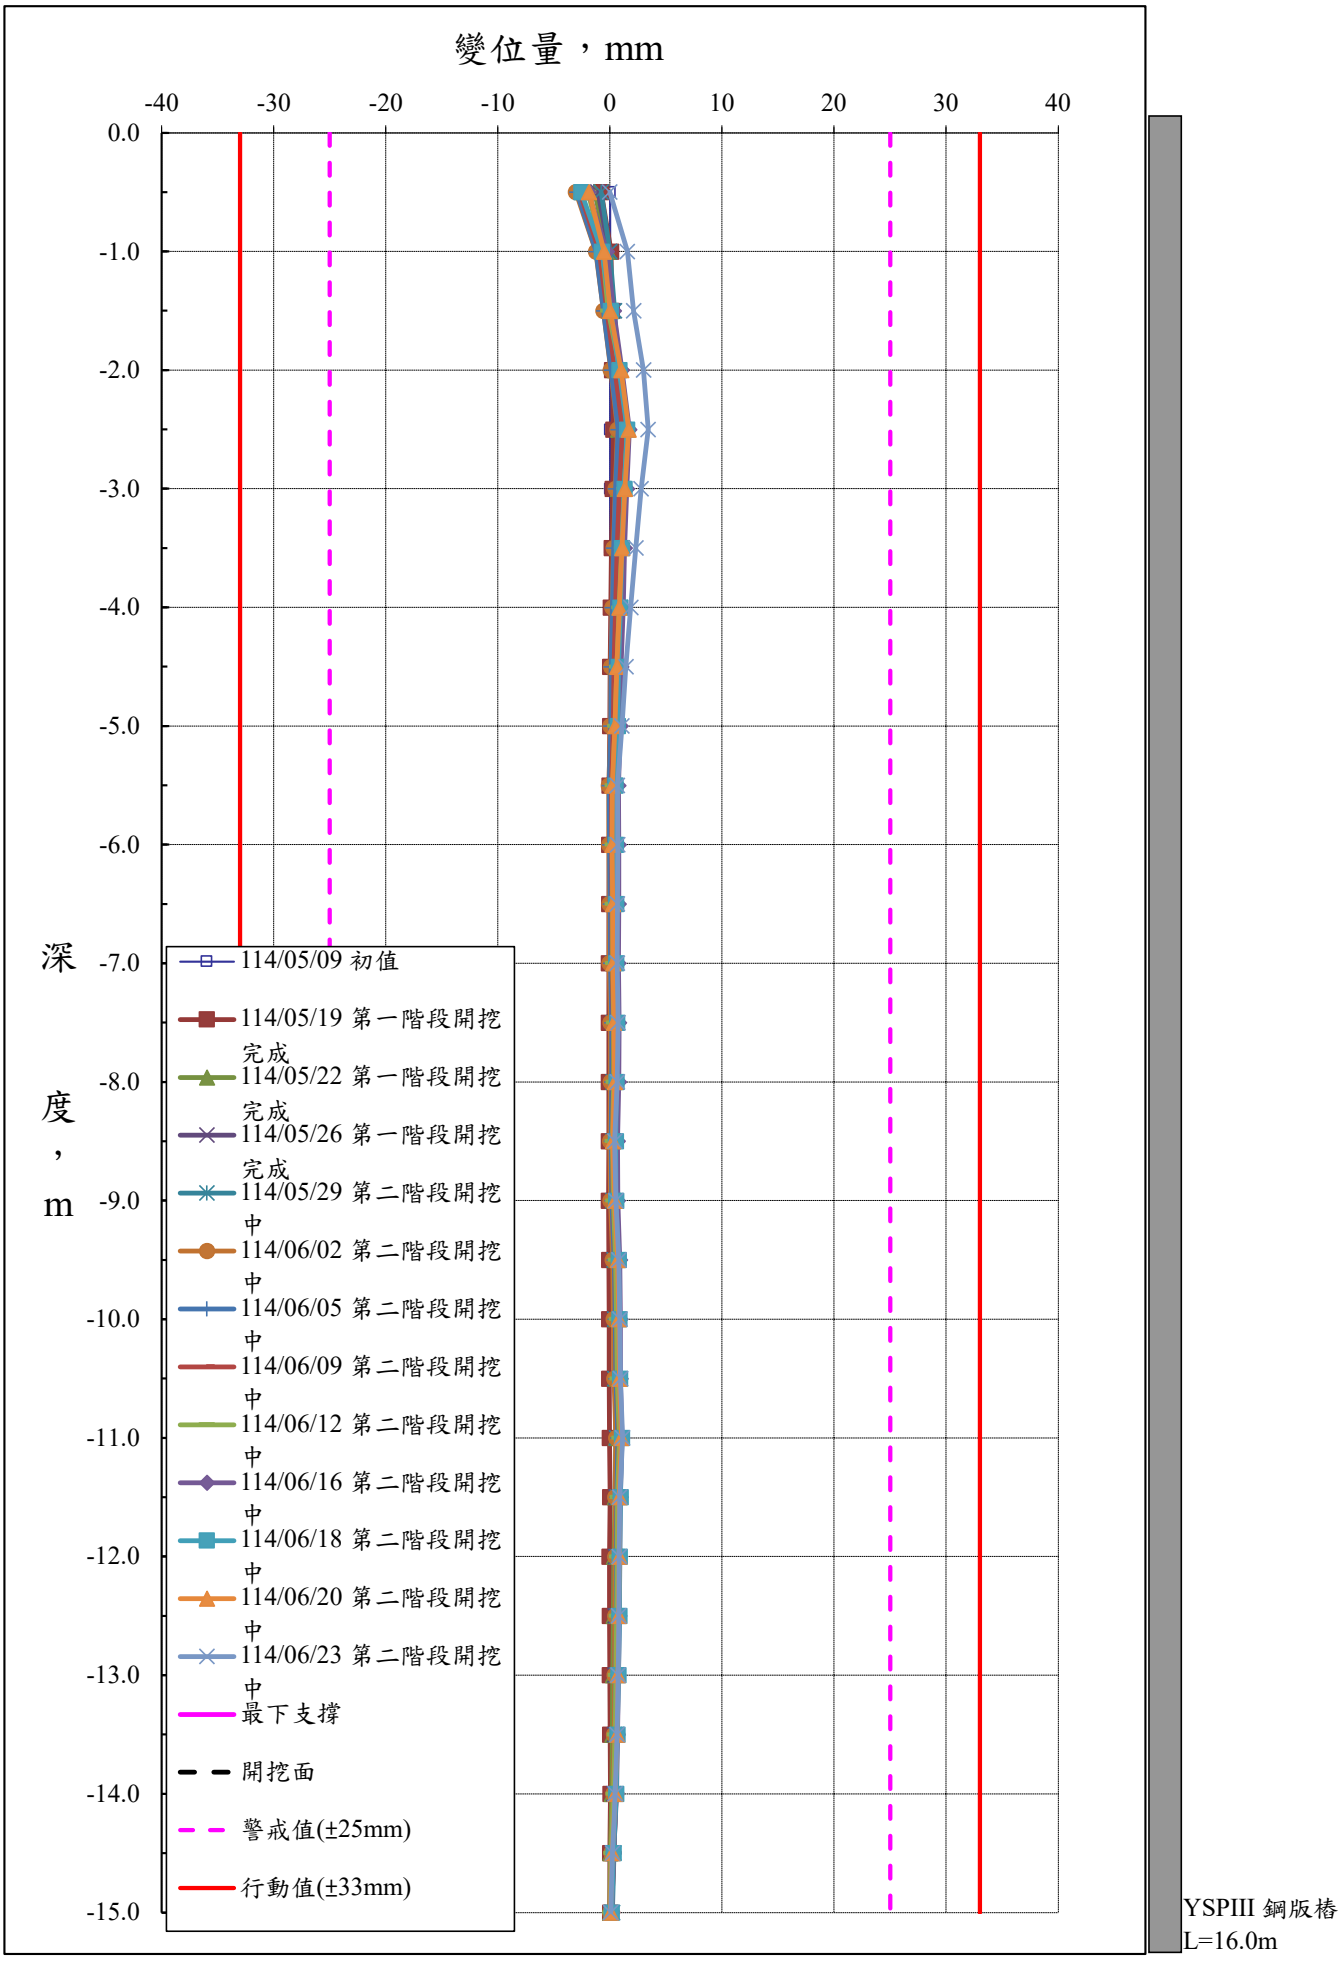

SIS-10 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	0.00	0.69	-0.78	-0.38	0.02	-2.61	-2.25	-2.22	-0.64	-1.37	-1.76	-0.47	-0.33
-1.0	0.00	0.59	-0.24	0.12	0.48	-1.00	-0.76	-0.62	0.44	-0.02	-0.47	0.72	1.05
-1.5	0.00	0.59	0.19	0.52	0.86	-0.13	0.06	0.22	1.14	0.83	0.42	1.52	1.76
-2.0	0.00	0.49	0.27	0.55	0.82	0.01	0.13	0.35	0.65	0.95	0.53	1.35	1.23
-2.5	0.00	0.57	0.68	0.94	1.19	0.60	0.72	0.97	1.32	1.51	1.20	2.05	1.81
-3.0	0.00	0.49	0.56	0.91	1.26	0.48	0.62	0.84	1.24	1.41	1.11	2.01	1.70
-3.5	0.00	0.31	0.27	0.58	0.90	0.09	0.22	0.42	0.82	0.99	0.68	1.59	1.24
-4.0	0.00	0.23	0.26	0.48	0.71	-0.07	0.06	0.26	0.66	0.83	0.51	1.40	0.97
-4.5	0.00	0.18	0.20	0.39	0.59	-0.15	-0.03	0.15	0.52	0.68	0.39	1.26	0.76
-5.0	0.00	0.15	0.21	0.40	0.58	-0.12	0.01	0.19	0.52	0.72	0.43	1.28	0.73
-5.5	0.00	0.17	0.24	0.30	0.37	-0.26	-0.11	0.02	0.38	0.53	0.27	1.12	0.53
-6.0	0.00	0.16	0.33	0.39	0.45	-0.08	0.07	0.18	0.41	0.63	0.42	1.27	0.62
-6.5	0.00	0.14	0.40	0.42	0.44	-0.01	0.14	0.25	0.48	0.65	0.48	1.33	0.68
-7.0	0.00	0.11	0.30	0.35	0.40	-0.11	0.03	0.15	0.35	0.51	0.36	1.19	0.56
-7.5	0.00	0.09	0.33	0.41	0.50	-0.04	0.09	0.24	0.43	0.56	0.40	1.25	0.60
-8.0	0.00	0.06	0.32	0.38	0.44	-0.05	0.08	0.21	0.40	0.51	0.38	1.22	0.56
-8.5	0.00	0.06	0.33	0.41	0.50	0.00	0.14	0.24	0.38	0.51	0.42	1.24	0.56
-9.0	0.00	0.06	0.37	0.43	0.49	0.04	0.18	0.28	0.43	0.51	0.44	1.27	0.59
-9.5	0.00	0.03	0.28	0.49	0.71	0.11	0.25	0.40	0.39	0.58	0.51	1.29	0.59
-10.0	0.00	0.02	0.27	0.48	0.70	0.14	0.26	0.42	0.44	0.58	0.51	1.31	0.63
-10.5	0.00	0.01	0.09	0.52	0.96	0.19	0.33	0.48	0.34	0.65	0.60	0.54	0.55
-11.0	0.00	-0.02	-0.06	0.52	1.11	0.21	0.34	0.51	0.30	0.71	0.64	0.54	0.51
-11.5	0.00	0.00	0.00	0.50	1.01	0.29	0.44	0.60	0.40	0.80	0.72	0.62	0.56
-12.0	0.00	0.01	0.09	0.48	0.88	0.35	0.50	0.66	0.52	0.84	0.78	0.71	0.67
-12.5	0.00	0.02	0.16	0.38	0.59	0.33	0.49	0.57	0.55	0.77	0.73	0.69	0.64
-13.0	0.00	0.02	0.21	0.31	0.42	0.30	0.42	0.49	0.53	0.66	0.64	0.63	0.63
-13.5	0.00	-0.07	-0.02	0.25	0.52	0.16	0.27	0.37	0.29	0.49	0.45	0.42	0.41
-14.0	0.00	-0.08	-0.18	0.29	0.76	0.21	0.27	0.41	0.21	0.48	0.45	0.36	0.30
-14.5	0.00	-0.07	-0.16	0.17	0.51	0.14	0.20	0.31	0.10	0.38	0.35	0.27	0.17
-15.0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.07	0.07	0.03	0.16	0.13	0.10	0.08

SIS-10 土中傾度管變位量歷時曲線圖

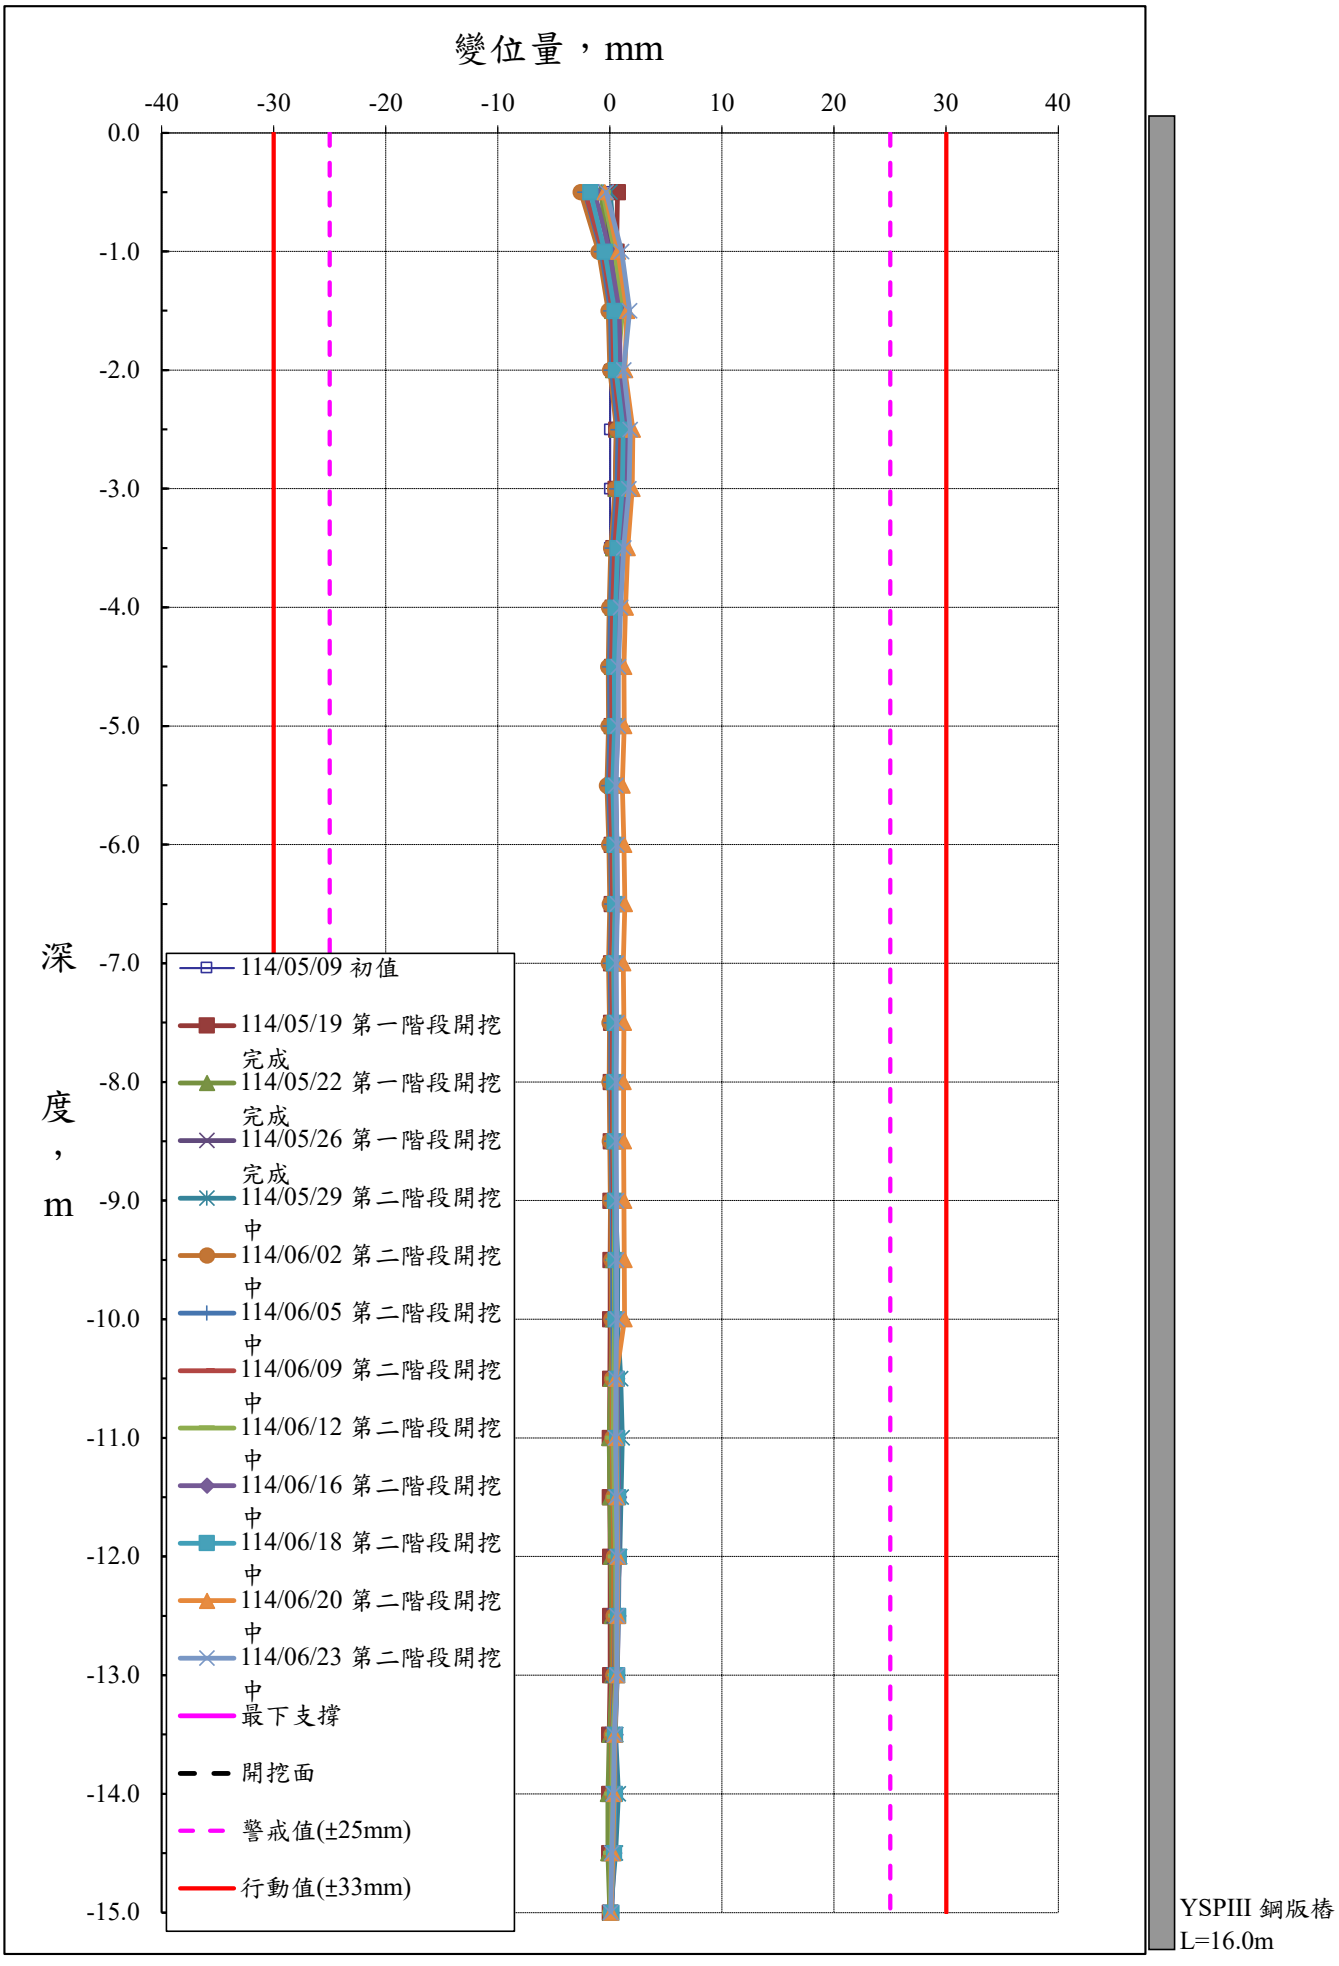

SIS-11 土中傾度管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/05/09	114/05/19	114/05/22	114/05/26	114/05/29	114/06/02	114/06/05	114/06/09	114/06/12	114/06/16	114/06/18	114/06/20	114/06/23
-0.5	因鋼鈑樁打入時9.5M下損壞無法量測	因鋼鈑樁打入時9.5M下損壞無法量測	-4.86	-4.67	-4.48	-5.96	-5.93	-5.76	-5.69	-4.47	-5.33	-5.13	-5.15
-1.0			-1.68	-0.11	1.45	-0.71	-0.61	-0.60	-1.03	0.68	0.01	-1.35	-0.69
-1.5			-0.40	1.23	2.86	0.91	1.01	1.09	0.78	2.23	1.73	0.22	0.82
-2.0			0.07	1.69	3.32	1.59	1.73	1.85	1.44	2.97	2.49	1.18	1.54
-2.5			0.00	1.59	3.18	1.47	1.66	1.80	1.38	2.90	2.46	1.12	1.52
-3.0			-0.18	1.37	2.92	1.14	1.34	1.49	1.09	2.65	2.21	0.87	1.28
-3.5			-0.41	1.05	2.50	0.81	1.06	1.22	0.85	2.39	1.96	0.58	1.06
-4.0			-0.47	0.90	2.26	0.66	0.96	1.13	0.68	2.31	1.87	0.42	0.92
-4.5			-0.49	0.79	2.08	0.55	0.89	1.05	0.52	2.19	1.78	0.32	0.79
-5.0			-0.62	0.58	1.77	0.32	0.67	0.81	0.27	1.91	1.51	0.06	0.48
-5.5			-0.80	0.32	1.45	0.00	0.36	0.48	-0.02	1.50	1.14	-0.24	0.21
-6.0			-0.77	0.22	1.22	-0.16	0.20	0.34	-0.27	1.21	0.91	-0.39	-0.05
-6.5			-0.71	0.22	1.16	-0.11	0.21	0.32	-0.25	1.09	0.84	-0.34	0.00
-7.0			-0.58	0.31	1.21	-0.02	0.23	0.33	-0.16	0.99	0.71	0.09	0.10
-7.5			-0.66	0.27	1.20	-0.05	0.12	0.21	-0.28	0.71	0.46	-0.03	-0.01
-8.0			-0.99	0.06	1.12	-0.21	-0.07	0.00	-0.26	0.31	0.09	-0.05	-0.01
-8.5			-1.06	0.09	1.24	-0.17	-0.02	0.03	-0.18	0.30	0.05	-0.03	0.06
-9.0			-1.09	0.09	1.27	-0.15	-0.01	0.04	0.00	0.24	0.11	-0.13	-0.10
-9.5			-0.89	0.10	1.08	-0.07	0.04	0.09	0.02	0.22	0.15	0.05	0.06
-10.0													
-10.5													
-11.0													
-11.5													
-12.0													
-12.5													
-13.0													
-13.5													
-14.0													
-14.5													
-15.0													

SIS-11 土中傾度管變位量歷時曲線圖

