瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

（連續壁施作完成）

量測日期：114.02.15~114.02.21

承盟工程顧問有限公司
CHENG MENG CO.,LTD.

安全監測系統資料摘要說明

量測期間： 114.02.15~114.02.21 (連續壁施作完成)

監測項目及儀器	最大觀測值 (編號，位置)	注意值	警戒值	行動值	備註
基地環境監測管理值					
水位觀測井	-2.58m(OW-2) 水位變化量：-0.48m	初始值±1m	初始值±2m	初始值±3m	OW2 初始值 -2.10m
沉陷觀測點	-0.60cm(SM-8)	1.2cm	1.4cm	1.7cm	
壁體內傾斜管	3.85mm(SID-1，-1.5m)	18mm	22mm	25mm	
擋土壁鋼筋計	34.1kgf/cm^2(RB-4)	2100kgf/cm^2	2520kgf/cm^2	3360kgf/cm^2	

根據量測資料結果顯示:

1. 水位觀測井最大觀測量為-2.58m(OW-2)，水位變化量為-0.48m，本階段量測未達注意值範圍(初始值±1m)。
2. 本次沉陷觀測點最大觀測值為-0.60cm(SM-8)，本階段量測未達注意值範圍(1.2cm)。
3. 本次壁體內傾斜管最大觀測值為 3.85mm(SID-1，-1.5m)，本階段量測未達注意值範圍(18mm)。
4. 本次擋土壁鋼筋計最大觀測值為 34.1kgf/cm^2(RB-4)，本階段量測未達注意值範圍(2100kgf/cm^2)。

結論：

本階段(連續壁施作完成)量測結果顯示皆未達注意值範圍，除持續監測相關資料變化，同時加強控管工區作業流程及品質，以確保基地之安全。

瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

目錄

		頁次
圖 1	基地安全監測系統配置圖 ----------	1
表 1	水位觀測井量測記錄 ----------	2
表 2	沉陷觀測點之高程與累積沉陷量 ----------	3
圖 2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係 ----------	4
表 3	SID-1壁體內傾斜管量測記錄 ----------	5
圖 3	SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	6
表 4	SID-2壁體內傾斜管量測記錄 ----------	7
圖 4	SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	8
表 5	擋土壁鋼筋計監測報表 ----------	9
圖 5	擋土壁鋼筋計歷時曲線圖 ----------	10
圖 6	監測記錄照片 ----------	11

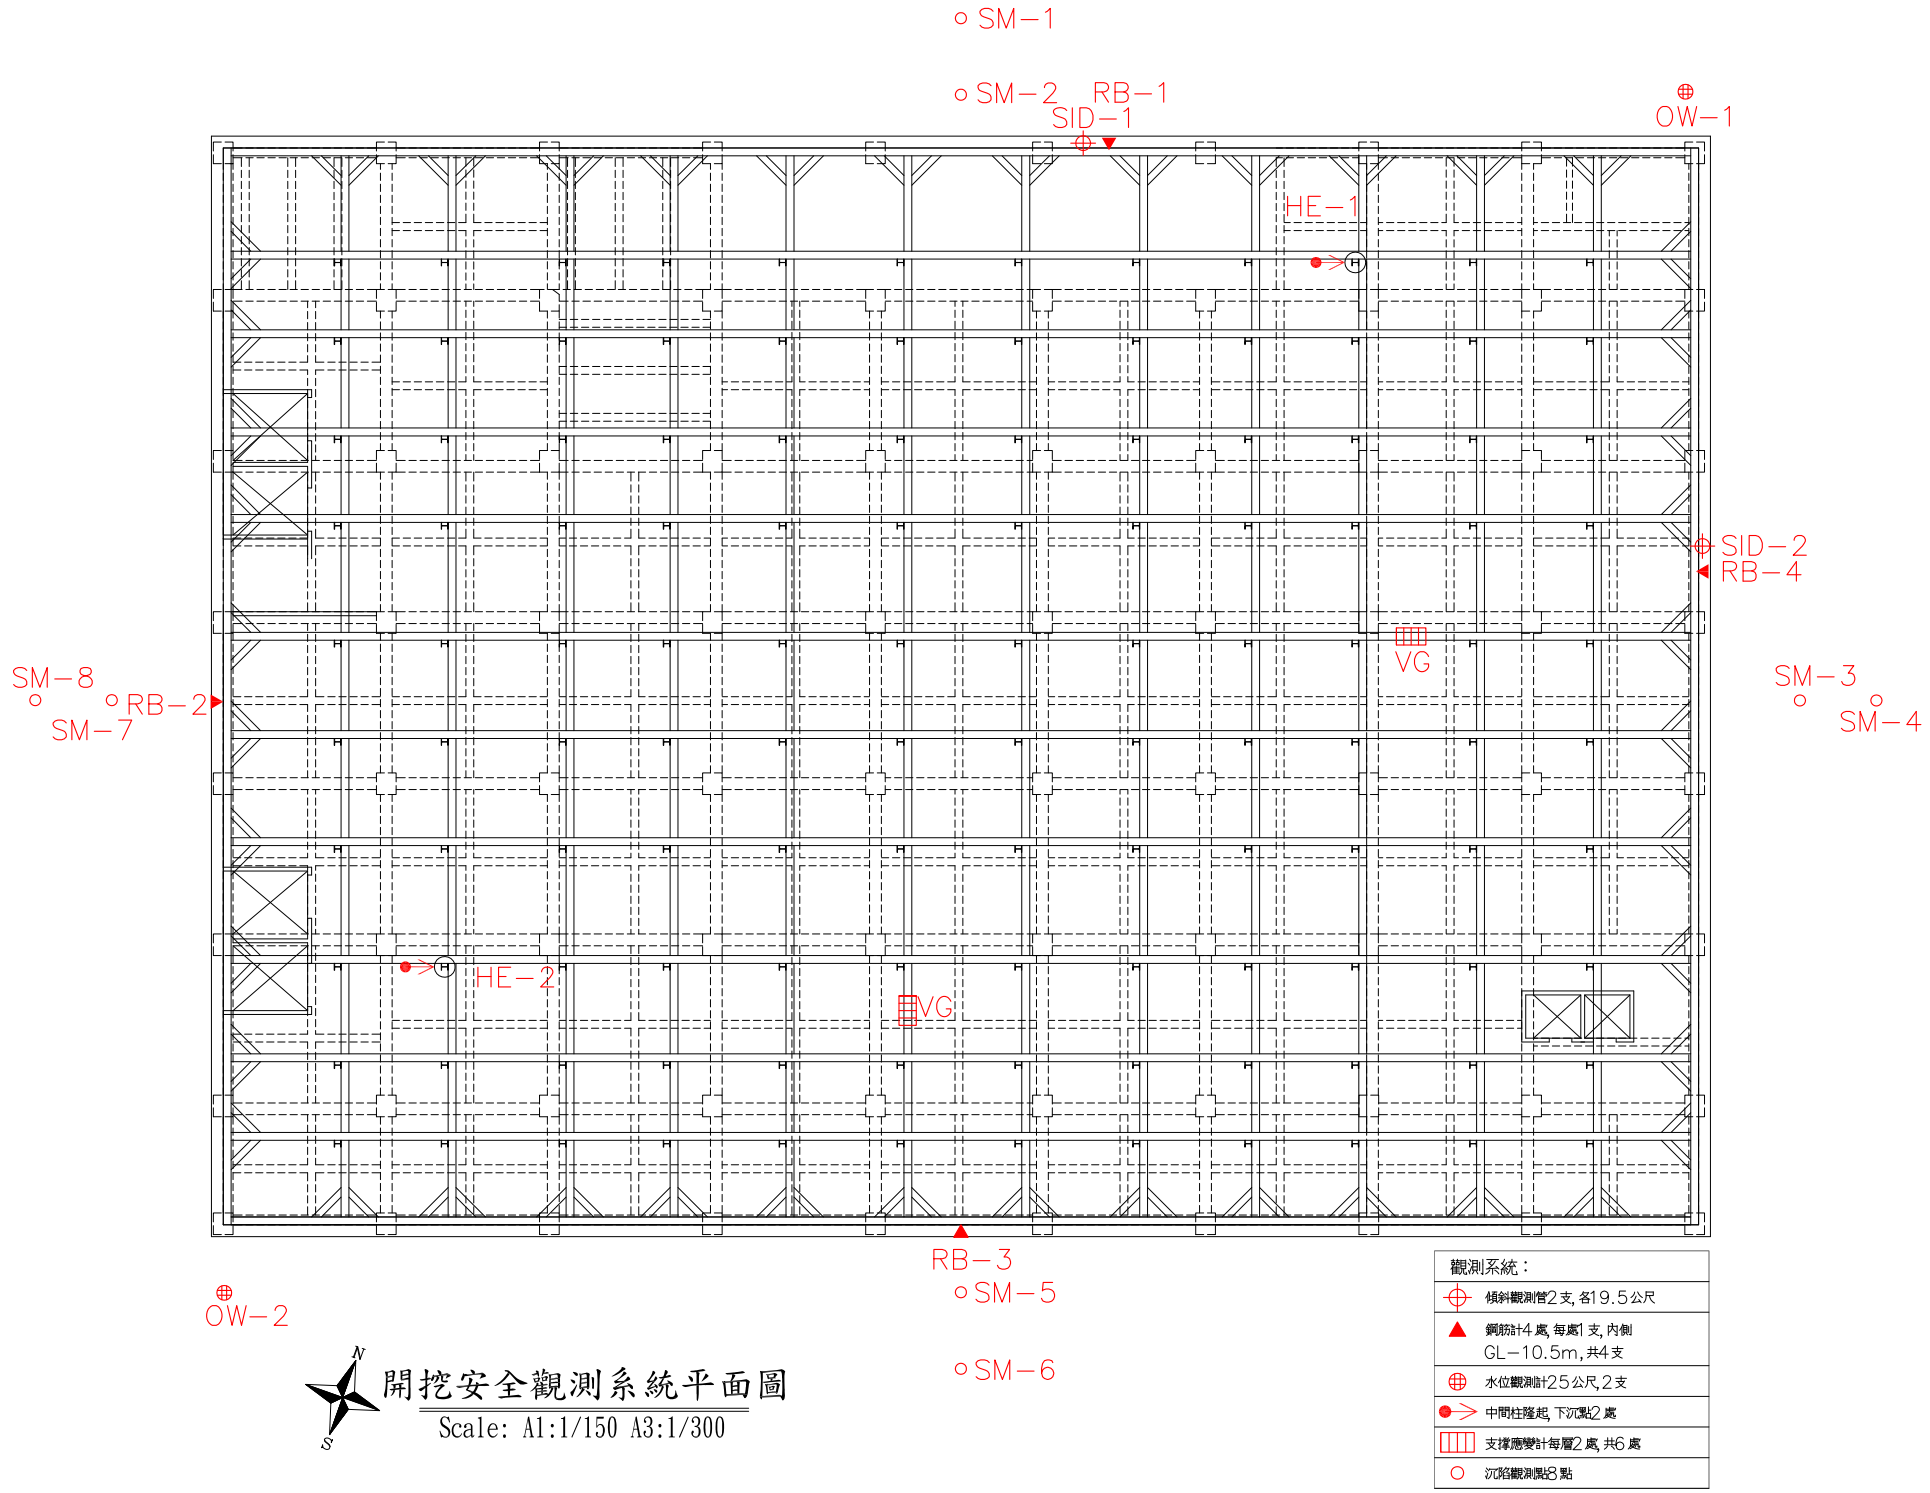


圖 1 基地安全監測系統配置圖

表 1

水位觀測井量測記錄

編號	OW-1 （初始值-2.98m）	OW-2 （初始值-2.10m）	備註
日期	測量值深度(_m)		
114/1/3	-3.75	-2.50	連續壁施作中
114/1/4	-3.66	-2.50	連續壁施作中
114/1/6	-3.77	-2.56	連續壁施作中
114/1/13	-3.11	-2.46	連續壁施作完成
114/1/16	-3.11	-2.49	連續壁施作完成
114/1/18	-3.07	-2.50	連續壁施作完成
114/1/20	-3.10	-2.55	連續壁施作完成
114/1/25	-3.21	-2.74	連續壁施作完成
114/1/29	-3.17	-2.55	連續壁施作完成
114/2/1	-3.20	-2.64	連續壁施作完成
114/2/5	-3.13	-2.63	連續壁施作完成
114/2/10	-3.15	-2.58	連續壁施作完成
114/2/13	-3.18	-2.63	連續壁施作完成
114/2/17	-3.12	-2.59	連續壁施作完成
114/2/20	-3.10	-2.58	連續壁施作完成

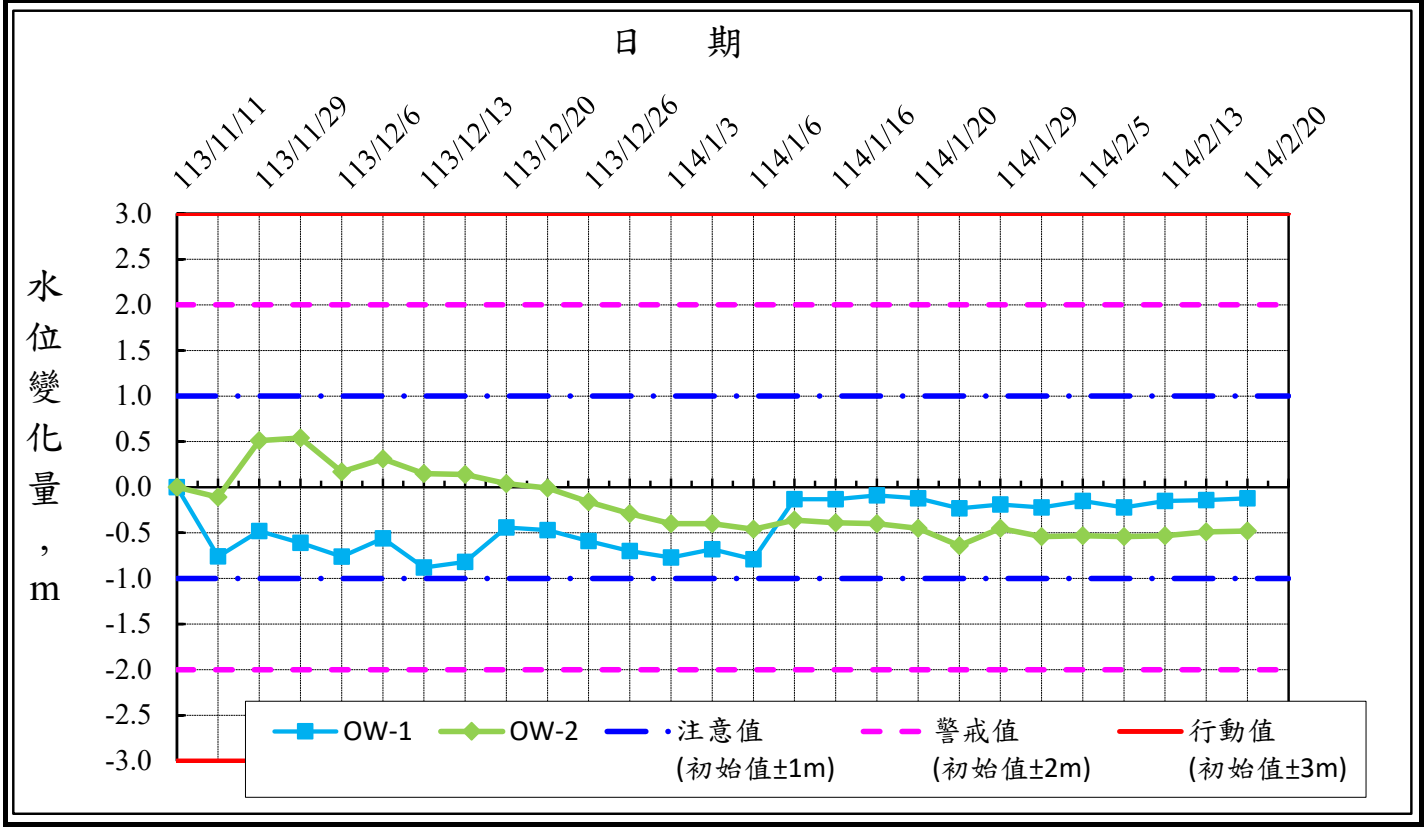


表 2

沉陷觀測點之高程與累積沉陷量

高程	初始高程(cm)	前次高程(cm)							本次高程(cm)	累積沉陷量(cm)
日期 / 測點	113/11/22	113/12/26	114/1/3	114/1/6	114/1/16	114/1/20	114/2/5	114/2/13	114/2/20	114/2/20
SM-1	26.12	25.85	25.79	25.95	25.87	25.87	25.93	25.69	25.84	-0.28
SM-2	○	30.51	○	30.90	○	○	○	38.29	38.46	0.17
SM-3	41.06	40.93	40.91	40.93	40.98	40.86	41.02	40.74	40.91	-0.14
SM-4	44.23	44.29	44.13	44.14	44.09	44.12	44.33	43.99	44.17	-0.06
SM-5	24.46	23.96	23.85	23.93	23.94	23.94	23.93	23.89	24.03	-0.43
SM-6	25.49	25.14	25.04	25.14	25.18	25.16	25.15	25.08	25.16	-0.32
SM-7	2.35	5.10	4.95	5.19	25.18	4.92	5.19	4.99	5.01	-0.11
SM-8	-8.49	-8.22	-8.30	-8.11	25.18	-8.27	-8.14	-8.53	-8.77	-0.60

說明：
1.量測單位：公分
2.累積沉陷量的符號說明：+ 代表上浮 ，-代表沉陷
3.計算公式：累積沉陷量=本次量測高程-初始高程
4.○ 遭施工或車輛阻礙 X 遭破壞
5.基準點位置分別為BM-1 ，假設高程:GL=+1.00m
6.紅色數據表示該點位因遭破壞而新補點的高程初始值

地表
注意值 :1.2cm
警戒值 :1.4cm
行動值 :1.7cm

圖 2

各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係

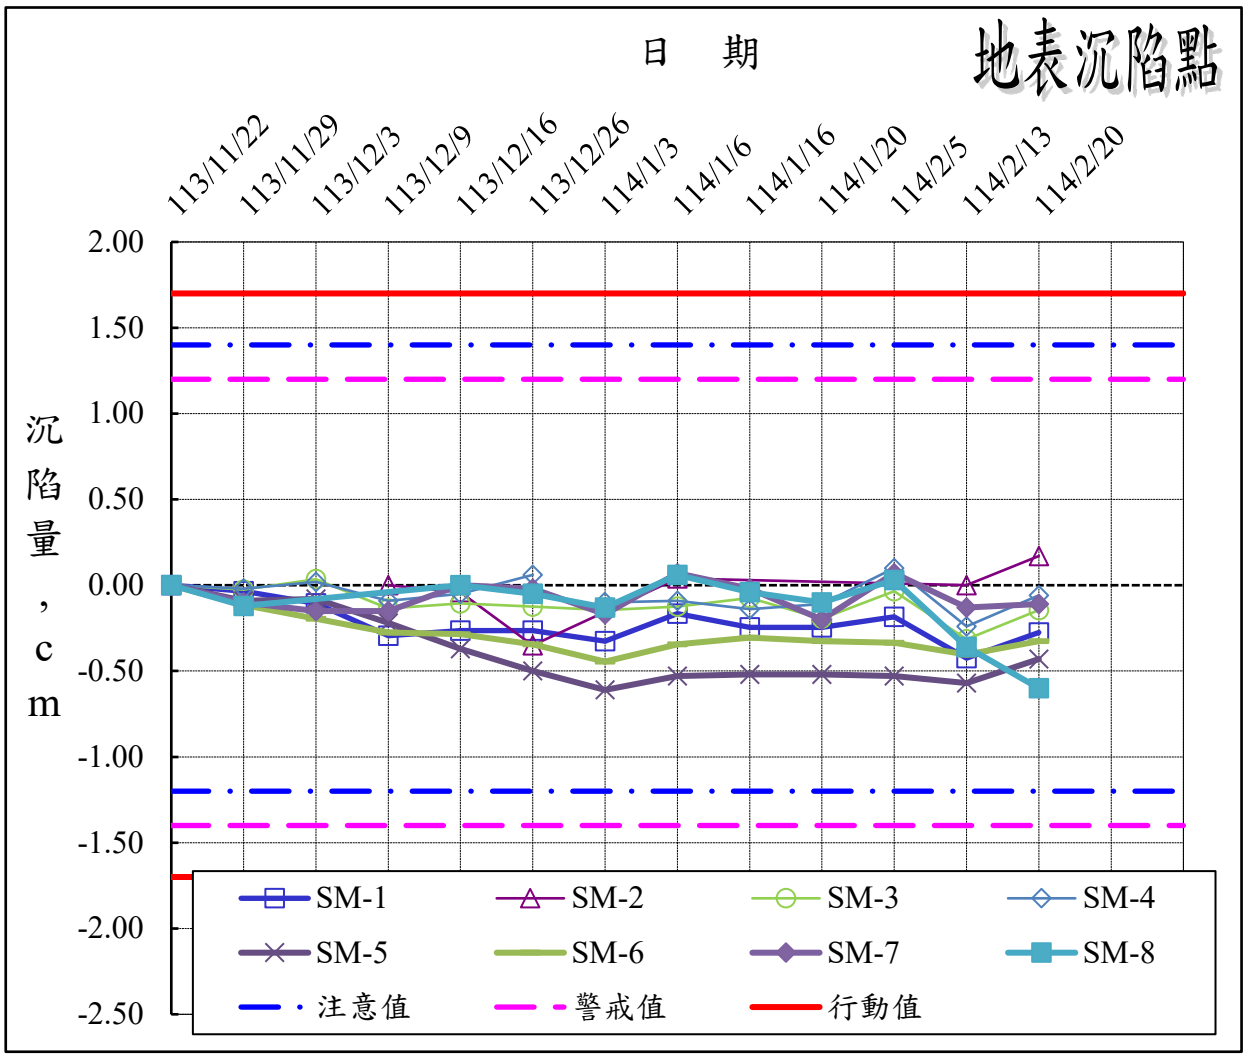


表 3

SID-1 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/1/16	114/1/20	114/2/5	114/2/13	114/2/20					
	累積變位量，mm									
-0.5	0.00	1.87	3.33	6.24	7.33					
-1.0	0.00	1.39	2.54	3.07	4.11					
-1.5	0.00	1.32	2.41	2.82	3.85					
-2.0	0.00	1.32	2.39	2.77	3.77					
-2.5	0.00	1.27	2.35	2.75	3.73					
-3.0	0.00	1.24	2.31	2.73	3.74					
-3.5	0.00	1.23	2.23	2.70	3.72					
-4.0	0.00	1.20	2.13	2.61	3.61					
-4.5	0.00	1.17	2.02	2.52	3.49					
-5.0	0.00	1.18	2.01	2.45	3.36					
-5.5	0.00	1.16	1.94	2.37	3.24					
-6.0	0.00	1.16	1.85	2.29	3.11					
-6.5	0.00	1.12	1.90	2.24	2.95					
-7.0	0.00	1.10	1.86	2.13	2.77					
-7.5	0.00	1.06	1.79	2.00	2.58					
-8.0	0.00	1.02	1.72	1.89	2.45					
-8.5	0.00	0.98	1.60	1.75	2.33					
-9.0	0.00	0.95	1.49	1.68	2.24					
-9.5	0.00	0.85	1.30	1.57	2.13					
-10.0	0.00	0.77	1.19	1.42	1.95					
-10.5	0.00	0.70	1.08	1.33	1.71					
-11.0	0.00	0.64	0.96	1.20	1.57					
-11.5	0.00	0.53	0.80	1.04	1.44					
-12.0	0.00	0.45	0.74	0.92	1.20					
-12.5	0.00	0.41	0.64	0.84	1.04					
-13.0	0.00	0.31	0.50	0.70	0.95					
-13.5	0.00	0.24	0.34	0.55	0.82					
-14.0	0.00	0.19	0.23	0.41	0.66					
-14.5	0.00	0.16	0.17	0.31	0.46					
-15.0	0.00	0.11	0.12	0.22	0.34					
-15.5	0.00	0.08	0.02	0.12	0.27					
-16.0	0.00	0.04	-0.10	0.02	0.31					
-16.5	0.00	0.00	-0.13	-0.05	0.17					
-17.0	0.00	-0.03	-0.17	-0.09	0.12					
-17.5	0.00	-0.03	-0.18	-0.10	0.08					
-18.0	0.00	-0.01	-0.18	-0.08	0.08					
-18.5	0.00	-0.03	-0.17	-0.06	0.07					
-19.0	0.00	-0.03	-0.11	-0.07	0.03					
-19.5	0.00	-0.01	-0.09	-0.03	0.05					
-20.0	0.00	0.00	-0.04	-0.05	-0.11					
備註:0~-1M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 3

各階段施工的 SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係

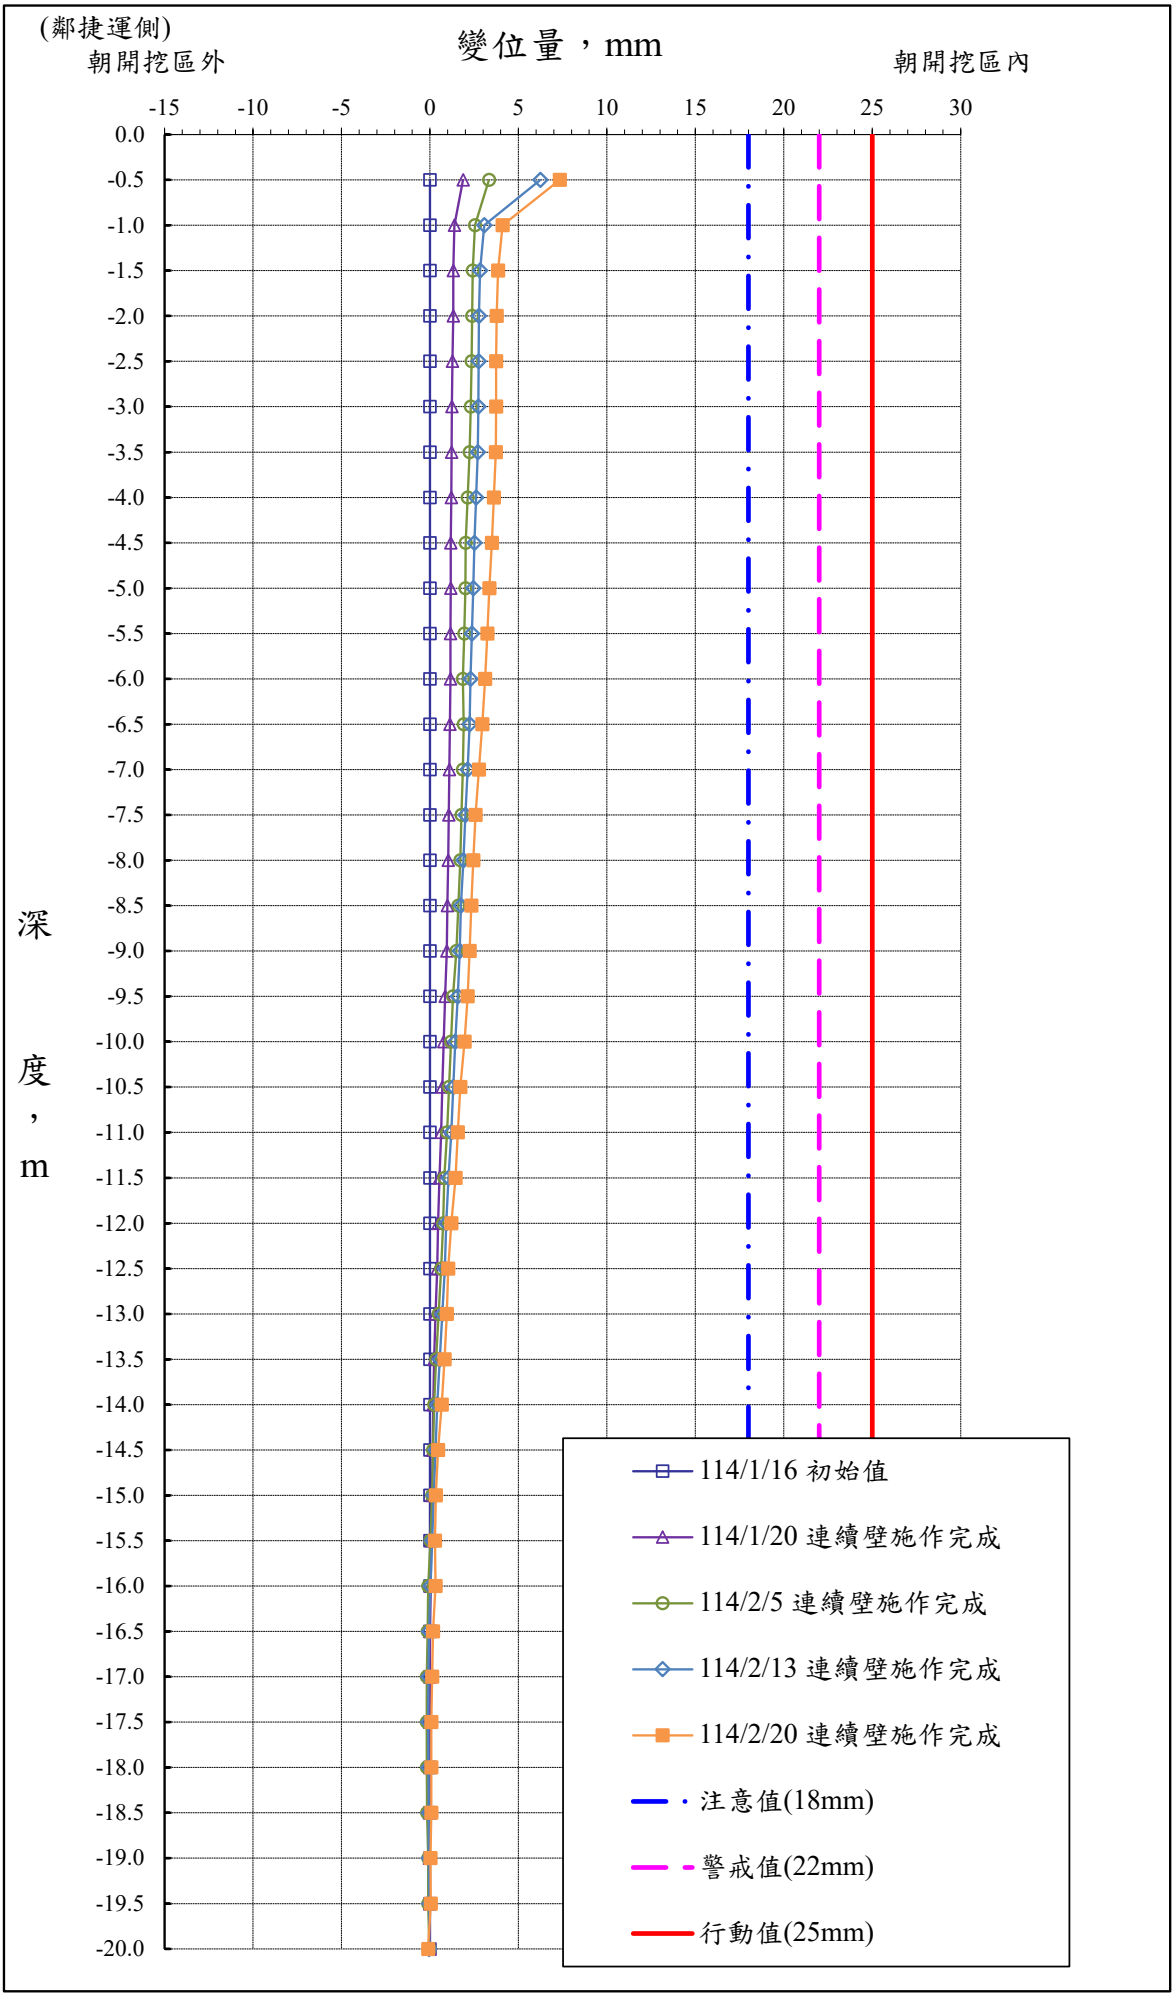


表 4

SID-2 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/1/16	114/1/20	114/2/5	114/2/13	114/2/20					
	累積變位量，mm									
-0.5	0.00	0.70	1.49	2.79	2.90					
-1.0	0.00	0.43	0.74	1.27	1.17					
-1.5	0.00	0.37	0.68	1.16	1.09					
-2.0	0.00	0.37	0.68	1.12	1.01					
-2.5	0.00	0.40	0.70	1.11	0.95					
-3.0	0.00	0.40	0.72	1.15	0.93					
-3.5	0.00	0.39	0.73	1.18	0.96					
-4.0	0.00	0.40	0.75	1.20	0.93					
-4.5	0.00	0.39	0.76	1.22	0.93					
-5.0	0.00	0.38	0.78	1.27	0.96					
-5.5	0.00	0.39	0.80	1.30	1.00					
-6.0	0.00	0.38	0.80	1.30	0.97					
-6.5	0.00	0.36	0.77	1.28	0.94					
-7.0	0.00	0.34	0.73	1.25	0.93					
-7.5	0.00	0.31	0.70	1.24	0.95					
-8.0	0.00	0.32	0.69	1.21	0.94					
-8.5	0.00	0.32	0.71	1.24	0.91					
-9.0	0.00	0.30	0.68	1.20	0.87					
-9.5	0.00	0.27	0.61	1.13	0.80					
-10.0	0.00	0.27	0.57	1.00	0.65					
-10.5	0.00	0.28	0.52	0.90	0.53					
-11.0	0.00	0.30	0.57	0.96	0.51					
-11.5	0.00	0.28	0.59	1.00	0.51					
-12.0	0.00	0.25	0.59	1.05	0.57					
-12.5	0.00	0.22	0.56	1.07	0.70					
-13.0	0.00	0.20	0.55	1.14	0.85					
-13.5	0.00	0.17	0.56	1.20	0.90					
-14.0	0.00	0.15	0.59	1.26	0.93					
-14.5	0.00	0.12	0.57	1.30	0.96					
-15.0	0.00	0.11	0.51	1.25	0.98					
-15.5	0.00	0.11	0.47	1.18	0.93					
-16.0	0.00	0.12	0.50	1.20	0.90					
-16.5	0.00	0.12	0.53	1.25	0.97					
-17.0	0.00	0.11	0.52	1.26	1.00					
-17.5	0.00	0.11	0.59	1.36	1.01					
-18.0	0.00	0.09	0.59	1.38	1.05					
-18.5	0.00	-0.01	0.55	1.45	1.26					
-19.0	0.00	-0.03	0.43	1.22	1.32					
-19.5	0.00	0.01	0.30	0.73	0.55					
-20.0	0.00	0.03	0.13	0.30	0.17					
備註:0~-1M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 4

各階段施工的 SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係

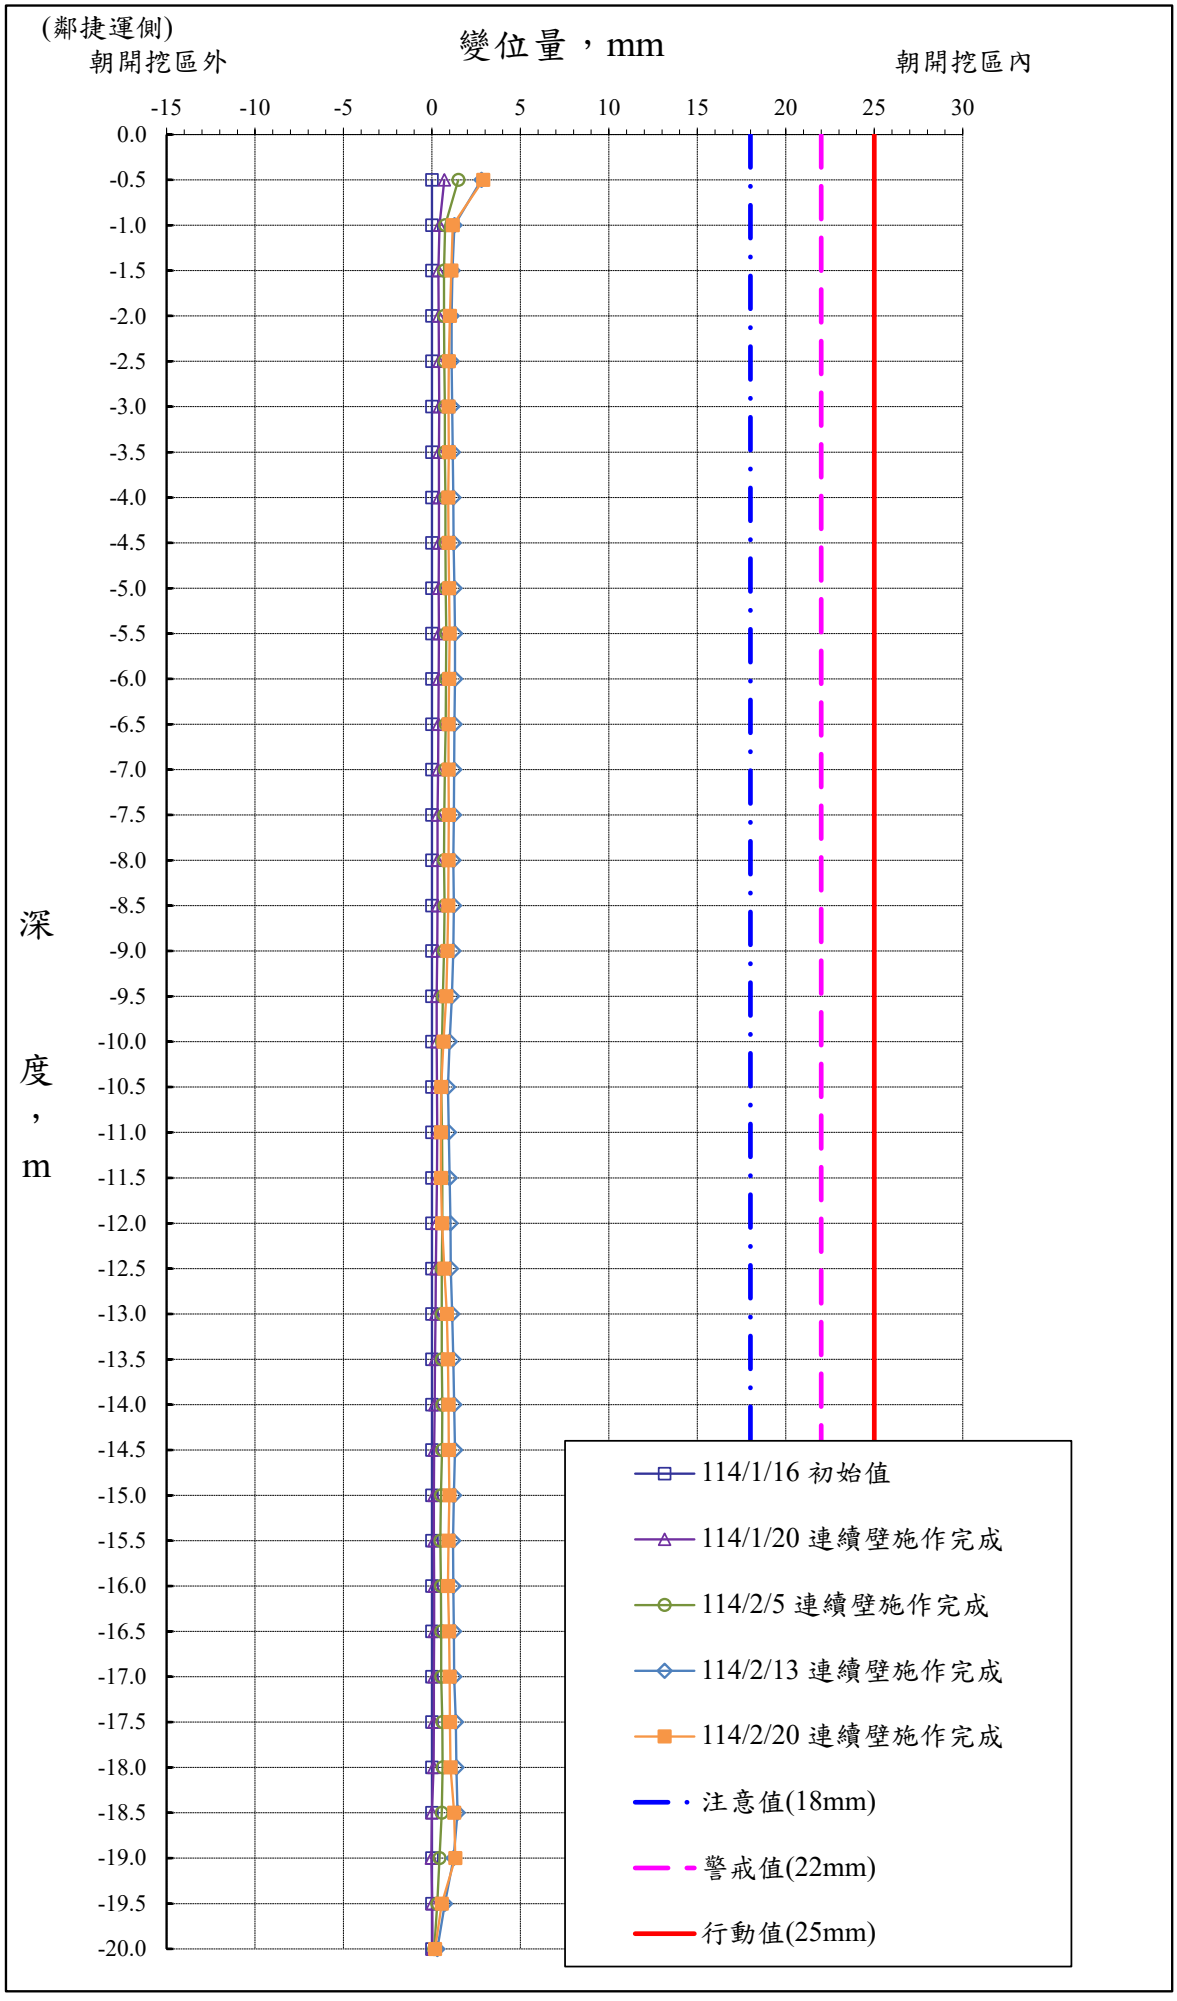


表 5

大地監測報表--擋土壁鋼筋計監測報表

觀測儀器： 擋土壁鋼筋計(RB)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 鋼筋應力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*鋼筋彈性模數*(10^-6)

觀測日期： 114年 2月 17日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	6411.5	2.8	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6448.0	35.2	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 2月 20日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	6412.0	3.4	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	-	-	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	-	-	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6447.0	34.1	2100/2520	3360

圖 5　瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

擋土壁鋼筋計歷時曲線圖

日期	114/1/16	114/1/18	114/1/20	114/1/25	114/1/29	114/2/1	114/2/5	114/2/10	114/2/13	114/2/17	114/2/20					
儀器編號	初始值	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完	連續壁施作完					
RB-1	0.0	1.7	3.9	3.8	4.4	5.5	8.4	10.1	6.7	2.8	3.4					
RB-2	-	-	0.0	5.6	1.1	2.2	-	-	-	-	-					
RB-3	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-					
RB-4	0.0	9.1	14.8	27.3	30.2	32.4	31.3	31.3	34.7	35.2	34.1					

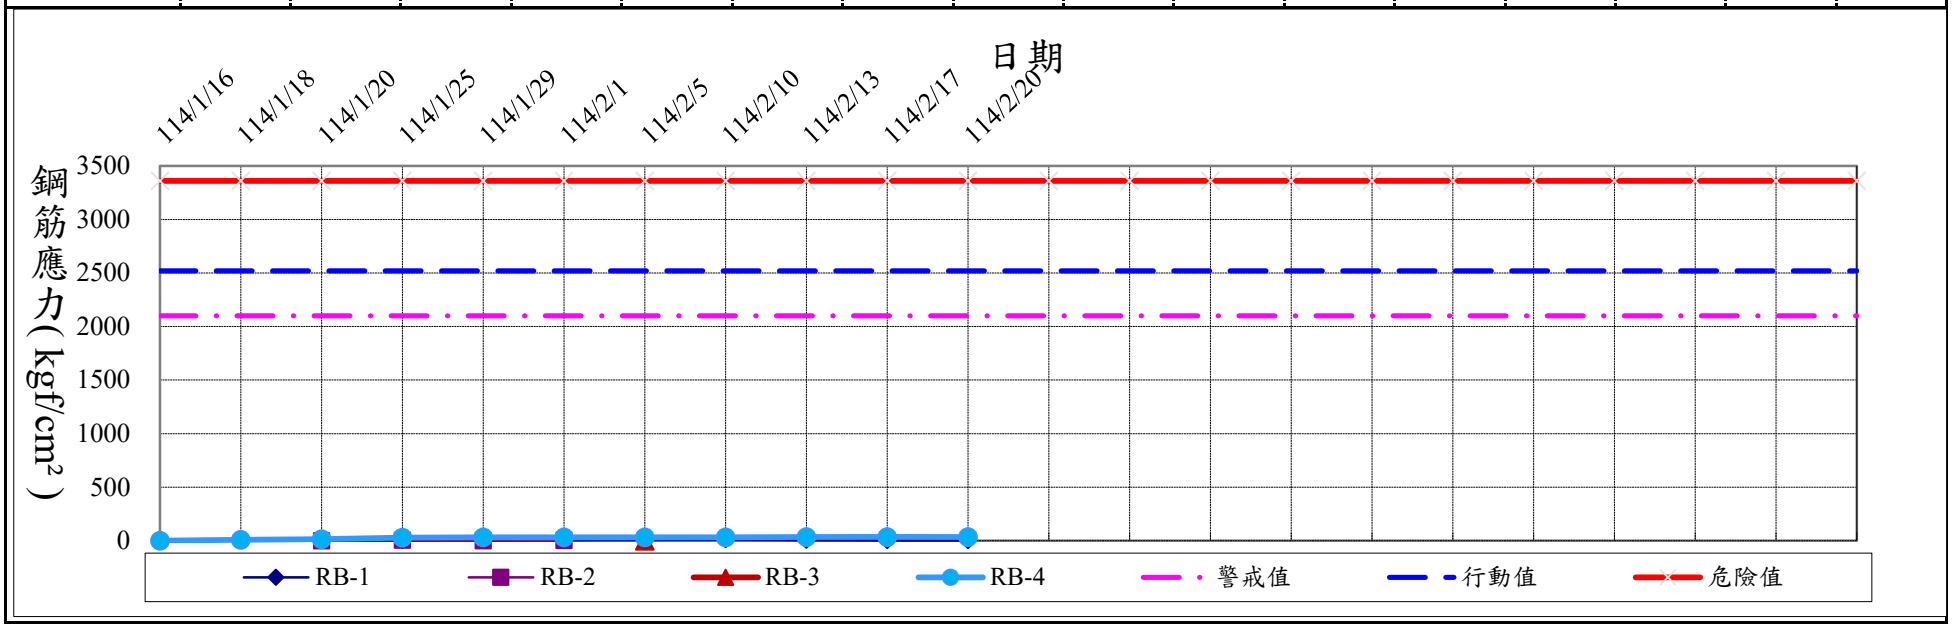


圖 6 監測記錄照片















