瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

（第二階段開挖中）

量測日期：114.05.03~114.05.09

承盟工程顧問有限公司
CHENG MENG CO.,LTD.

安全監測系統資料摘要說明

量測期間： 114.05.03~114.05.09 (第二階段開挖中)

監測項目及儀器	最大觀測值 (編號，位置)	注意值	警戒值	行動值	備註
基地環境監測管理值					
水位觀測井	-4.66m(OW-1) 水位變化量：-1.68m -3.77m(OW-2) 水位變化量：-1.67m	初始值±1m	初始值±2m	初始值±3m	OW-1 初始值 -2.98m OW-2 初始值 -2.10m
沉陷觀測點	-1.12cm(SM-5)	1.2cm	1.4cm	1.7cm	
中間柱隆起點	0.02cm(HE-2)	3.0cm	4.0cm	5.0cm	
壁體內傾斜管	16.40mm(SID-2，-5.0m)	18mm	22mm	25mm	
擋土壁鋼筋計	61.8kgf/cm^2(RB-4)	2100kgf/cm^2	2520kgf/cm^2	3360kgf/cm^2	
支撐應變計 (第一層支撐)	116.8t(VG-103)	120t	145t	160t	

根據量測資料結果顯示:

1. 水位觀測井最大觀測量為-4.66m(OW-1)，水位變化量為-1.68m、-3.77m(OW-2)，水位變化量為-1.67m，本階段量測已達注意值範圍(初始值±1m)。
2. 本次沉陷觀測點最大觀測值為-1.12cm(SM-5)，本階段量測未達注意值範圍(1.2cm)。
3. 本次中間柱隆起點最大觀測值為 0.02cm(HE-2)，本階段量測未達注意值範圍(3.0cm)。
4. 本次壁體內傾斜管最大觀測值為 16.40mm(SID-2，-5.0m)，本階段量測未達注意值範圍(18mm)。
5. 本次擋土壁鋼筋計最大觀測值為 61.8kgf/cm^2(RB-4)，本階段量測未達注意值範圍(2100kgf/cm^2)。
6. 本次第一層支撐之支撐應變計最大觀測值為 116.8t(VG-103)，本階段量測未達注意值範圍(120t)。

結論：

本階段(土方開挖中)量測結果顯示水位觀測井 OW-1 觀測值-4.66m，水位變化量-1.68m、OW-2 觀測值-3.77m，水位變化量-1.67m，已達注意值範圍(初始值±1m)，除持續監測相關資料變化，同時加強控管工區作業流程及品質，以確保基地之安全。


瑞儀光電股份有限公司

瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

基礎開挖安全監測工作

目錄

		頁次
圖 1	基地安全監測系統配置圖 ----------	1
表 1	水位觀測井量測記錄 ----------	2
表 2	沉陷觀測點之高程與累積沉陷量 ----------	3
圖 2	各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係 ----------	4
表 3	SID-1壁體內傾斜管量測記錄 ----------	5
圖 3	SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	6
表 4	SID-2壁體內傾斜管量測記錄 ----------	7
圖 4	SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係 ----------	8
表 5	擋土壁鋼筋計監測報表 ----------	9
表 5-1	擋土壁鋼筋計監測報表 ----------	10
圖 5	擋土壁鋼筋計歷時曲線圖 ----------	11
表 6	支撐應變計監測日報表 ----------	12
表 6-1	支撐應變計監測日報表 ----------	13
圖 6	第一層支撐應變計歷時曲線圖 ----------	14
圖 7	監測記錄照片 ----------	15

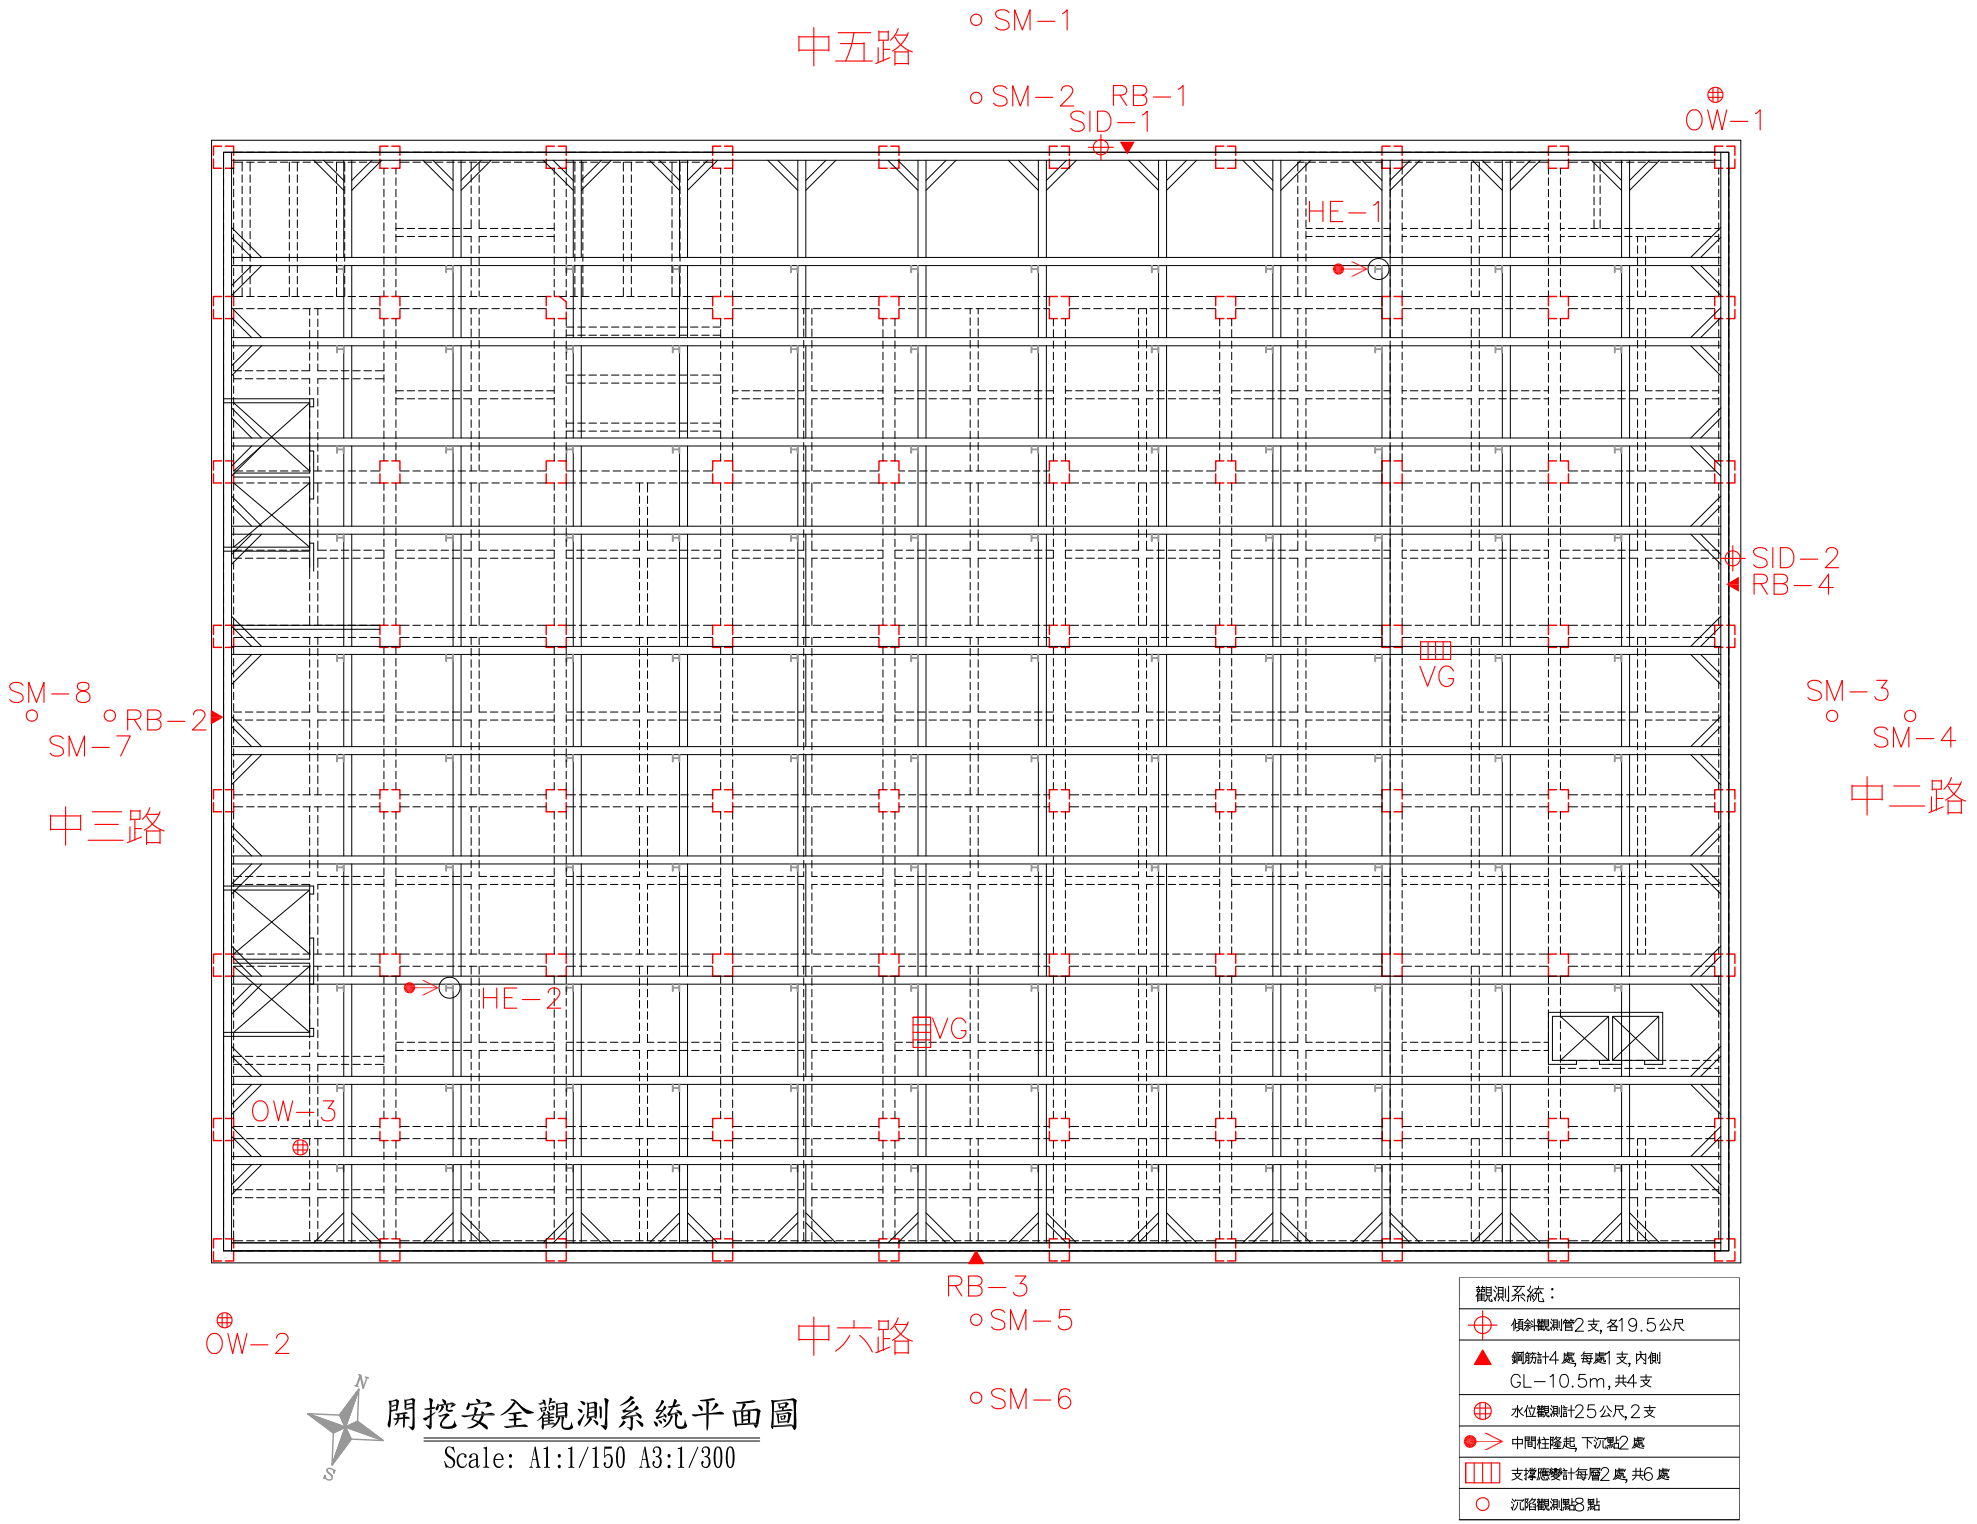

開挖安全觀測系統平面圖

Scale: A1:1/150 A3:1/300

圖 1 基地安全監測系統配置圖

表 1

水位觀測井量測記錄

編號	OW-1 （初始值-2.98m）	OW-2 （初始值-2.10m）	OW-3 （初始值-8.18m）	備註
日期	測量值深度(_m)			
114/3/13	-3.19	-2.66		連續壁施作完成
114/3/17	-3.16	-2.65		連續壁施作完成
114/3/20	-3.11	-2.63		連續壁施作完成
114/3/24	-3.23	-2.75		連續壁施作完成
114/3/28	-4.29	-3.09		連續壁施作完成
114/3/31	-3.40	-2.96		連續壁施作完成
114/4/4	-3.35	-2.91		連續壁施作完成
114/4/7	-3.44	-3.19		土方開挖中
114/4/10	-3.40	-3.03		土方開挖中
114/4/14	-4.39	-3.69		土方開挖中
114/4/16	-3.40	-3.28		土方開挖中
114/4/21	-4.65	-4.66		土方開挖中
114/4/25	-5.16	-5.33		土方開挖中
114/4/28	-5.34	-4.12		土方開挖中
114/5/2	-4.80	-3.53	-8.18	土方開挖中
114/5/5	-4.70	-3.60	-8.31	土方開挖中
114/5/7	-4.66	-3.77	-8.53	土方開挖中

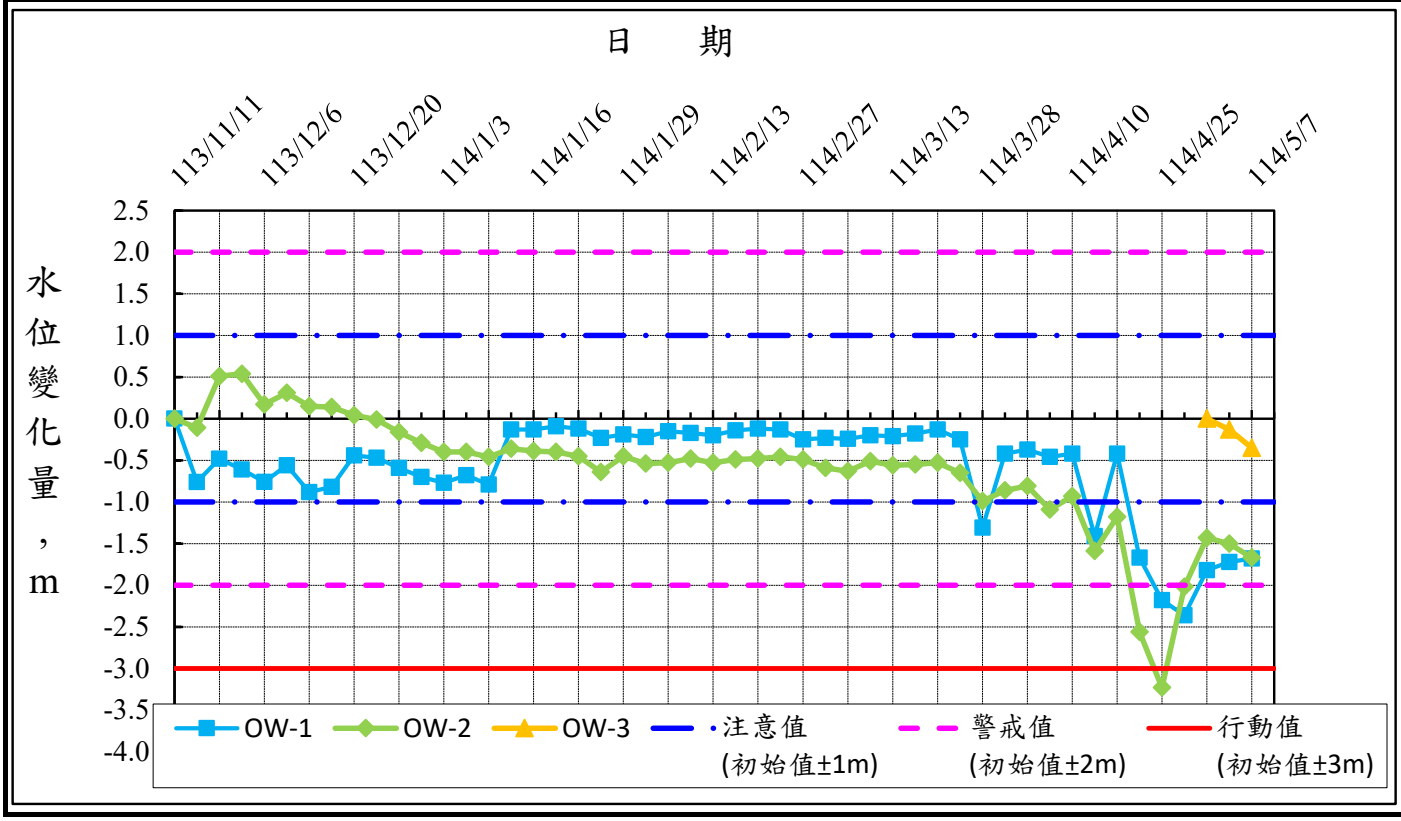


表 2

沉陷觀測點之高程與累積沉陷量

高程	初始高程(cm)	前次高程(cm)							本次高程(cm)	累積沉陷量(cm)
日期 / 測點	113/11/22	114/3/20	114/3/28	114/3/31	114/4/10	114/4/16	114/4/21	114/4/28	114/5/7	114/5/7
SM-1	26.12	25.69	25.32	25.74	25.71	25.42	25.41	25.29	25.17	-0.94
SM-2	38.29	38.17	37.81	38.07	○	37.77	37.89	37.62	37.54	-0.75
SM-3	41.06	40.72	40.72	40.82	40.86	40.82	40.73	40.60	40.44	-0.61
SM-4	44.23	44.32	44.05	44.15	44.24	44.18	44.12	44.04	43.93	-0.30
SM-5	24.46	○	23.98	23.58	23.74	23.53	○	23.33	23.34	-1.12
SM-6	25.49	25.21	24.58	○	24.83	24.67	24.62	24.45	24.45	-1.03
SM-7	5.12	5.16	5.04	5.04	4.79	4.71	4.58	4.13	4.08	-1.04
SM-8	-8.17	-8.60	-8.78	-8.69	-8.74	-8.86	-8.92	-8.85	-9.19	-1.02
HE-1	-1.40							-1.40	-1.39	0.01
HE-2	3.50							3.50	3.52	0.02

說明：
1.量測單位：公分
2.累積沉陷量的符號說明：+ 代表上浮 ，-代表沉陷
3.計算公式：累積沉陷量=本次量測高程-初始高程
4.○ 遭施工或車輛阻礙 X 遭破壞
5.基準點位置分別為BM-1 ，假設高程:GL=+1.00m
6.中間柱隆起點之基準點位置為現場控制點 ，高程:GL=+1.50m
7.紅色數據表示該點位因遭破壞而新補點的高程初始值

地表
注意值 :1.2cm
警戒值 :1.4cm
行動值 :1.7cm

圖 2

各沉陷觀測點與累積沉陷量之關係

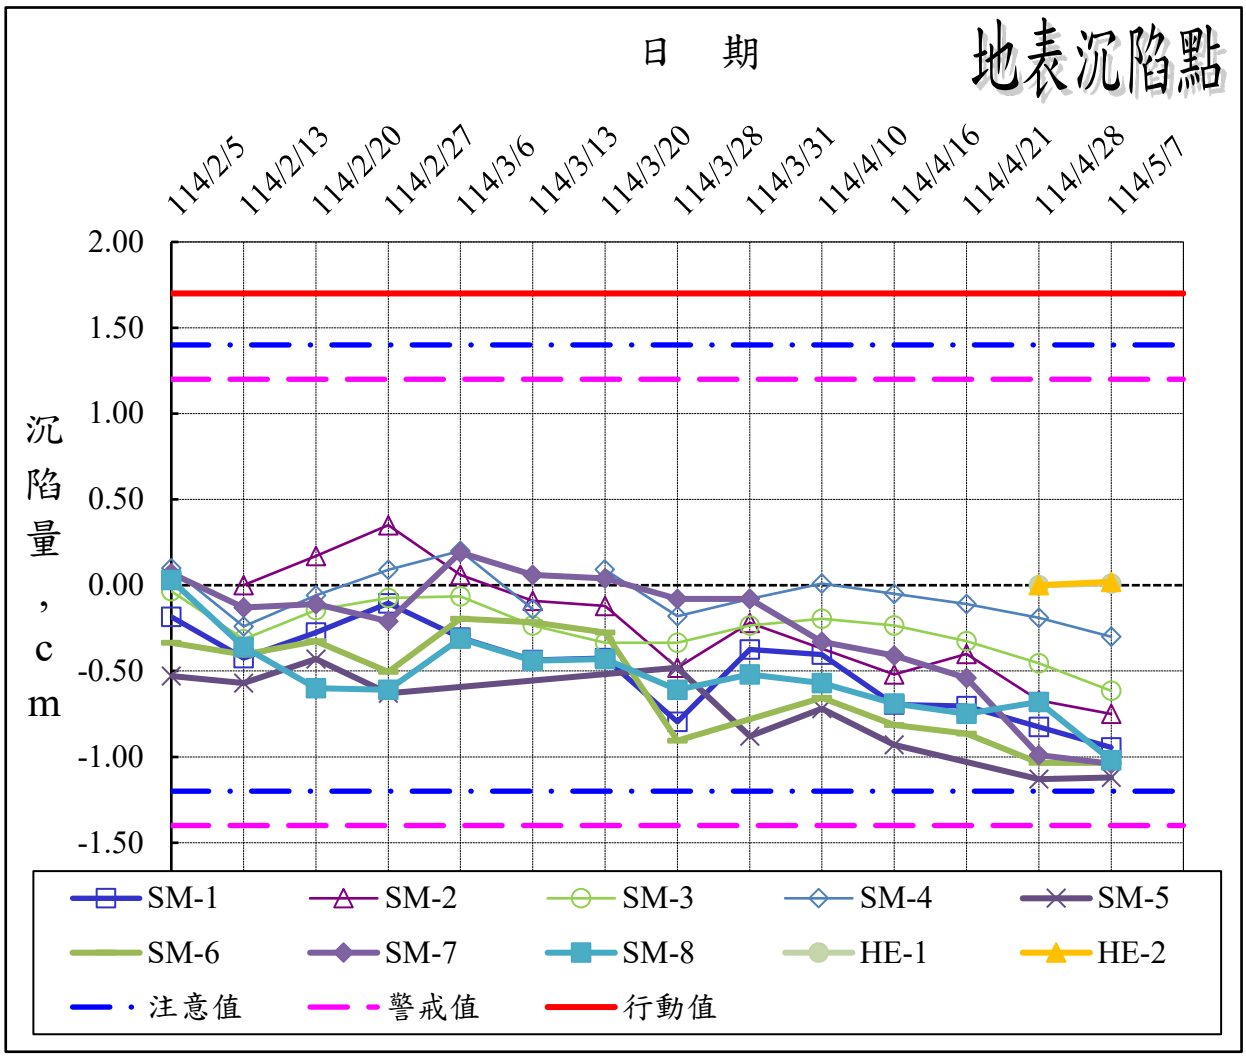


表 3

SID-1 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/3/31	114/4/10	114/4/16	114/4/18	114/4/21	114/4/26	114/4/28	114/5/1	114/5/7	114/5/8
	累積變位量，mm									
-0.5	19.14	22.19	35.35	43.74	53.78	54.42	47.77	41.11	44.80	46.21
-1.0	15.41	18.00	27.33	32.46	38.77	36.47	33.07	29.67	29.51	29.60
-1.5	14.75	17.16	20.80	22.47	23.91	21.79	19.39	16.98	16.24	15.52
-2.0	14.25	16.62	18.70	19.43	19.67	18.26	15.94	13.61	13.08	12.54
-2.5	13.84	16.18	18.09	18.76	18.96	17.58	15.46	13.34	13.05	12.55
-3.0	13.48	15.71	17.45	18.08	18.29	16.82	14.93	13.03	13.02	12.51
-3.5	13.09	15.24	16.79	17.41	17.61	16.09	14.42	12.75	13.03	12.45
-4.0	12.63	14.70	16.09	16.67	16.85	15.33	13.86	12.40	12.97	12.36
-4.5	12.18	14.14	15.35	15.88	16.07	14.57	13.28	12.00	12.90	12.28
-5.0	11.67	13.56	14.65	15.14	15.29	13.90	12.79	11.68	12.86	12.25
-5.5	11.18	12.93	13.90	14.37	14.52	13.15	12.22	11.29	12.74	12.16
-6.0	10.61	12.32	13.20	13.63	13.72	12.47	11.70	10.93	12.63	12.08
-6.5	9.98	11.76	12.63	12.98	12.95	12.02	11.36	10.70	12.62	12.19
-7.0	9.39	11.12	11.91	12.21	12.18	11.36	10.84	10.32	12.43	12.04
-7.5	8.80	10.44	11.16	11.44	11.40	10.66	10.28	9.90	12.18	11.83
-8.0	8.21	9.80	10.45	10.69	10.62	10.02	9.74	9.46	11.91	11.61
-8.5	7.75	9.26	9.76	9.99	9.95	9.29	9.13	8.98	11.56	11.23
-9.0	7.30	8.72	9.11	9.34	9.31	8.66	8.60	8.54	11.24	10.88
-9.5	6.88	8.22	8.42	8.68	8.70	7.94	7.97	8.00	10.80	10.40
-10.0	6.34	7.61	7.76	7.98	8.03	7.35	7.44	7.52	10.34	9.98
-10.5	5.69	6.96	7.12	7.29	7.31	6.85	6.99	7.13	9.85	9.53
-11.0	5.19	6.44	6.59	6.71	6.69	6.41	6.58	6.75	9.38	9.12
-11.5	4.76	5.97	5.99	6.12	6.13	5.79	6.01	6.22	8.84	8.52
-12.0	4.20	5.41	5.49	5.56	5.52	5.39	5.63	5.88	8.35	8.11
-12.5	3.73	4.94	5.04	5.06	4.99	5.04	5.29	5.54	7.86	7.64
-13.0	3.41	4.53	4.52	4.54	4.53	4.52	4.78	5.04	7.29	7.04
-13.5	3.07	4.11	3.95	4.00	4.06	3.87	4.18	4.49	6.65	6.35
-14.0	2.65	3.64	3.47	3.50	3.52	3.41	3.72	4.03	6.05	5.73
-14.5	2.14	3.21	3.10	3.10	3.05	3.22	3.49	3.76	5.56	5.29
-15.0	1.77	2.85	2.76	2.71	2.64	2.94	3.17	3.40	5.04	4.81
-15.5	1.55	2.55	2.36	2.31	2.27	2.44	2.69	2.94	4.31	4.23
-16.0	1.49	2.28	1.91	1.92	1.93	1.79	2.06	2.33	3.67	3.51
-16.5	1.20	2.00	1.62	1.59	1.60	1.50	1.77	2.04	3.19	3.05
-17.0	0.95	1.75	1.33	1.28	1.29	1.15	1.41	1.68	2.70	2.55
-17.5	0.72	1.57	1.15	1.07	1.03	0.98	1.20	1.42	2.32	2.19
-18.0	0.58	1.43	0.97	0.87	0.82	0.72	0.92	1.12	1.90	1.76
-18.5	0.47	1.05	1.17	0.87	0.63	0.46	0.64	0.82	1.49	1.31
-19.0	0.28	0.62	0.41	0.39	0.42	0.35	0.49	0.62	1.15	1.00
-19.5	0.15	0.04	0.02	0.09	0.21	0.08	0.20	0.32	0.71	0.60
-20.0	-0.14	-0.25	-0.65	-0.34	0.00	0.04	0.08	0.12	0.35	0.30
備註:0~-1.5M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 3

各階段施工的 SID-1壁體內傾斜管變位量與深度之關係

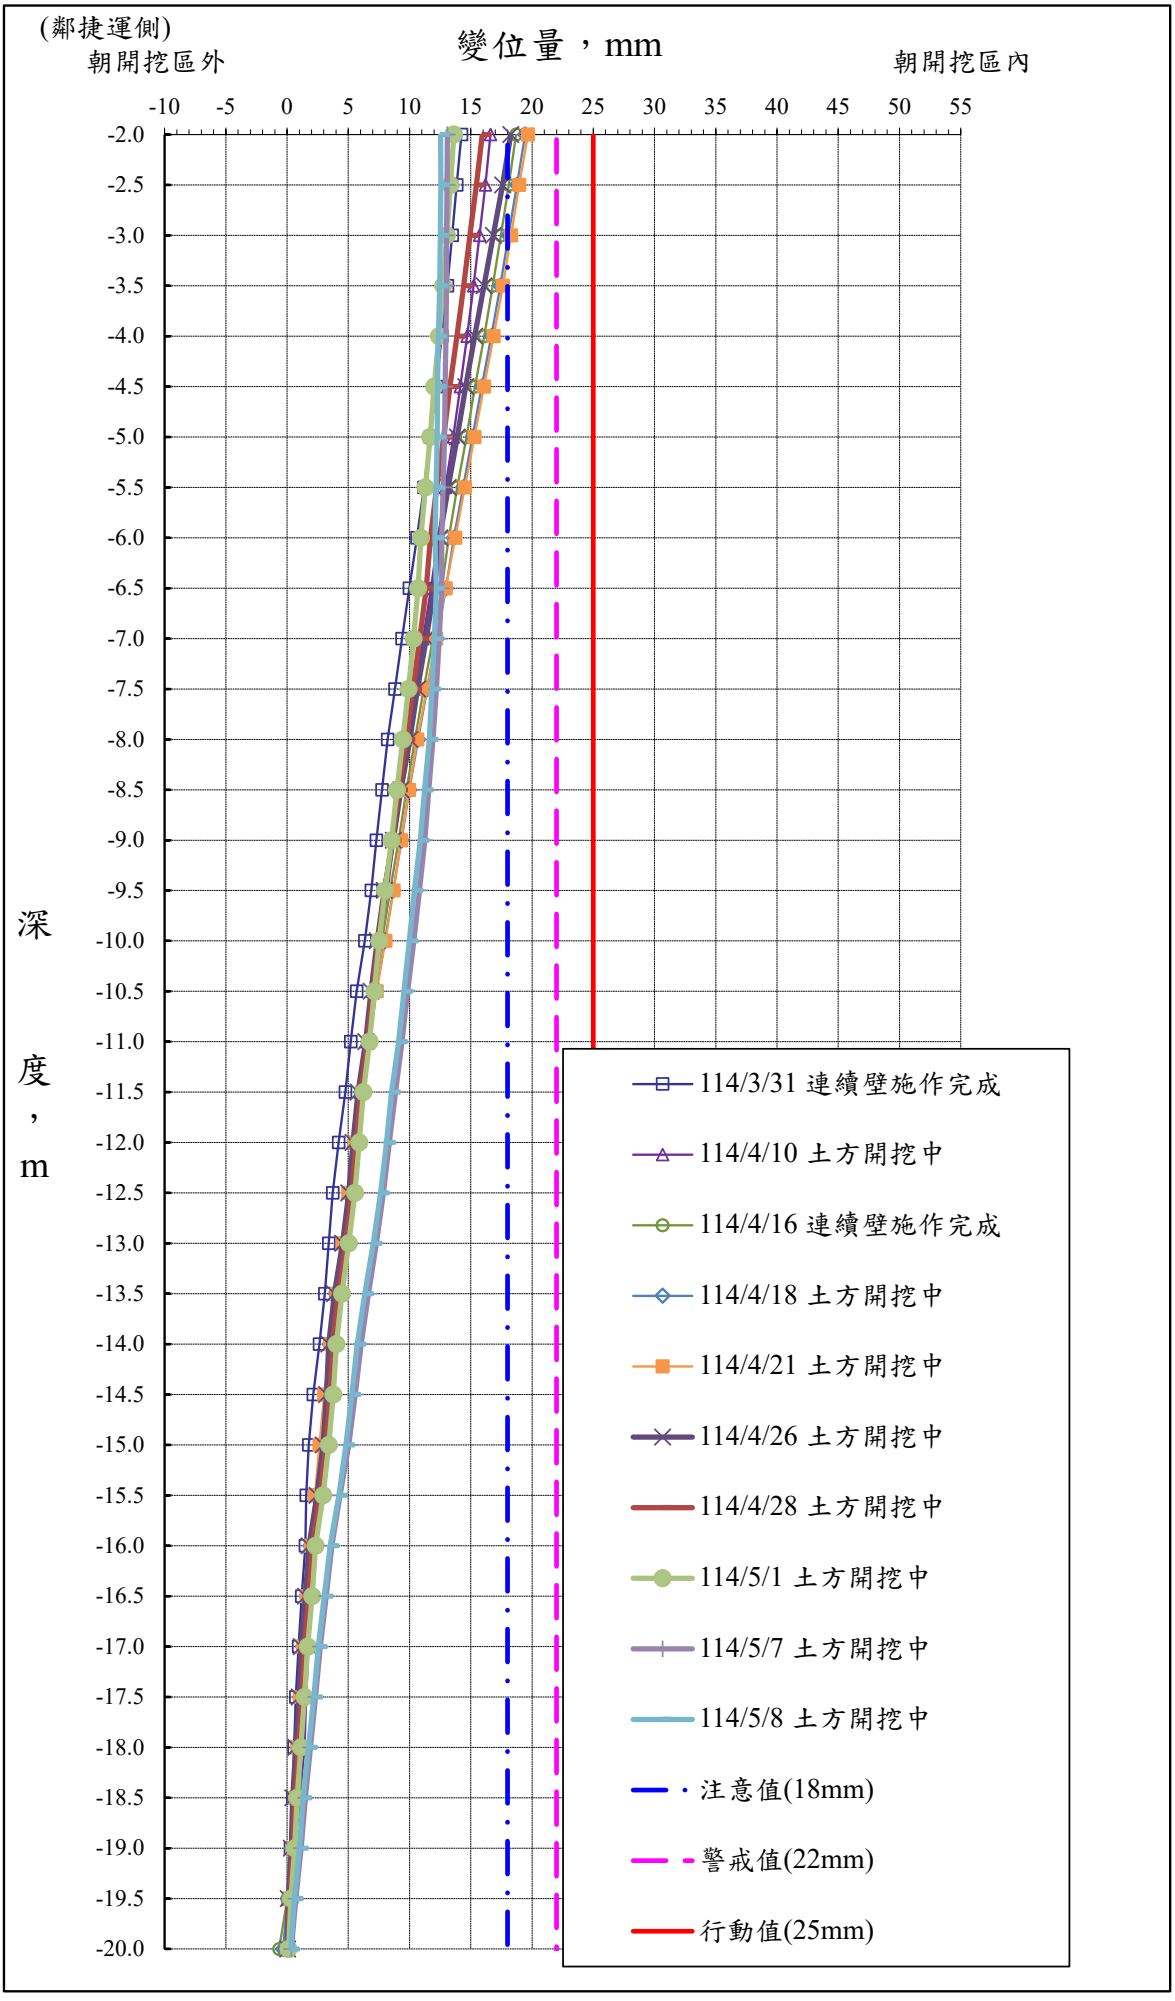


表 4

SID-2 壁體內傾斜管量測記錄

量測日期 / 深度(m)	114/3/28	114/3/31	114/4/10	114/4/18	114/4/21	114/4/26	114/4/28	114/5/1	114/5/7	114/5/8
	累積變位量，mm									
-0.5	7.65	12.90	17.20		6.69	15.17	4.23	-6.71	5.86	3.72
-1.0	6.10	11.20	15.37		13.91	14.55	9.62	4.68	7.26	4.91
-1.5	6.06	11.04	15.12		21.84	16.64	14.94	13.24	10.89	7.82
-2.0	5.98	10.87	14.89		21.71	16.37	14.96	13.56	11.48	8.52
-2.5	7.46	12.37	16.38		22.36	17.12	16.00	14.88	13.01	10.19
-3.0	8.12	12.98	16.94		22.49	17.27	16.44	15.62	13.96	11.29
-3.5	9.23	14.01	17.95		22.83	17.84	17.27	16.71	15.29	12.79
-4.0	10.51	15.26	19.27		23.45	18.58	18.29	18.00	16.87	14.42
-4.5	10.77	15.49	19.44		23.22	18.44	18.43	18.41	17.53	15.11
-5.0	11.95	16.59	20.52		23.62	18.90	19.15	19.41	18.76	16.40
-5.5	10.65	15.20	19.00		22.18	17.53	18.00	18.47	18.11	15.78
-6.0	9.74	14.21	17.86		21.05	16.34	17.05	17.76	17.65	15.35
-6.5	9.39	13.78	17.35		20.36	15.69	16.61	17.53	17.69	15.39
-7.0	9.12	13.41	16.89		19.70	15.11	16.20	17.30	17.72	15.39
-7.5	8.86	13.05	16.42		19.15	14.59	15.85	17.11	17.74	15.39
-8.0	8.38	12.49	15.82	遭現場施工破壞而無法測量	18.28	13.79	15.20	16.61	17.39	15.05
-8.5	8.32	12.45	15.68		17.91	13.50	15.03	16.56	17.48	15.12
-9.0	7.43	11.47	14.58		16.82	12.41	14.03	15.65	16.71	14.34
-9.5	6.17	10.06	13.05		15.40	10.97	12.69	14.40	15.54	13.13
-10.0	5.23	9.04	11.89		14.45	9.90	11.70	13.51	14.71	12.30
-10.5	6.87	10.67	13.65		15.27	11.00	12.87	14.75	15.82	13.46
-11.0	9.59	13.38	16.40		17.33	13.23	15.16	17.08	18.04	15.72
-11.5	9.55	13.29	16.21		17.16	13.06	15.03	17.01	17.91	15.60
-12.0	8.30	11.98	14.84		16.01	11.85	13.84	15.83	16.69	14.36
-12.5	6.20	9.78	12.53		14.15	9.84	11.87	13.91	14.74	12.32
-13.0	5.84	9.38	12.09		13.73	9.44	11.48	13.51	14.25	11.81
-13.5	6.46	9.98	12.76		14.13	9.90	11.93	13.96	14.59	12.20
-14.0	7.48	10.98	13.72		14.91	10.78	12.83	14.88	15.31	12.94
-14.5	4.25	7.72	10.21		12.15	7.75	9.79	11.83	12.41	9.92
-15.0	2.07	5.40	7.81		10.16	5.63	7.66	9.70	10.26	7.74
-15.5	2.98	6.30	8.78		10.75	6.32	8.35	10.38	10.78	8.24
-16.0	3.90	7.23	9.76		11.47	7.14	9.15	11.16	11.42	8.89
-16.5	3.49	6.78	9.31		11.09	6.70	8.70	10.70	10.92	8.34
-17.0	4.25	7.53	10.15		11.56	7.28	9.24	11.20	11.31	8.72
-17.5	6.88	10.19	12.91		13.80	9.62	11.56	13.49	13.41	10.83
-18.0	1.19	2.65	5.19		8.83	4.30	5.42	6.53	6.55	3.99
-18.5	-5.06	-3.19	-1.10		3.75	-1.54	-0.31	0.91	1.37	-1.34
-19.0	-5.63	-3.69	-1.72		3.12	-2.23	-0.99	0.25	0.54	-2.25
-19.5	-1.79	-0.83	1.33		5.42	0.79	1.64	2.49	2.61	1.07
-20.0	-0.58	-0.09	0.99		3.03	0.72	1.14	1.56	1.63	0.86
備註:0~-1.5M為連續壁空打部份,故數值不予參考使用										

圖 4

各階段施工的 SID-2壁體內傾斜管變位量與深度之關係

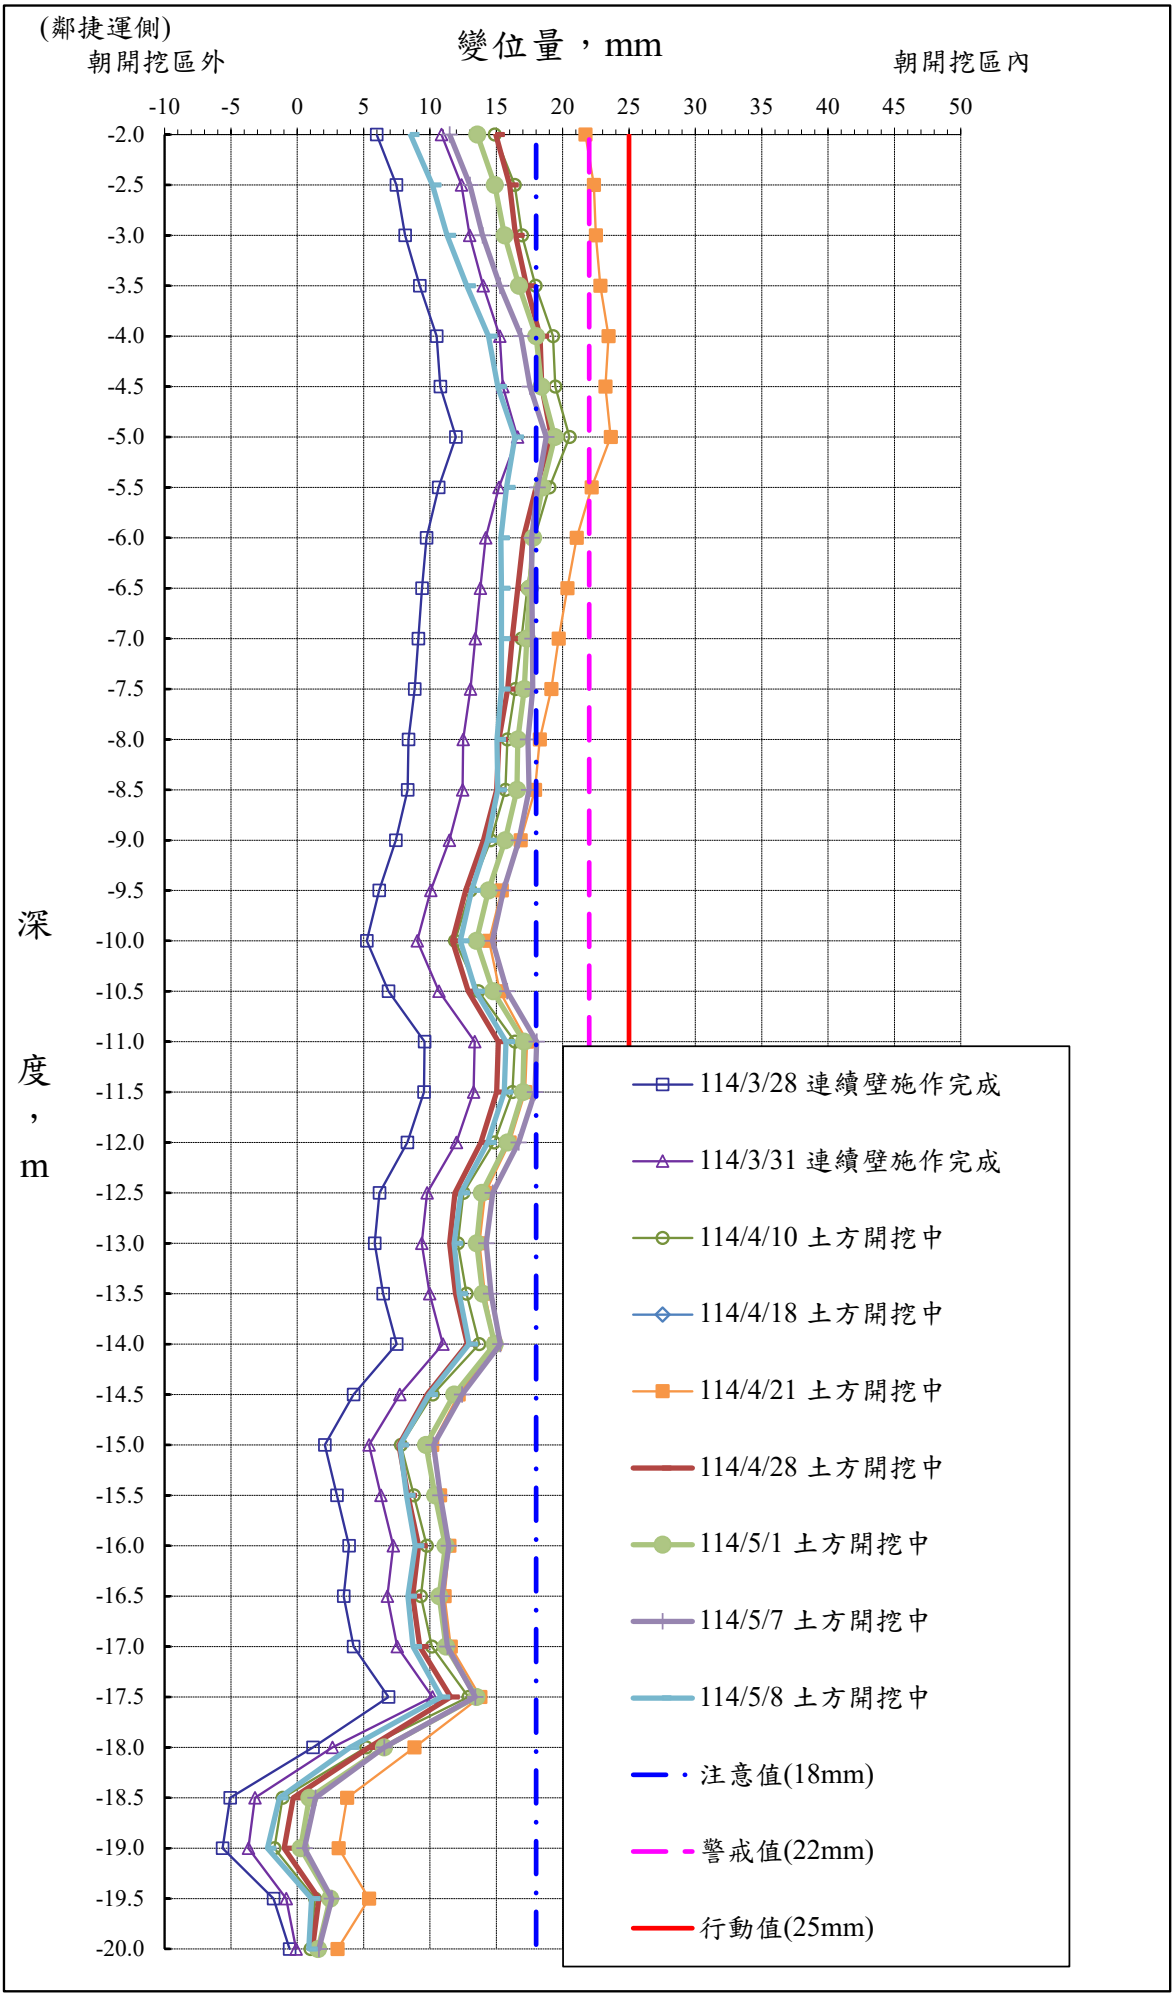


表 5

大地監測報表--擋土壁鋼筋計監測報表

觀測儀器： 擋土壁鋼筋計(RB)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 鋼筋應力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*鋼筋彈性模數*(10^-6)

觀測日期： 114年 5月 3日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6377.4	35.9	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6077.2	32.1	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6445.5	32.4	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 5月 4日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6377.8	36.4	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6079.2	34.3	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6444.5	31.3	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 5月 5日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6378.3	36.9	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6082.1	37.6	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6470.9	60.9	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 5月 6日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6379.9	38.7	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6085.1	41.0	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6469.5	59.4	2100/2520	3360

表 5-1

大地監測報表--擋土壁鋼筋計監測報表

觀測儀器： 擋土壁鋼筋計(RB)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 鋼筋應力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*鋼筋彈性模數*(10^-6)

觀測日期： 114年 5月 7日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6380.9	39.8	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6088.6	44.9	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6470.2	60.1	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 5月 8日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6380.4	39.3	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6087.2	43.3	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6469.0	58.8	2100/2520	3360

觀測日期： 114年 5月 9日

儀器編號	安裝日期	彈性模數 (kgf/cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	鋼筋應力 (kgf/cm^2)	警戒值 / 行動值	危險值
RB-1	113.12.09	2.04E+6	0.55	6409.0	-	-	2100/2520	3360
RB-2	113.12.16	2.04E+6	0.55	6345.4	6381.1	40.1	2100/2520	3360
RB-3	113.12.26	2.04E+6	0.55	6048.6	6088.7	45.0	2100/2520	3360
RB-4	114.01.06	2.04E+6	0.55	6416.6	6471.7	61.8	2100/2520	3360

圖 5　瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

擋土壁鋼筋計歷時曲線圖

日期	114/4/24	114/4/25	114/4/26	114/4/27	114/4/28	114/4/29	114/4/30	114/5/1	114/5/2	114/5/3	114/5/4	114/5/5	114/5/6	114/5/7	114/5/8	114/5/9
儀器編號	土方開挖中	土方開挖中	一撐架設中	一撐預壓完	一撐預壓完	一撐預壓完	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中
RB-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB-2	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	35.9	36.4	36.9	38.7	39.8	39.3	40.1
RB-3	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7	32.1	34.3	37.6	41.0	44.9	43.3	45.0
RB-4	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	32.4	31.3	60.9	59.4	60.1	58.8	61.8

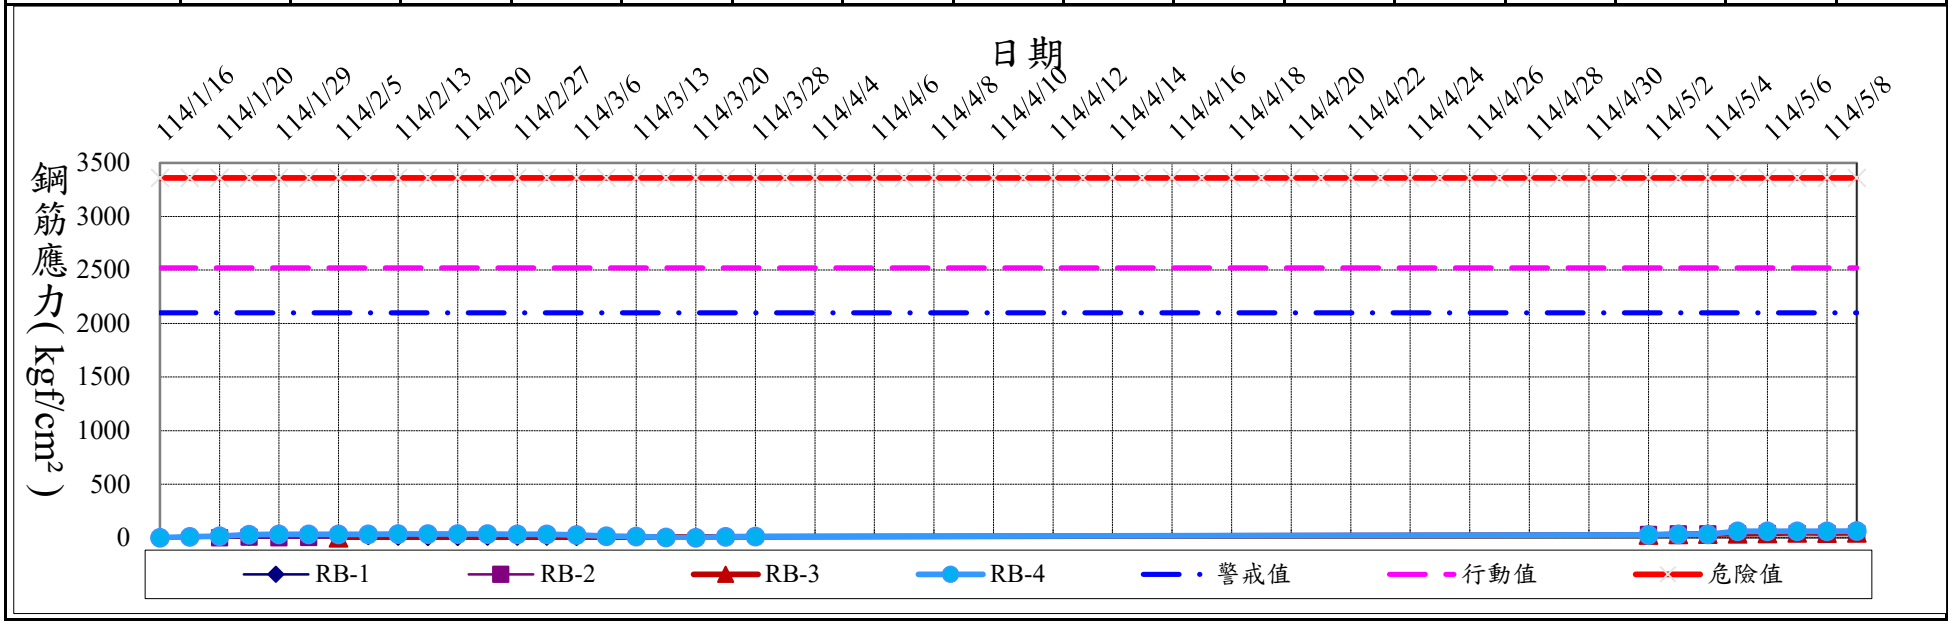


表 6

大地監測日報表--支撐應變計監測日報表

觀測儀器： 支撐應變計(VG)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 支撐軸力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*2100/1000000*斷面積*(-1)

觀測日期： 114年　5月　3日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	856.6	93.3	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	805.1	98.9	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	883.4	108.9	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	822.9	95.0	120.0t/145.0t	160.0t

觀測日期： 114年　5月　4日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	851.6	102.6	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	800.4	107.6	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	878.4	118.3	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	818.1	103.9	120.0t/145.0t	160.0t

觀測日期： 114年　5月　5日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	852.7	100.6	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	800.5	107.5	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	878.3	118.5	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	817.2	105.6	120.0t/145.0t	160.0t

觀測日期： 114年　5月　6日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	854.6	97.0	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	800.9	106.7	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	879.4	116.4	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	817.4	105.2	120.0t/145.0t	160.0t

表 6-1

大地監測日報表--支撐應變計監測日報表

觀測儀器： 支撐應變計(VG)　　測讀儀器： VW-405

計算公式： 支撐軸力=+(量測應變讀值-初始應變讀值)*儀器係數*2100/1000000*斷面積*(-1)

觀測日期： 114年　5月　7日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	854.8	96.6	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	802.4	103.9	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	880.9	113.6	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	815.4	108.9	120.0t/145.0t	160.0t

觀測日期： 114年　5月　8日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	851.7	102.4	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	800.8	106.9	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	879.2	116.8	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	818.8	102.6	120.0t/145.0t	160.0t

觀測日期： 114年　5月　9日

儀器編號	層別	安裝日期	斷面積 (cm^2)	儀器係數	初始應變讀值	量測應變讀值	支撐軸力 (t)	注意值/警戒值	行動值
VG-101	1	114.04.28	218.7	4.062	906.6	850.2	105.2	120.0t/145.0t	160.0t
VG-102	1	114.04.28	218.7	4.062	858.1	799.3	109.7	120.0t/145.0t	160.0t
VG-103	1	114.04.28	218.7	4.062	941.8	879.2	116.8	120.0t/145.0t	160.0t
VG-104	1	114.04.28	218.7	4.062	873.8	819.0	102.2	120.0t/145.0t	160.0t

圖　6　瑞儀先進技術研發中心廠房土建及預埋管工程

第一層支撐應變計歷時曲線圖(H-400x400x13x21)

日期	114/4/28	114/4/29	114/4/30	114/5/1	114/5/2	114/5/3	114/5/4	114/5/5	114/5/6	114/5/7	114/5/8	114/5/9				
儀器編號	一撐預壓完	一撐預壓完	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中	二挖中				
VG-101	80.6	87.1	89.2	89.5	89.9	93.3	102.6	100.6	97.0	96.6	102.4	105.2				
VG-102	80.0	91.0	91.2	91.4	93.5	98.9	107.6	107.5	106.7	103.9	106.9	109.7				
VG-103	80.8	85.3	86.0	86.9	87.9	108.9	118.3	118.5	116.4	113.6	116.8	116.8				
VG-104	80.4	84.3	84.7	85.1	87.3	95.0	103.9	105.6	105.2	108.9	102.6	102.2				

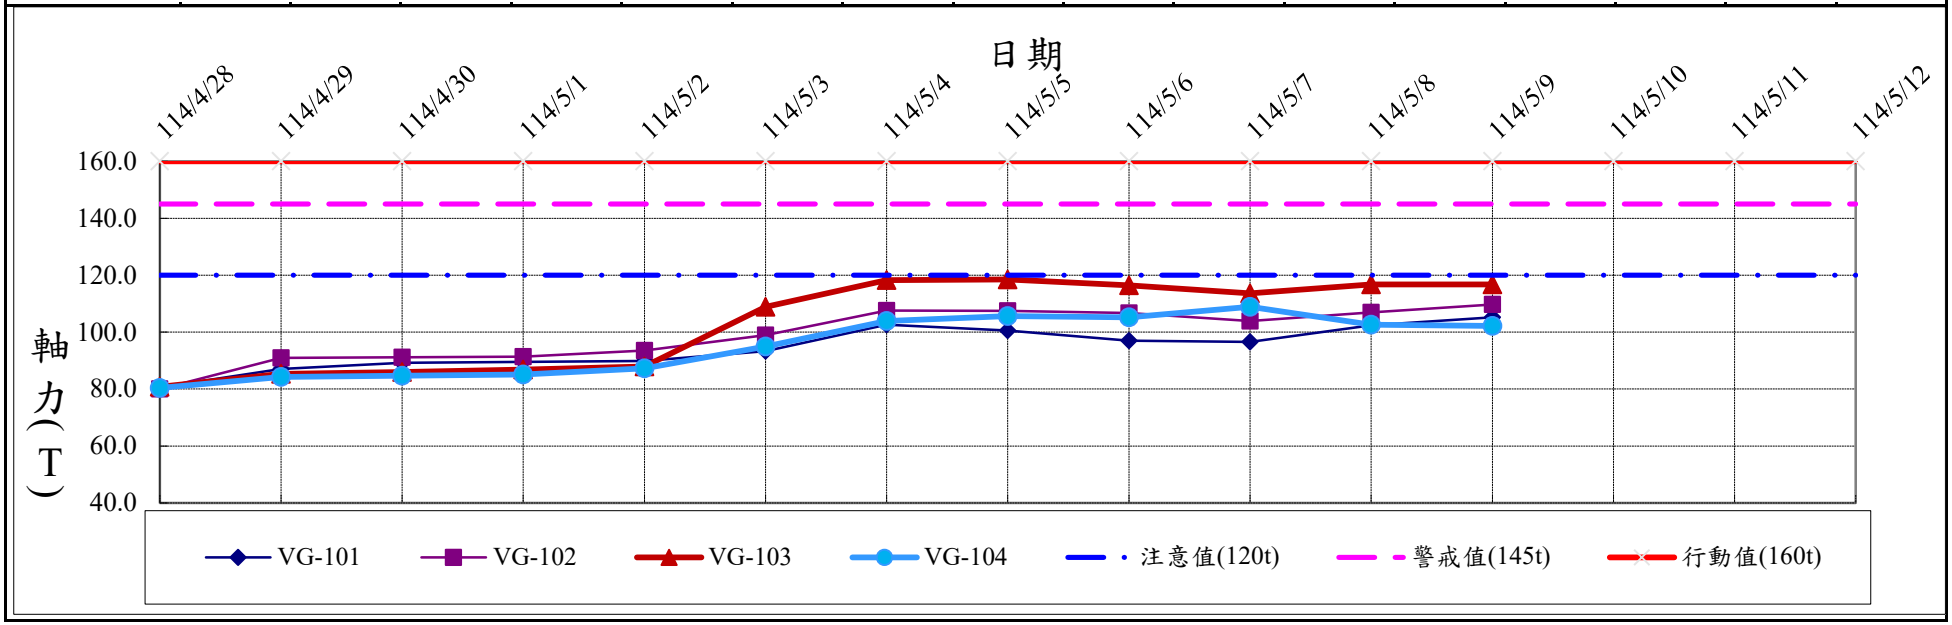


圖 7 監測記錄照片


沈陷點觀測SM-2
北側
2025/5/7



沈陷點觀測SM-3
東側
2025/5/7


沈陷點觀測SM-5
南側
2025/5/7


沈陷點觀測SM-6
南側
2025/5/7


支撐應變計 VG-103
VG-104
2025/5/7


支撐應變計 VG-101
VG-102
鋼筋應變計 RB-3
2025/5/7

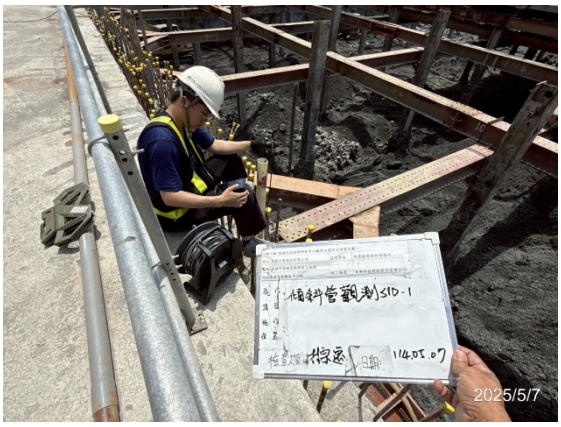
傾斜管觀測SID-1
2025/5/7


傾斜管觀測SID-2
